

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 03/12/2023

ID-label: A2.3 88A bus 201

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Datum verslag: 02/12/2023

Inspecteur: Kim Dedecker

B.T.W. nr.: BE 0779 225 843

Serienummer: 19481238

Mentor:

Klantreferentie:

Installateur: Beukelaers Ronny

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Romain Steppestraat
Huisnummer 88A
Busnummer 201
Postcode 2890
Gemeente Sint-Amands
Land België

Eigenaar

Naam Degero
Straatnaam Romain Steppestraat
Huisnummer 88A
Busnummer 201
Postcode 2890
Gemeente Sint-Amands
Land België

Installateur


Naam Beukelaers Ronny
BTW nr. BE 0779 225 843
Telefoonnummer +32 495 50 25 78
E-mail info@beukelaers.be

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448860021326800

Teller Nr. : 1SAG1105145420

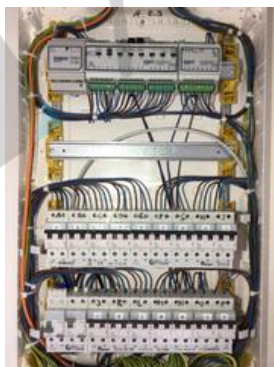

Aard onderzoek:

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Aardingslus

Ja

Spanning: 1N400V

Aantal kringen: 16

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 358 MΩ

RE: 1,79 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	NVT	NVT
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	7	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
2	C	16		2	1,5
3	C	16		2	2,5
10	C	20		2	2,5
1	C	32		2	6

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 3/12/2048
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Kim Dedecker

Kim Dedecker
ACEG VZW - #270

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 3/12/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



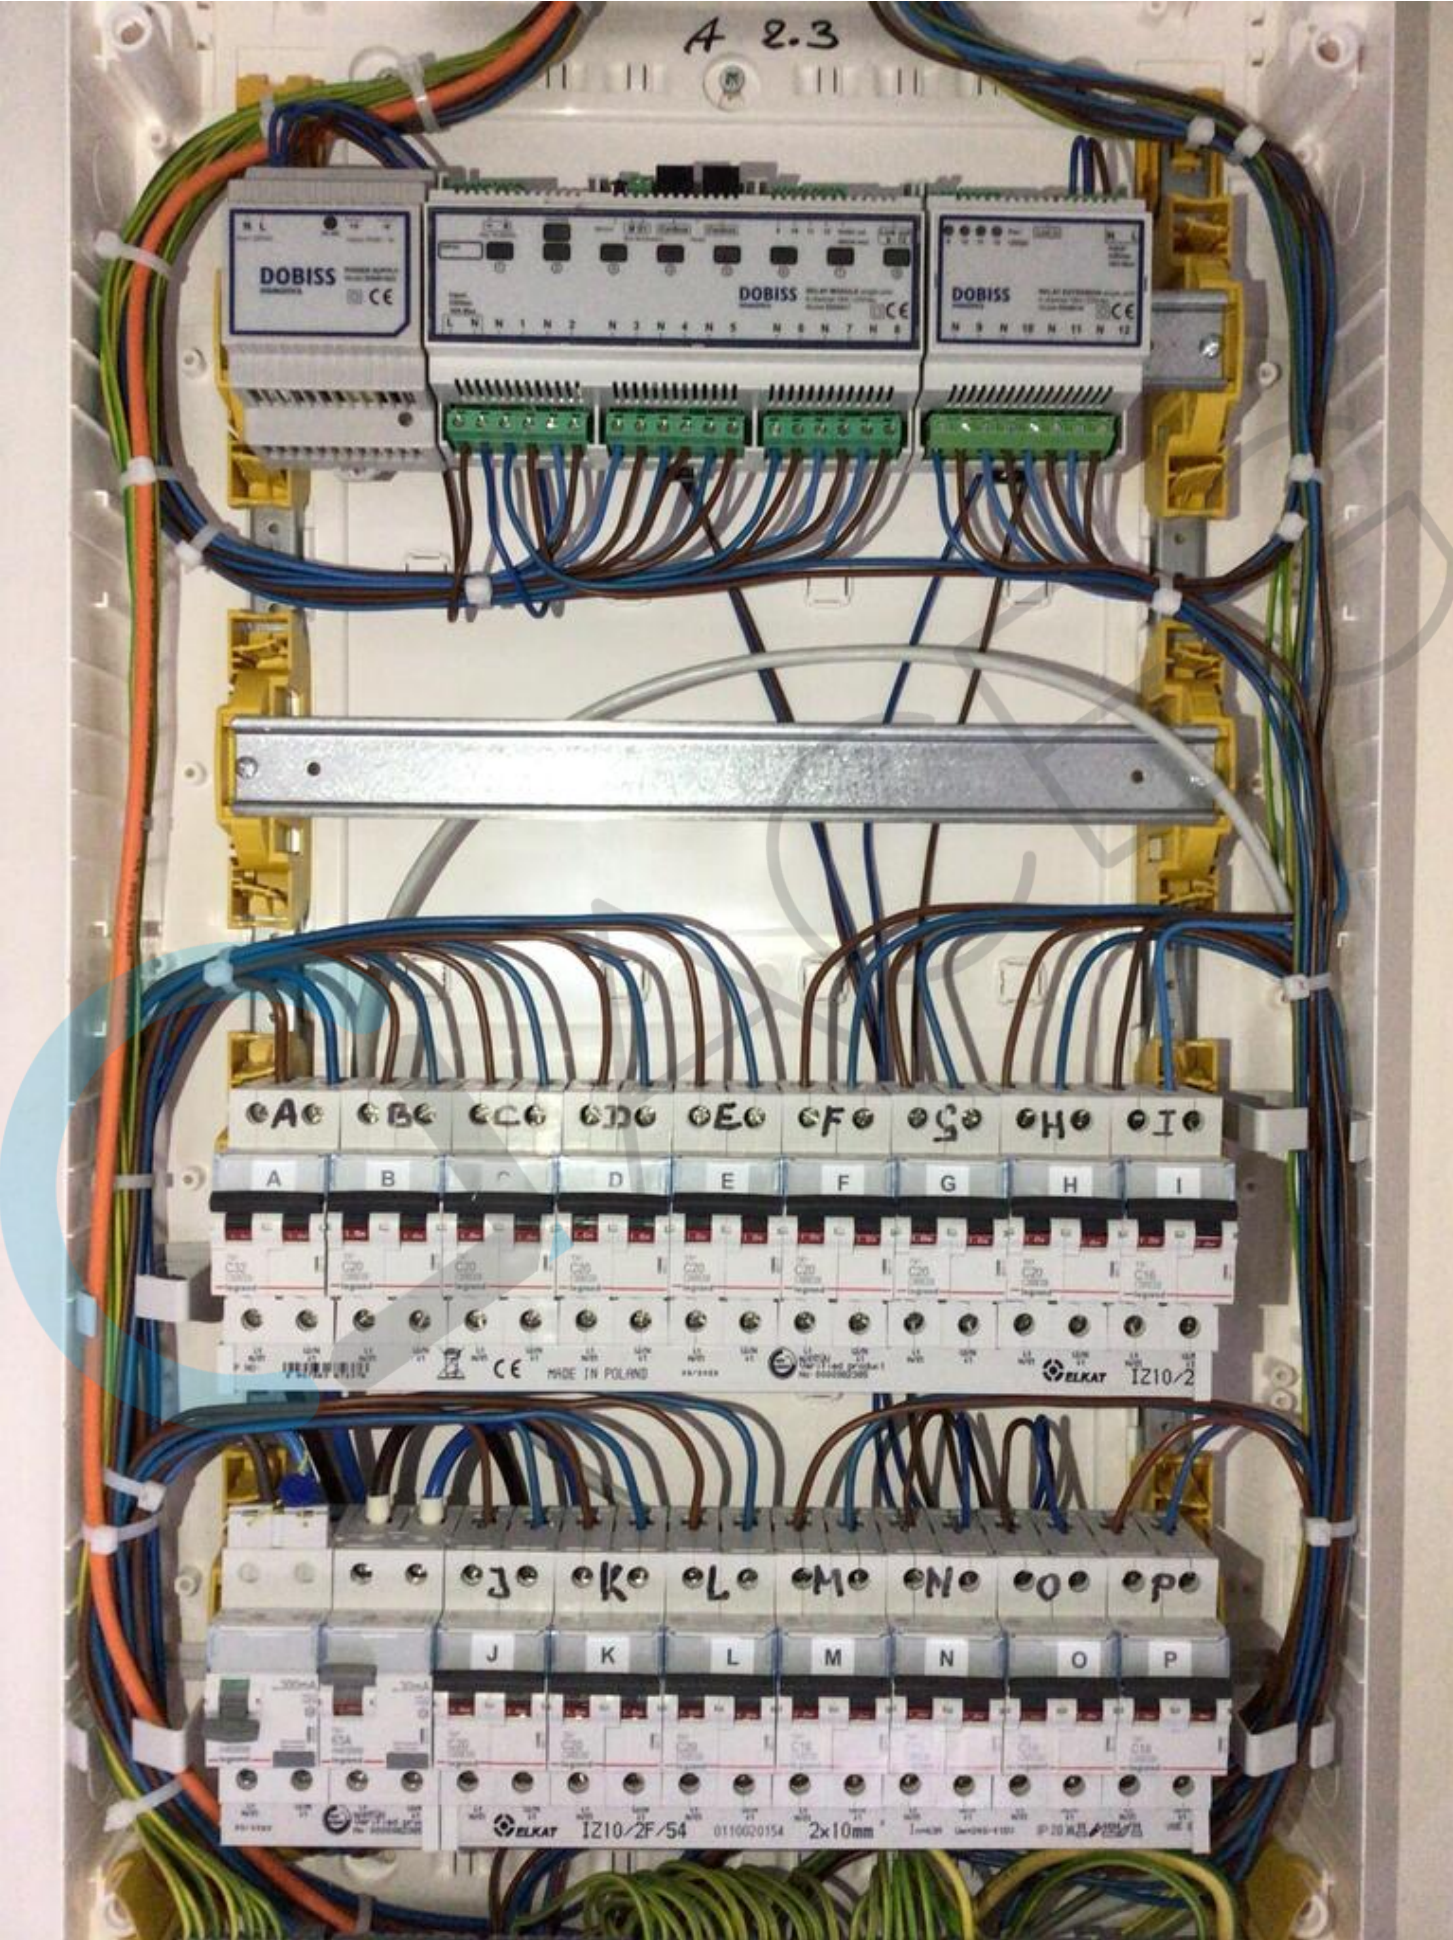


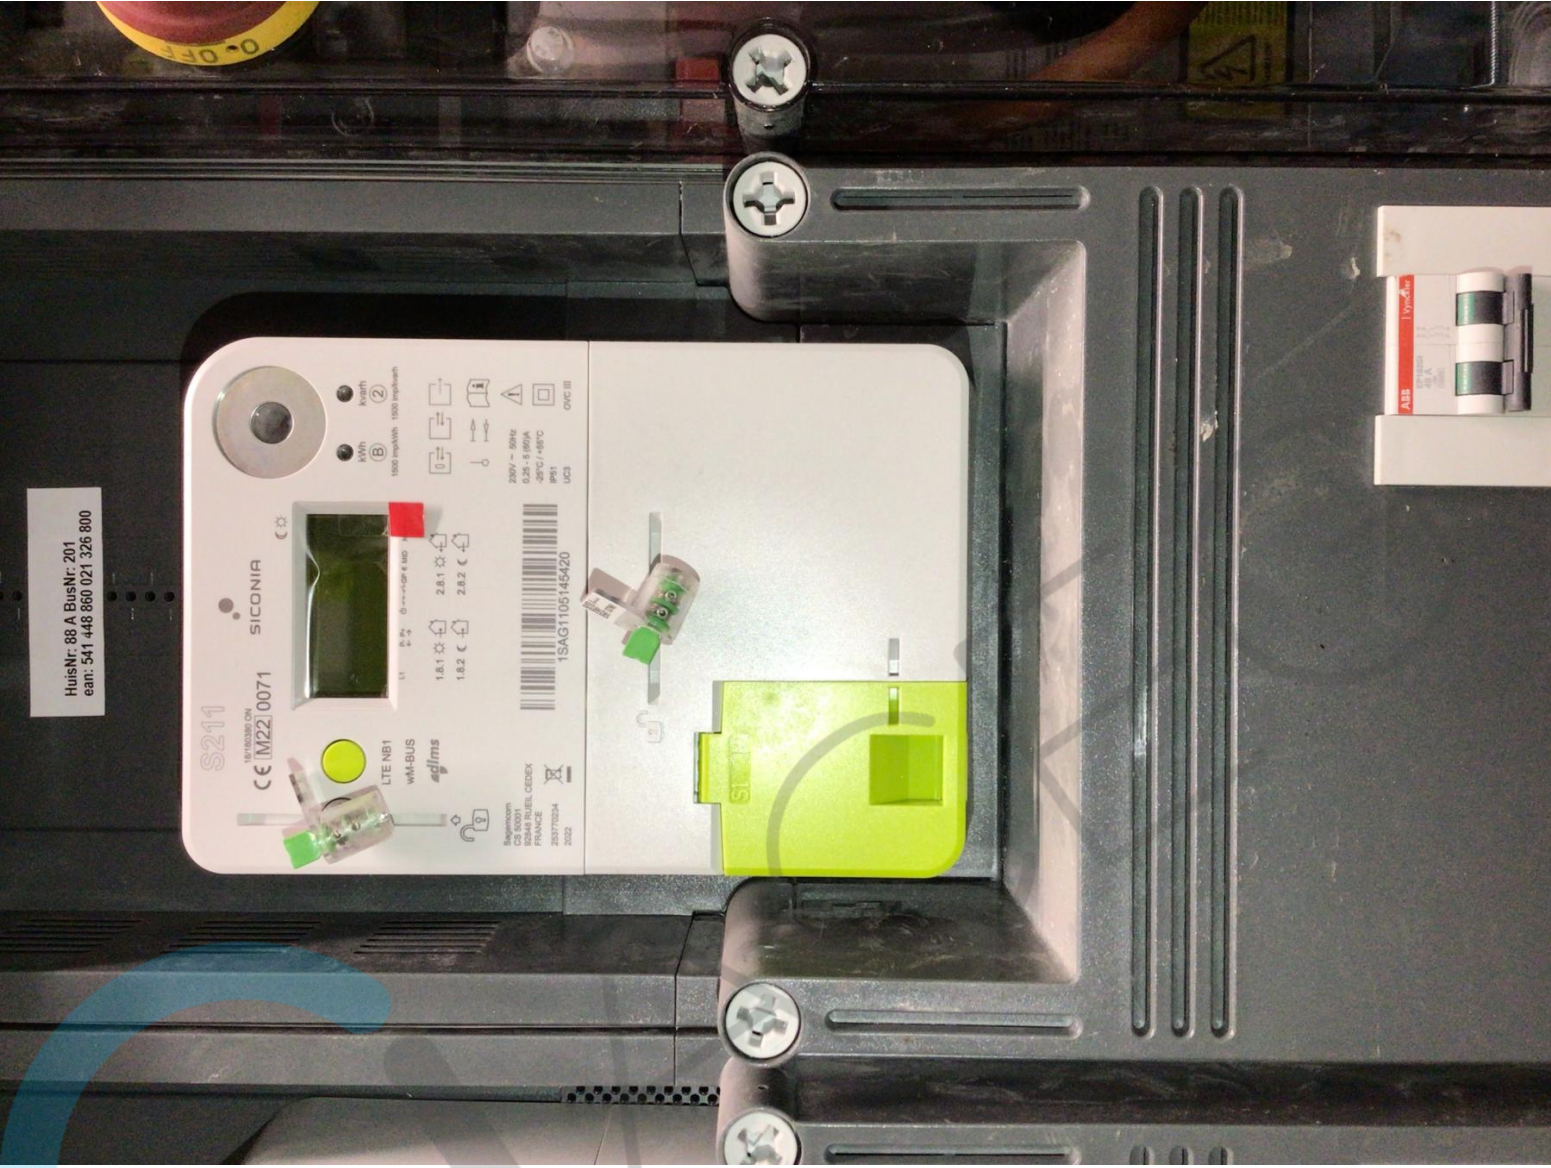



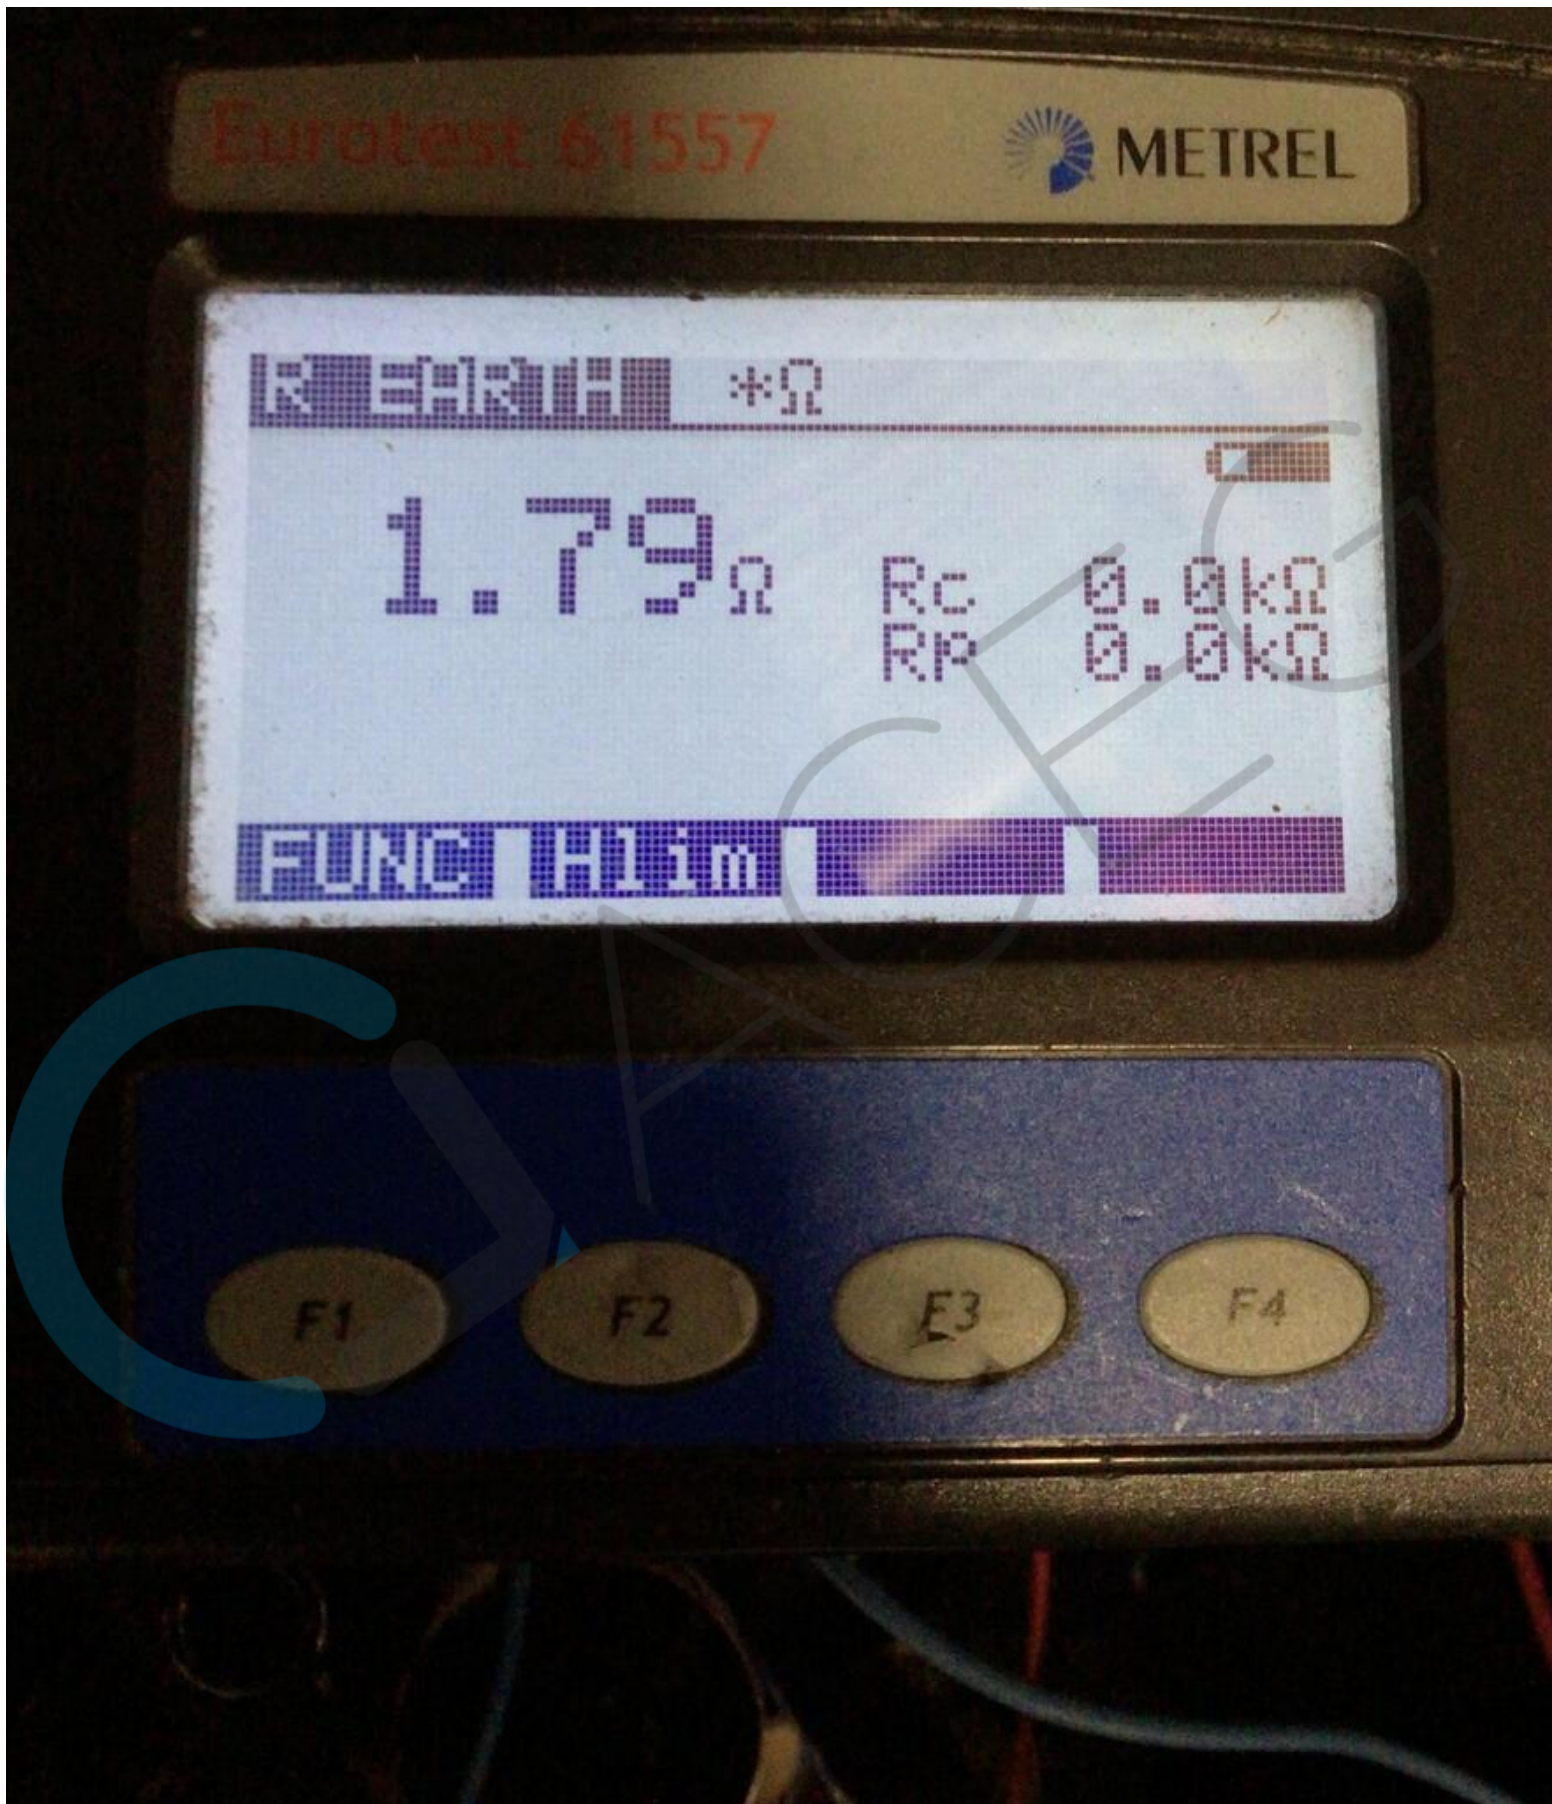




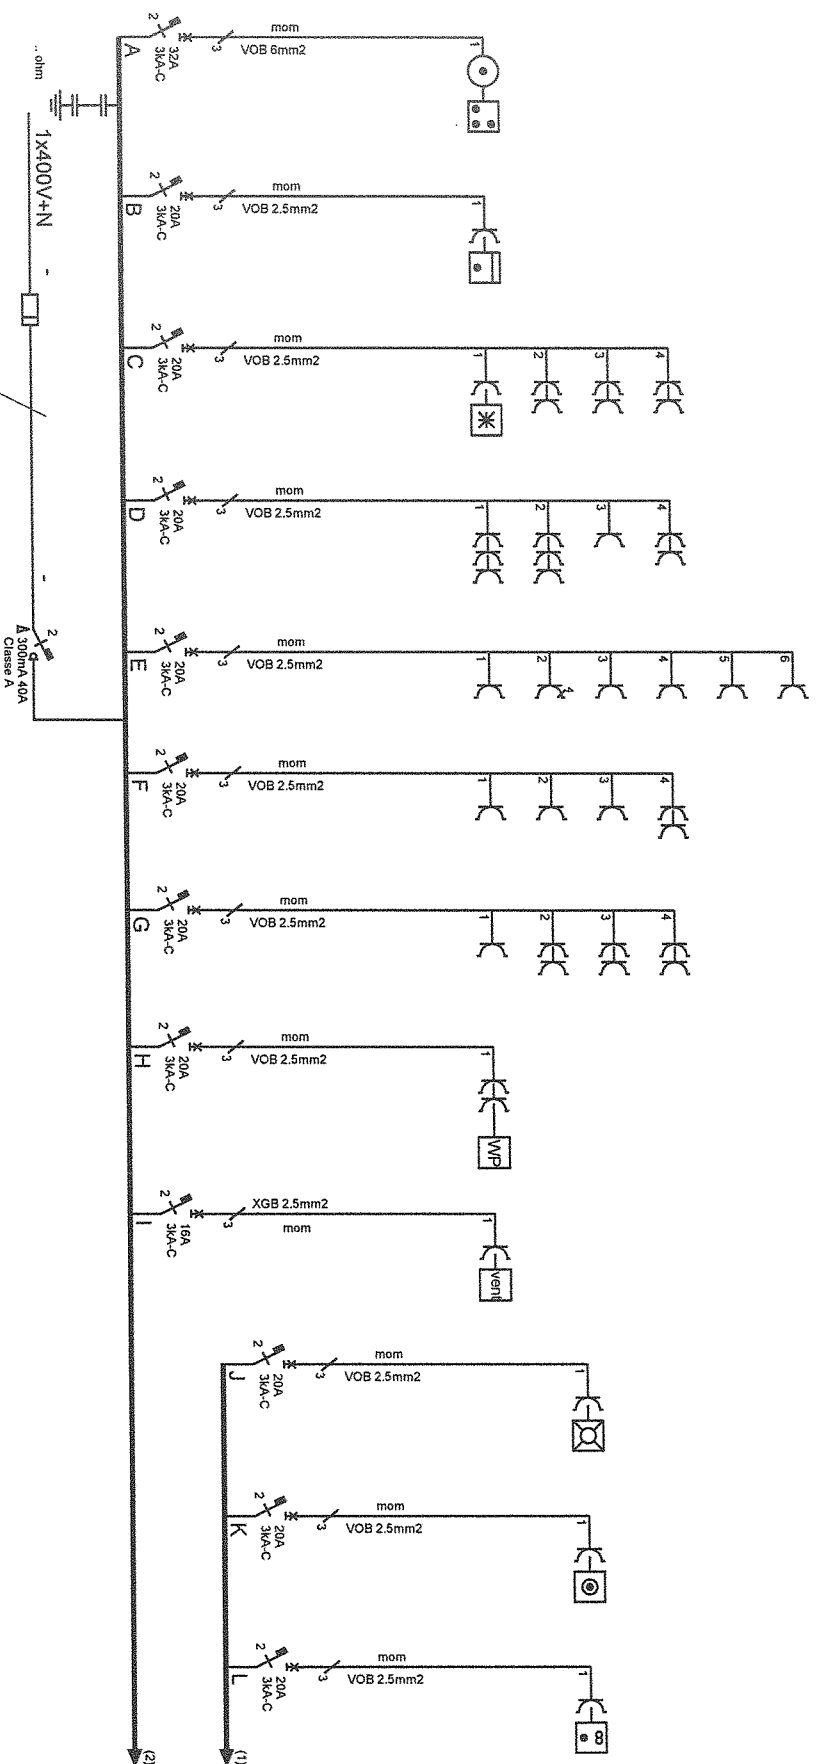


<p>Afgev. en get. 06/06/2023</p> <p>mm. Decker</p> <p>03/12/2023</p>	<p>Eigenaar</p> <p>Degero Projectontwikkeling</p> <p>Romain Steppestraat 88A bus 201</p> <p>2890 Puurs-Sint-Amands</p> <p>EAN 541448860021326800</p>	<p>Verantw. uitvoering</p> <p>.. / .. / 2023</p>	<p>BEUKELAERS</p> <p>Hoge Buizen 15</p> <p>1980 Epegem</p> <p>BTW: 0779.225.843</p>	<p>1/2</p>
<p>Handtekening</p>	<p>Handtekening</p>	<p>Handtekening</p>		

app. A2.3

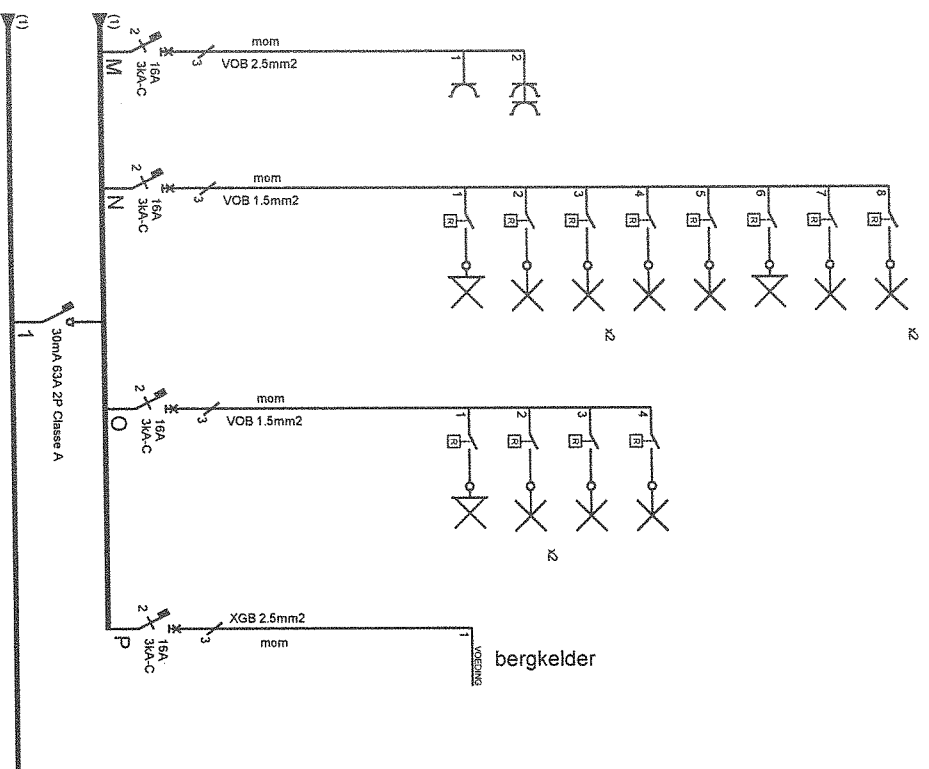

<p>Afgeleverd door de organisatie</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>03/12/2023</p>	<p>Eigenaar</p> <p>Degero Projectontwikkeling</p> <p>Romain Steppestraat 88A bus 201</p> <p>2890 Puurs-Sint-Amands</p> <p>EAN 541448860021326800</p>	<p>Verantw. uitvoering</p> <p>.. / .. / 2023</p>	<p>BEUKELAERS</p> <p>Hoge Buizen 15</p> <p>1980 Epegem</p> <p>BTW: 0779.225.843</p>	<p>2/2</p>
<p>Handtekening</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>03/12/2023</p>	<p>Handtekening</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Handtekening</p> <p><i>[Signature]</i></p>		

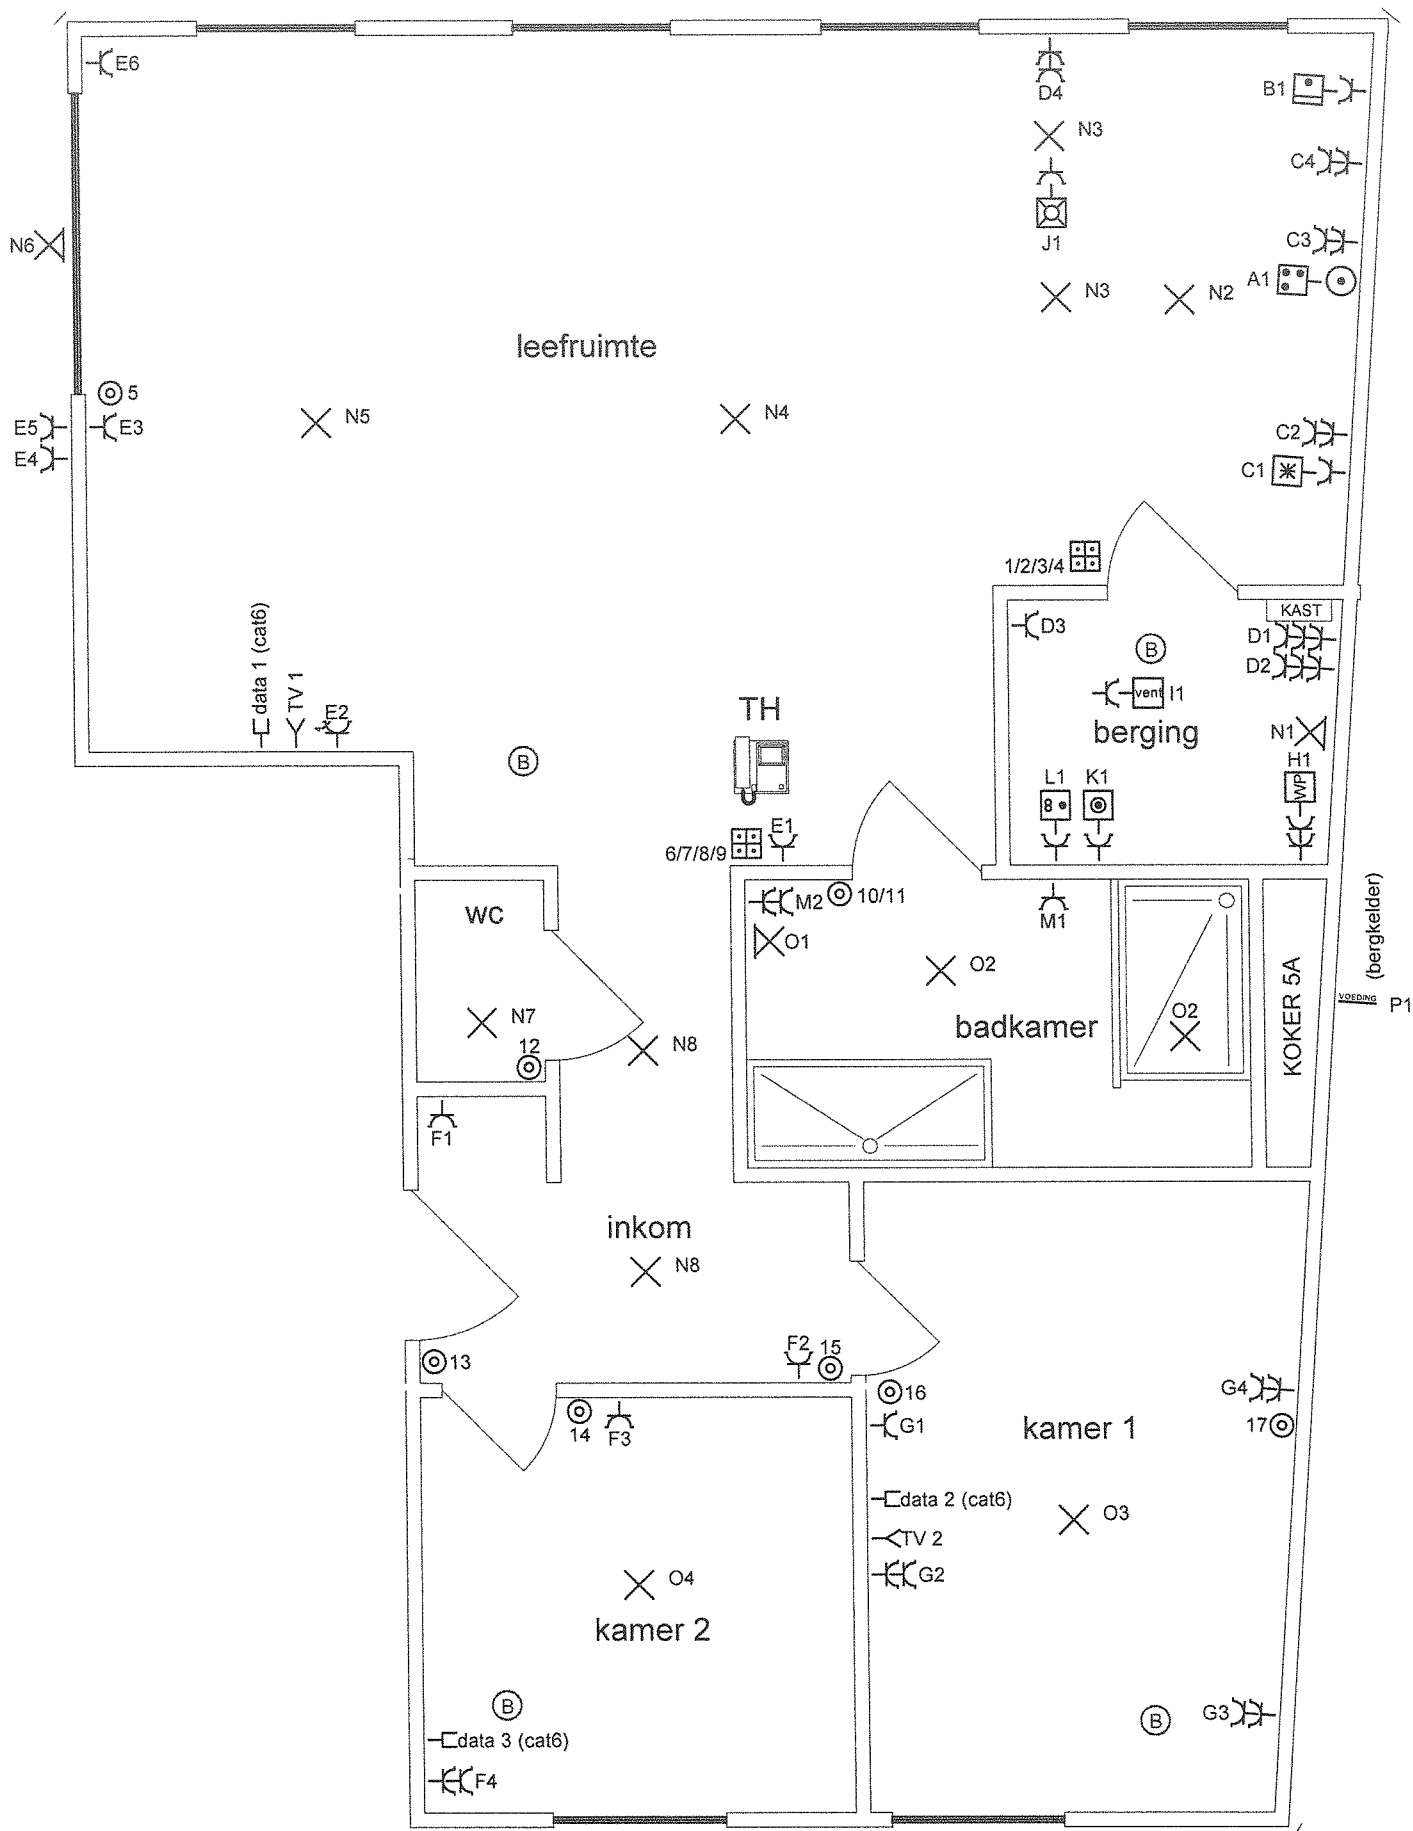

Stille Waters app. A2.3

Handwritten signature

Handwritten signature

ACFG 278
Kim Dedecker

03/12/2023
