

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

0475/623096

STROOMLEVERANCIER: ELECTRA BEL

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 15/031010/04

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Leuvenhout 95
Mauke

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW nr.: _____

Datum van het onderzoek: 10/10/2003 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~ onderzoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. ~~271~~) (AREI art. 270) (ARAB art. 202) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering ~~voor~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~ na 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting (aansluit 40 A)

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 06/1/40 H

Type van de aardelektrode: lus - ~~beren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 1,9 Ohm; RI tot 20 MOhm

BESCHRIJVING: _____

Zie schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: _____

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelier

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.



BESLUIT


1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de éénraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10/10/2008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. ~~De installatie is niet conform.~~
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. ~~De installatie is niet conform.~~
~~De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____~~

DE AGENT-ONDERZOEKER: 15 Ge...
nr. + naam + handtekening

De directeur,

BT
10/10/2003

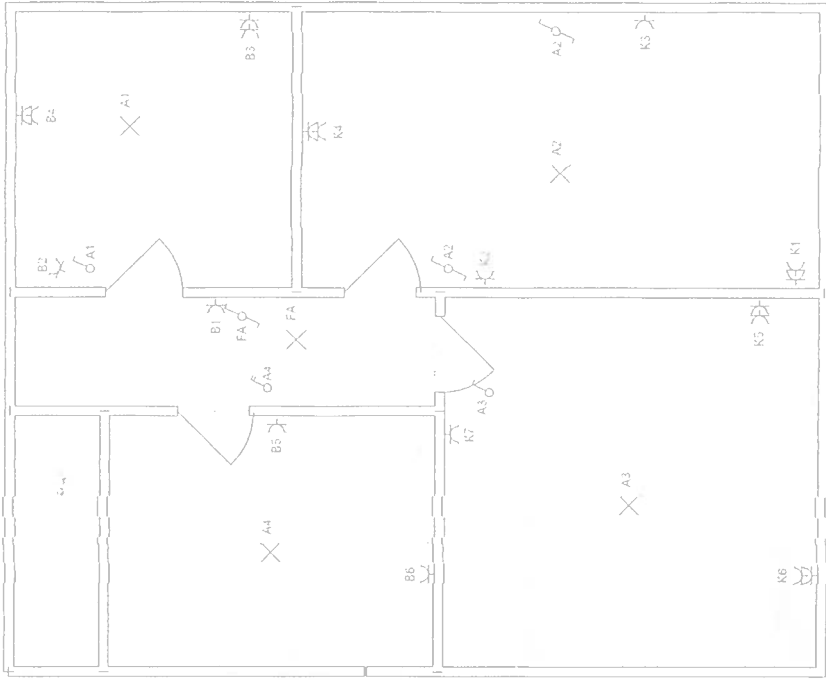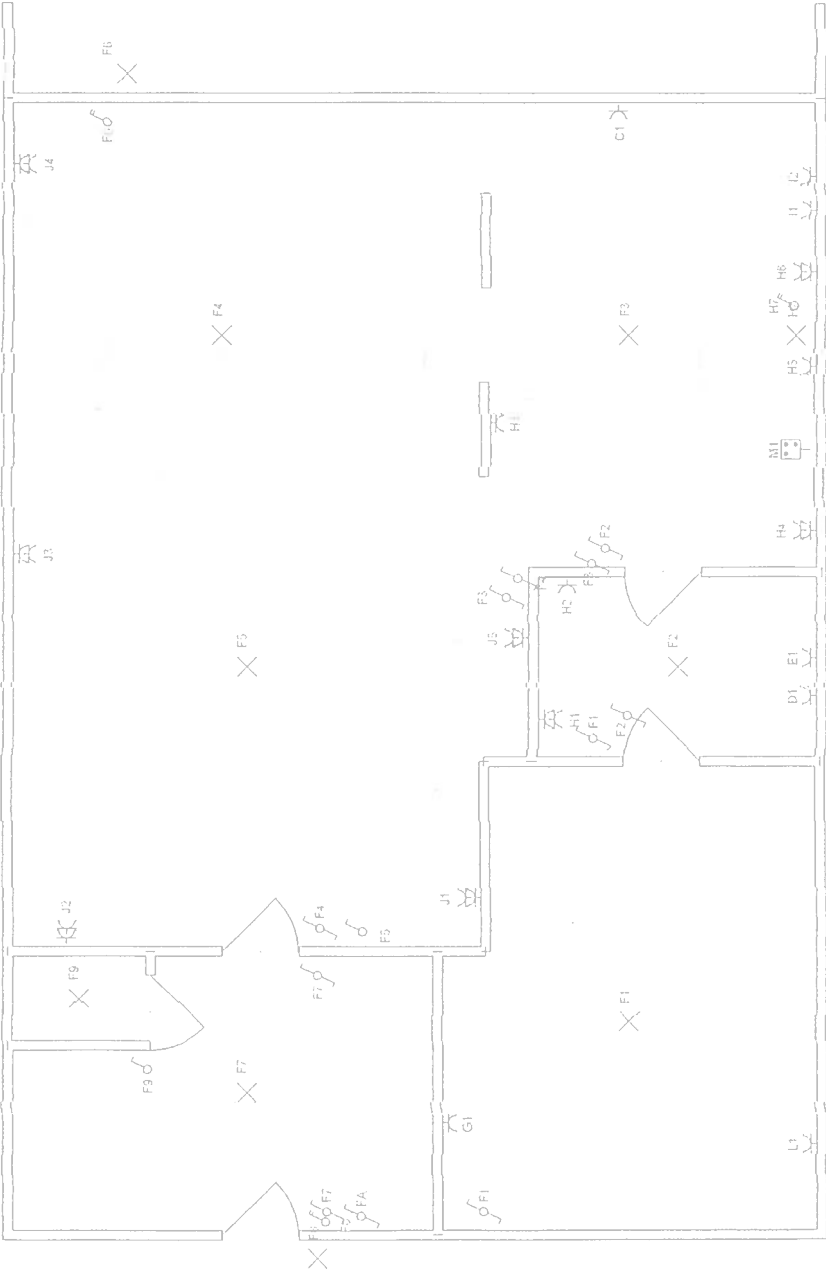

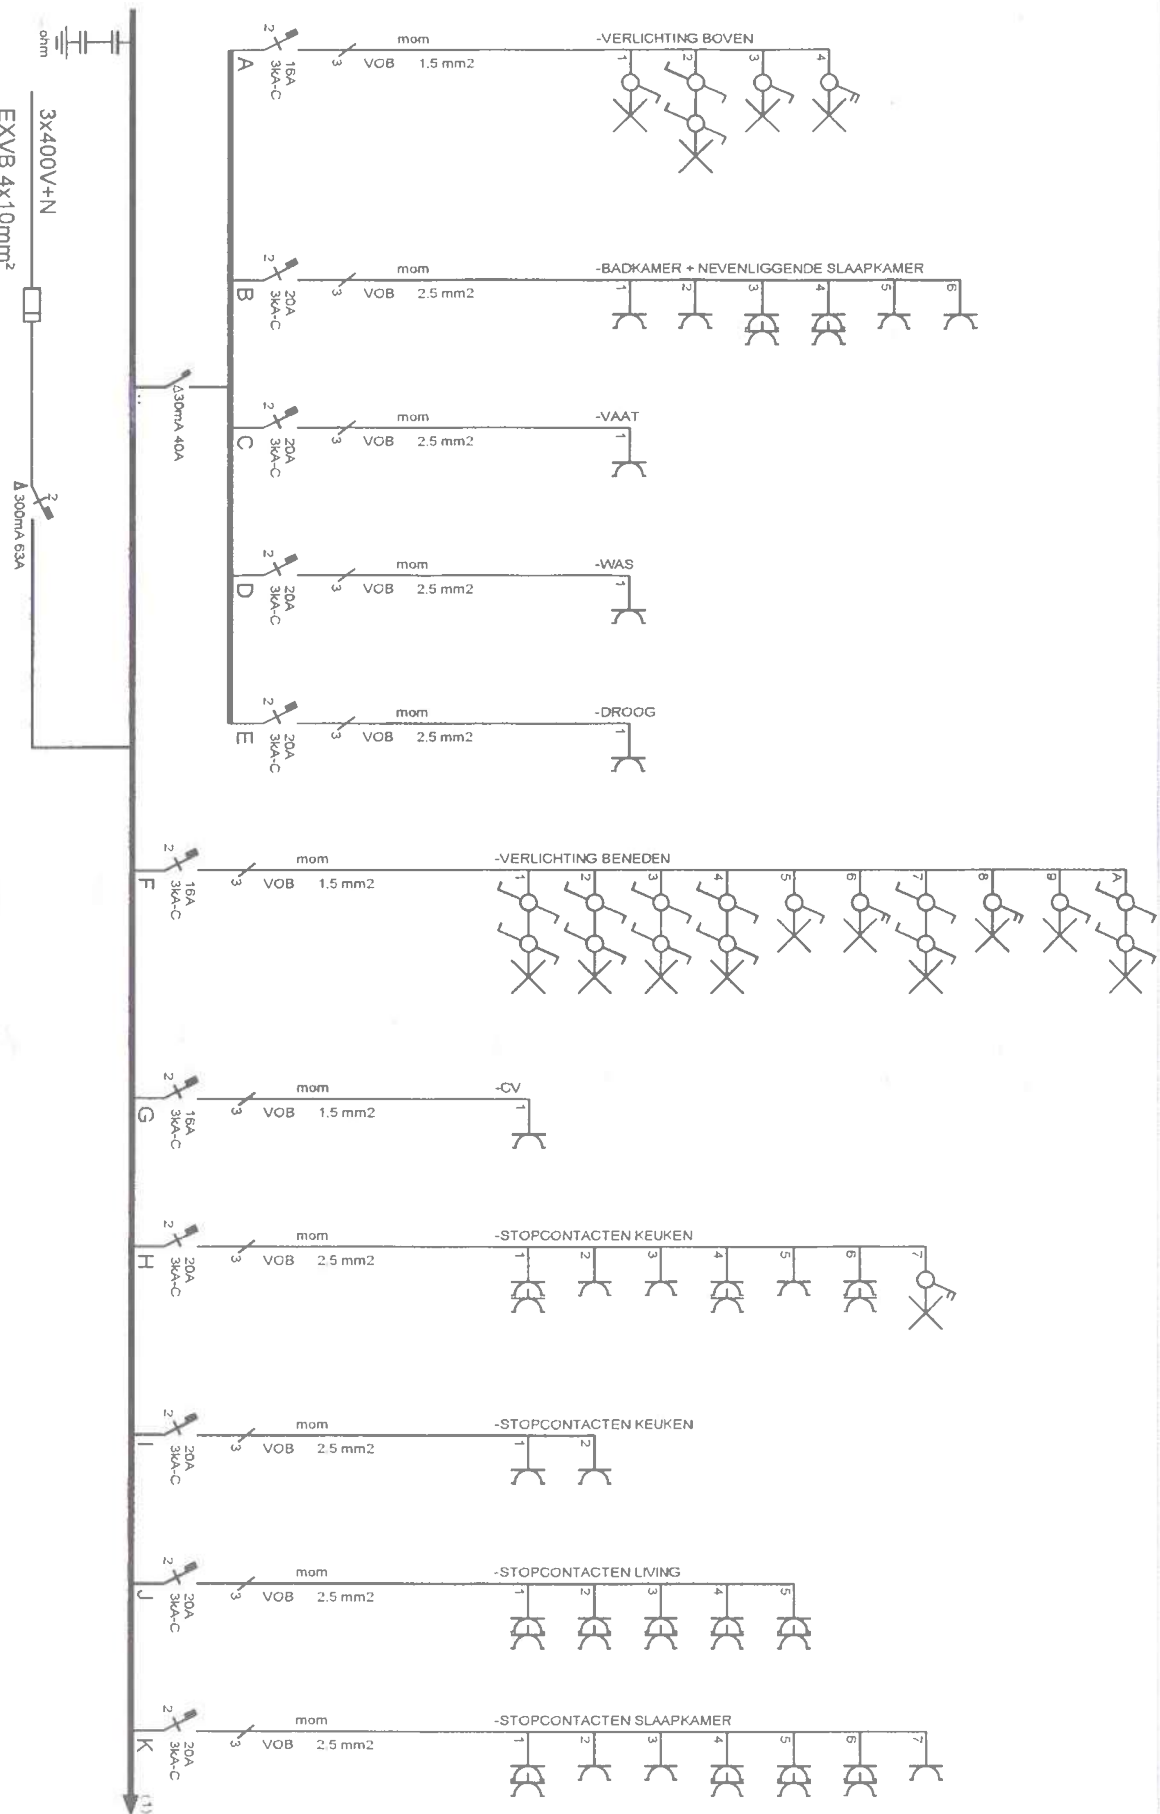

Afgev. erkend organisme

10. / 10 / 2003


13 TV

VAN DER JEUGT
DAMSTRAAT 95
9180 MOERBEKE

Verantw. uitvoering

.. / .. / 2003

DRM Elektrotechniek
Rozenstraat 63
9160 LOKEREN
BTW : BE 721.189.456

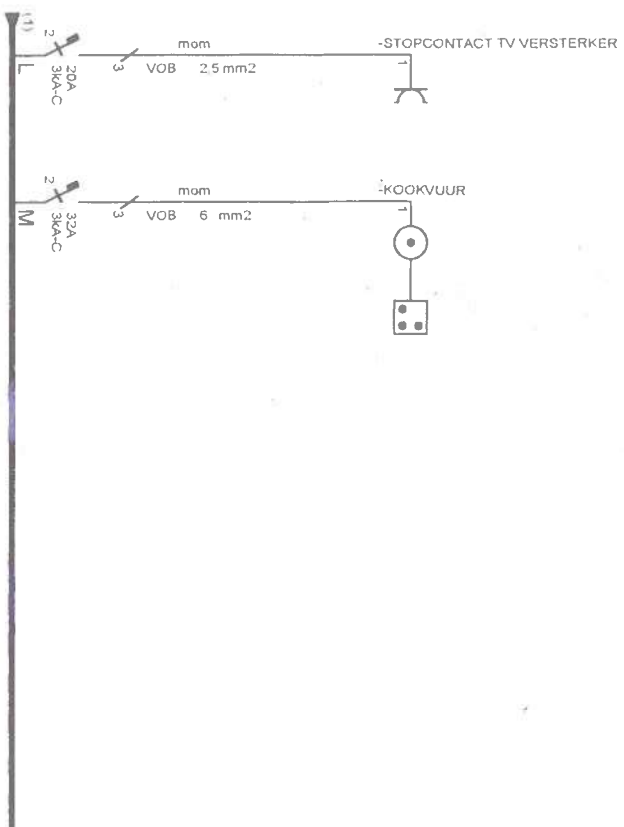

Afgev. erkend organisme

10/10/2003

Handwritten signature

VAN DER JEUGT
DAMSTRAAT 93
9180 MOERBEKE

Verantw. uitvoering

.. / .. / 2003

DRM Elektrotechniek
Rozenstraat 63
9160 LOKEREN
BTW : BE 721.189.456
