




N° 234-INSF.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Eandis

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 27/0805/2

EAN
code :

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT TN IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	Prescription du gest. de réseau de distr. ☐

Tijdelijk :	Kermisinstallatie :	Indienststelling :	Uitbreiding :	Vernieuwing :
Temporaire : ☐	Install. Foraine : ☐	Mise en service : ☒	Extension : ☐	Renouvellement : ☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Begijnlaan 11A

9470 Denderleem

Eigenaar :

Adres :

Propriétaire :

Adresse :

Installateur :

P.C.S. buke

BTW / TVA : 0466-676-106

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

03/07/07

Inspecteur :

Goedhuys

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☐ Appart. ☐

Spanning : 3x230V	Meter / bord verbinding :	Max. beveiliging :
Tension :	Liaison compteur-tableau : 3x10u2	Protection max. : 40A

Aardelektrode :	Isolatie :	Aantal verdeelborden :
Electrode de terre : 5.2 Ohm	Isolément : 76 Mohm	Nombre de tableaux : 1

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 20				Test ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :				OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
404	300	A	A-M-O-U				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
404	30	A	O-U				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	☐	Contact direct : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentiëles :	

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

geen

Norm: kernde, lachde e. uitbreiding is nog te plaatsen

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.

L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 03.07.2007

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur:

pour le directeur,
l'inspecteur:

Johan GOEDHUYTS
Inspecteur
G.s.m. : (0472) 940.201

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

TEL. : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09

info@electro-test.be
www.electro-test.be

Dexia 068-2117692-15
KBC : 734-1126000-33

IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

BE 0434.433.603
APR Brussel

INBREUKEN

A. AARDING

1. De spreiding van de aardingsweerstand is hoger dan 30 Ohm.
2. De spreiding van de aardingsweerstand is hoger dan 100 Ohm.
3. De spreiding van de aardingsweerstand is te hoog volgens de gevoeligheid van de differentieerschakelaar.
4. Er is geen aardelektrode/aardingsslus aanwezig.
5. De aardgeleider heeft een onvoldoende sectie (min. 16mm² Cu).
6. De aardingsonderbreker is niet aanwezig.

B. EQUIPOTENTIALE VERBINDINGEN (E.V.)

1. E.V. niet aanwezig.
2. E.V. niet bevestigd volgens de regels van de kunst.
3. De sectie van de hoofd E.V. is onvoldoende (min. 6 mm²).
4. Bijkomende E.V. in badkamer niet geplaatst of onjuist.
5. Bijkomende E.V. bezitten een onvoldoende sectie (beschermd 2,5 mm²).
6. De continuïteit is niet verzekerd.
7. De kleurcode is onjuist.

C. ISOLATIEWEERSTAND

1. Per kring : minder dan 500 kOhm.

D. DIFFERENTIEELSCHAKELAARS (D.S.)

1. Er zijn geen D.S. aanwezig.
2. De nominale stroom van de Algemene D.S. (A.D.S.) bedraagt minder dan 40A.
3. De nominale stroom van D.S. is onvoldoende.
4. De verzegelplaatjes van de A.D.S. zijn niet aanwezig.
5. Er is geen D.S. geplaatst voor de beveiliging van de badkamer, wasmachine.
6. Teste ΔI_n : N.O.K.
7. Teste 2,5 ΔI_n : N.O.K.

E. VERDEELBORD(EN) EN KRINGEN

1. De kringen zijn niet of onjuist gemerkt.
2. Het bord is niet bereikbaar of niet op een hoogte van +/- 1,5 m geplaatst.
3. Rechtsstreekse aanraking is mogelijk.
4. Er zijn geen kalibreerelementen geplaatst of deze zijn niet in functie van draadsecties.
5. Er zijn overbrugde veiligheden aanwezig.
6. Er zijn een 2 kringen minimum aanwezig voor de verlichting.

F. LEIDINGEN

1. Niet gebruikte leidingen zijn niet verwijderd.
2. Er is geen reglementaire kleurcode gebruikt.
3. De aanwezige blauwe geleider wordt gebruikt als lasgeleider en er is een andere kleur beschikbaar.
4. Kabels zijn niet beschermd bij muuroorvoering.
5. Kabels in PVC buis zijn niet mechanisch beschermd over een afstand van 10 cm boven het vloerniveau.
6. De gebruikte XVR en XFVR kabels verzonken in de muur volgen niet de voorgeschreven injecties.
7. Installatie draad niet beschermd of niet reglementair.

G. SCHAKELAARS EN STOPCONTACTEN

1. De stopcontacten zijn niet op voldoende te hoogte van het vloerniveau geplaatst (van af tot vloer : 25 cm in vochtige lokalen en 15 cm droge lokalen).
2. Een schakelaar(s) rijdt niet de lasgeleider.
3. Het gebruikte materiaal stemt niet overeen met de vereiste beschermingsgraad.
4. Directe aanraking mogelijk.

H. TOESTELLEN

1. De gebruikte toestellen dragen geen gelijkvormigheidslabél van een erkend Europees labo.
2. De toestellen voldoen niet aan de gewenste beschermingsgraad.
3. De productklasse stemt niet overeen met de plaats van het toestel.
4. De verwarmingstoestellen zijn nog niet geplaatst.
5. Directe aanraking mogelijk.

I. VISUEEL NAZICHT

1. Algemene opmerkingen.
2. Directe aanraking mogelijk.
3. Indirecte aanraking mogelijk.

J. ELEKTRISCH DOSSIER

1. Eéndraadschema niet aanwezig.
2. Stijldelechema niet aanwezig.

INFRACTIONS

A. PRISE DE TERRE

1. La résistance de la prise de terre dépasse 30 Ohms.
2. La résistance de la prise de terre dépasse 100 Ohms.
3. La résistance de la prise de terre est trop élevée en fonction de la sensibilité de l'interrupteur différentiel.
4. Absence d'une électrode de terre (haucle de terre).
5. La section du conducteur de mise à la terre est insuffisante (min 16 mm² Cu).
6. Il n'existe pas de coupe-terre.

B. LIAISONS EQUIPOTENTIELLES (L.E.)

1. L.E. non réalisées.
2. L.E. non fixées d'après les règles de l'art.
3. La section de la L.E. principale est insuffisante (min 6 mm²).
4. L.E. supplément. dans salle de bains non réalisées ou incorrectes.
5. L.E. suppl. ont une section insuffisante (protégées 2,5 mm²).
6. La continuité n'est pas assurée.
7. Le code des couleurs n'est pas correct.

C. RESISTANCE D'ISOLEMENT

1. Par circuit : inférieure à 500 kOhm.

D. INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS (I.D.)

1. Absence de différentiels.
2. Le courant nominal de l'I.D. général est inférieur à 40A.
3. Le courant nominal de l'I.D. est insuffisant.
4. Les plaquettes de plombage de l'I.D. général manquent.
5. Absence d'un I.D. pour salle de bains, machine à laver,...
6. Teste ΔI_n : P.O.K.
7. Teste 2,5 ΔI_n : P.O.K.

E. TABLEAU(X) DE DISTRIBUTION ET CIRCUITS

1. Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués.
2. Le tableau n'est pas accessible ou n'est pas à une hauteur de +/- 1,5 m.
3. Contact direct est possible.
4. Absence d'éléments de calibrage ou inadaptés en fonction des sections des canalisations.
5. Il y a des fusibles pontés.
6. Il n'y a pas au minimum 2 circuits d'éclairage.

F. CANALISATIONS

1. Les canalisations non utilisées ne sont pas éliminées.
2. Il n'y a pas de code de couleurs réglementaire utilisé.
3. Le conducteur bleu présent est utilisé comme conducteur de phase et une autre couleur est disponible.
4. Les conduct. ne sont pas protégés dans les traversées des murs.
5. Conduct. et tubes PVC ne sont pas protégés mécaniquement à une distance de 10 cm au dessus du niveau de sol.
6. Les canalisations XVB et XFVB noyées dans le mur ne suivent pas le parcours privilégié.
7. Conducteur d'installation non protégé au par exemple d'un

G. INTERRUPTEURS ET PRISES DE COURANT

1. Les prises de courant ne sont pas placées à une hauteur suffisante vis à vis du niveau de sol (25 cm dans des locaux humides et 15 cm dans des locaux secs).
2. Le conducteur de neutre est coupé au lieu du conducteur de phase.
3. Le matériel utilisé n'est pas conforme au degré de protection exigé.
4. Contact direct possible.

H. APPAREILS

1. Les appareils utilisés ne sont pas pourvus d'un label de conformité d'un labo européen agréé.
2. Les appareils ne répondent pas au degré de protection exigé.
3. La classe d'isolation n'est pas en conformité avec l'emplacement de l'appareil.
4. Les appareils de chauffage électrique ne sont pas entourés installés.
5. Contact direct possible.

I. CONTRÔLE VISUEL


1. Remarques générales.
2. Contact direct possible.
3. Contact indirect possible.

J. DOSSIER ELECTRIQUE

1. Le schéma unifilaire n'est pas présent.
2. Le schéma de position n'est pas présent.



N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 22/08072

EAN
code

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Prescription du
														gest. de réseau de distr.

Tijdelijk : Temporaire : ☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine : ☐	Indienststelling : Mise en service : ☒	Uitbreiding : Extension : ☐	Vernieuwing : Renouvellement : ☐
---	---	--	--	---

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

Installateur :

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : 380V	Meter / bord verbinding : 3x10-3	Max. beveiliging : 40A
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode :	Isolatie : 76 Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre :	Isolément :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :				Test ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type					OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
400	300	A	A-M-O-U				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
400	30	A	A-U				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
400	30	A	A-U				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
400	30	A	A-U				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.

L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : / /

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur:pour le directeur,
l'inspecteur:**ELECTRO-TEST** V.Z.W.

Johan GOEDHUYTS

Inspecteur

Gsm : 04722 940 201

TEL. : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09info@electro-test.be
www.electro-test.beDexio 068-2117692-15
KBC : 734-1126000-33IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBBBE 0434.433.603
RPA Brussel

INBREUKEN

A. AARDING

1. De spreiding van de aardingsweerstand is hoger dan 30 Ohm.
2. De spreiding van de aardingsweerstand is hoger dan 100 Ohm.
3. De spreiding van de aardingsweerstand is te hoog volgens de gevoeligheid van de differentieelschakelaar.
4. Er is geen aardelektrode/aardingslus aanwezig.
5. De aardgeleider bezit een onvoldoende sectie (min. 16 mm² Cu).
6. De aardingsonderbreker is niet aanwezig.

B. EQUIPOTENTIALE VERBINDINGEN (E.V.)

1. E.V. niet aanwezig.
2. E.V. niet bevestigd volgens de regels van de kunst.
3. De sectie van de hoofd E.V. is onvoldoende (min. 6 mm²).
4. Bijkomende E.V. in badkamer niet geplaatst of onjuist.
5. Bijkomende E.V. bezitten een onvoldoende sectie (beschermd 2,5 mm²).
6. De continuïteit is niet verzekerd.
7. De kleurcode is onjuist.

C. ISOLATIEWEERSTAND

1. Per kring : minder dan 500 kOhm

D. DIFFERENTIEEL SCHAKELAARS (D.S.)

1. Er zijn geen D.S. aanwezig.
2. De nominale stroom van de Algemene D.S. (A.D.S.) bedraagt minder dan 40A.
3. De nominale stroom van D.S. is onvoldoende.
4. De verzegelplaatjes van de A.D.S. zijn niet aanwezig.
5. Er is geen D.S. geplaatst voor de beveiliging van de badkamer, wasmachine...
6. Test ΔI_n : N.O.K.
7. Test 2,5 ΔI_n : N.O.K.

E. VERDEELBORD(EN) EN KRINGEN

1. De kringen zijn niet of onjuist gemerkt.
2. Het bord is niet bereikbaar of niet op een hoogte van +/- 1,5 m geplaatst.
3. Rechstreekse aanraking is mogelijk.
4. Er zijn geen kalibreerelementen geplaatst of deze zijn niet in functie van draadsecties.
5. Er zijn overbrugde veiligheden aanwezig.
6. Er zijn geen 2 kringen minimum aanwezig voor de verlichting.

F. LEIDINGEN

1. Niet gebruikte leidingen zijn niet verwijderd.
2. Er is geen reglementaire kleurcode gebruikt.
3. De aanwezige blauwe geleider wordt gebruikt als fasegeleider en er is een andere kleur beschikbaar.
4. Kabels zijn niet beschermd bij muurdoorvoering.
5. Kabels en PVC buis zijn niet mechanisch beschermd over een afstand van 10 cm boven het vloerniveau.
6. De gebruikte XVB en XFVB kabels verzonken in de muur volgen niet de voorgeschreven trajecten.
7. Installatiedraad niet beschermd of niet reglementair.

G. SCHAKELAARS EN STOPCONTACTEN

1. De stopcontacten zijn niet op voldoende hoogte van het vloerniveau geplaatst (van as tot vloer : 25 cm in vochtige lokalen en 15 cm droge lokalen).
2. Een schakelaar(s) snijdt niet de fasegeleider.
3. Het gebruikte materiaal stemt niet overeen met de vereiste beschermingsgraad.
4. Directe aanraking mogelijk

H. TOESTELLEN

1. De gebruikte toestellen dragen geen gelijkvormigheidslabel van een erkend Europees labo.
2. De toestellen voldoen niet aan de gewenste beschermingsgraad.
3. De isolatieklasse stemt niet overeen met de plaats van het toestel.
4. De verwarmingstoestellen zijn nog niet geplaatst.
5. Directe aanraking mogelijk

I. VISUEEL NAZICHT

1. Algemene opmerkingen
2. Directe aanraking mogelijk
3. Indirecte aanraking mogelijk

J. ELEKTRISCH DOSSIER

1. Eéndraadschema niet aanwezig
2. Situatieschema niet aanwezig

INFRACTIONS

A. PRISE DE TERRE

1. La résistance de la prise de terre dépasse 30 Ohms.
2. La résistance de la prise de terre dépasse 100 Ohms.
3. La résistance de la prise de terre est trop élevée en fonction de la sensibilité de l'interrupteur différentiel.
4. Absence d'une électrode de terre (boucle de terre)
5. La section du conducteur de mise à la terre est insuffisante (min 16 mm² Cu).
6. Il n'existe pas de coupe-terre

B. LIAISONS EQUIPOTENTIELLES (L.E.)

1. L.E. non réalisées.
2. L.E. non fixées d'après les règles de l'art.
3. La section de la L.E. principale est insuffisante (min 6 mm²).
4. L.E. supplément. dans salle de bains non réalisées ou incorrectes.
5. L.E. suppl. ont une section insuffisante (protégées 2,5 mm²).
6. La continuité n'est pas assurée.
7. La code des couleurs n'est pas correct.

C. RESISTANCE D'ISOLEMENT

1. Par circuit : inférieure à 500 kOhm

D. INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS (I.D.)

1. Absence de différentiels.
2. Le courant nominal de l'I.D. général est inférieur à 40A.
3. Le courant nominal de l'I.D. est insuffisant.
4. Les plaquettes de plombage de l'I.D. général manquent.
5. Absence d'un I.D. pour salle de bains, machine à laver...
6. Teste ΔI_n : P.O.K.
7. Teste 2,5 ΔI_n : P.O.K.

E. TABLEAUX DE DISTRIBUTION ET CIRCUITS

1. Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués.
2. Le tableau n'est pas accessible ou n'est pas à une hauteur de +/- 1,5 m du sol.
3. Contact direct est possible.
4. Absence d'éléments de calibrage ou inadaptes en fonction des sections des canalisations.
5. Il y a des fusibles pontés.
6. Il n'y a pas au minimum 2 circuits d'éclairage.

F. CANALISATIONS

1. Les canalisations non utilisées ne sont pas éliminées.
2. Il n'y a pas de code de couleurs réglementaire utilisé.
3. Le conducteur bleu présent est utilisé comme conducteur de phase et une autre couleur est disponible.
4. Les conduct. ne sont pas protégés dans les traversées des murs.
5. Conduct. et tubes PVC ne sont pas protégés mécaniquement à une distance de 10 cm au-dessus du niveau de sol.
6. Les canalisations XVB et XFVB noyées dans le mur ne suivent pas le parcours privilégié.
7. Conducteur d'installation non protégé ou pas réglementaire.

G. INTERRUPTEURS ET PRISES DE COURANT

1. Les prises de courant ne sont pas placées à une hauteur suffisante vis à vis du niveau de sol (25 cm dans des locaux humides et 15 cm dans des locaux secs).
2. Le conducteur de neutre est coupé au lieu du conduct. de phase.
3. Le matériel utilisé n'est pas conforme au degré de protection exigé.
4. Contact direct possible

H. APPAREILS


1. Les appareils utilisés ne sont pas pourvus d'un label de conformité d'un labo européen agréé.
2. Les appareils ne répondent pas au degré de protection exigé.
3. La classe d'isolation n'est pas en conformité avec l'emplacement de l'appareil.
4. Les appareils de chauffage électrique ne sont pas encore installés.
5. Contact direct possible

I. CONTROLE VISUEL

1. Remarques générales
2. Contact direct possible
3. Contact indirect possible

J. DOSSIER ELECTRIQUE

1. Le schéma unifilaire n'est pas présent.
2. Le schéma de position n'est pas présent.

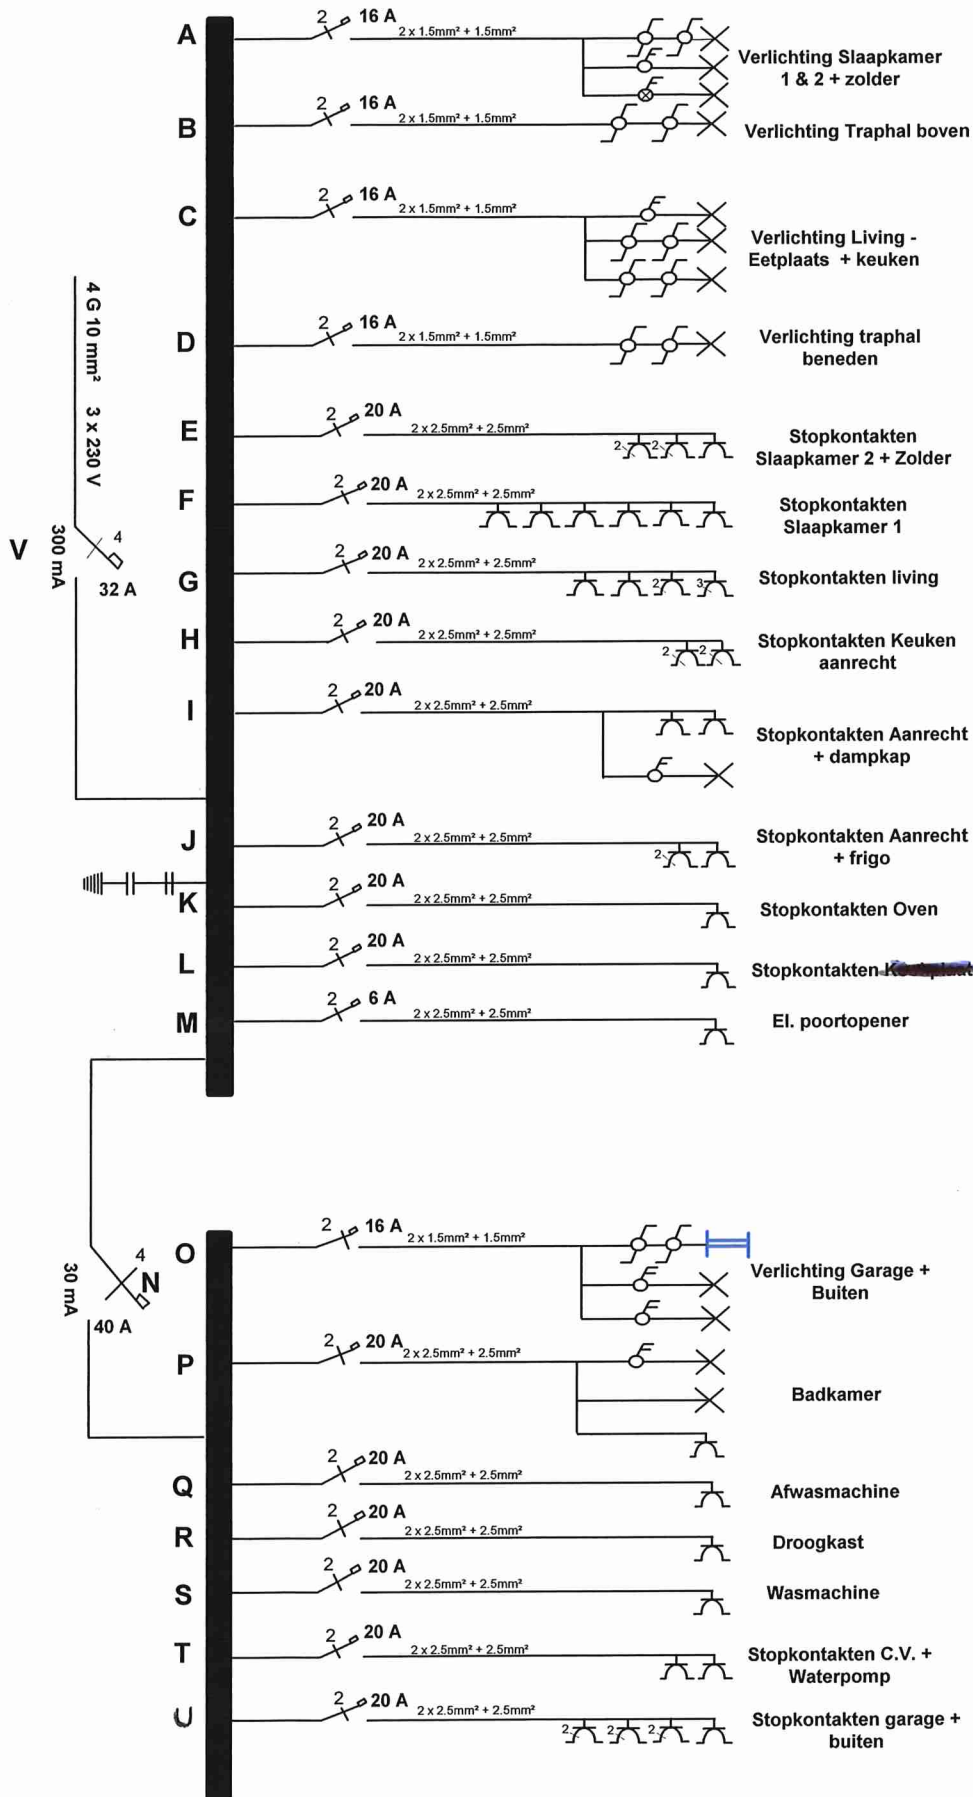

KEURING & CONTROLS v.z.w.

GOEDHUIJS J. Specteur

Norm :
Date :
Signature :

Bergstraat 44 9470 Denderleeuw

Werf/Chantier :


Eendraadschema

Installateur : Pilate Cabling Solutions bvba

BTW / TVA : BE 466.676.106

Date : 02/07/07

Signature : Pilate Danny

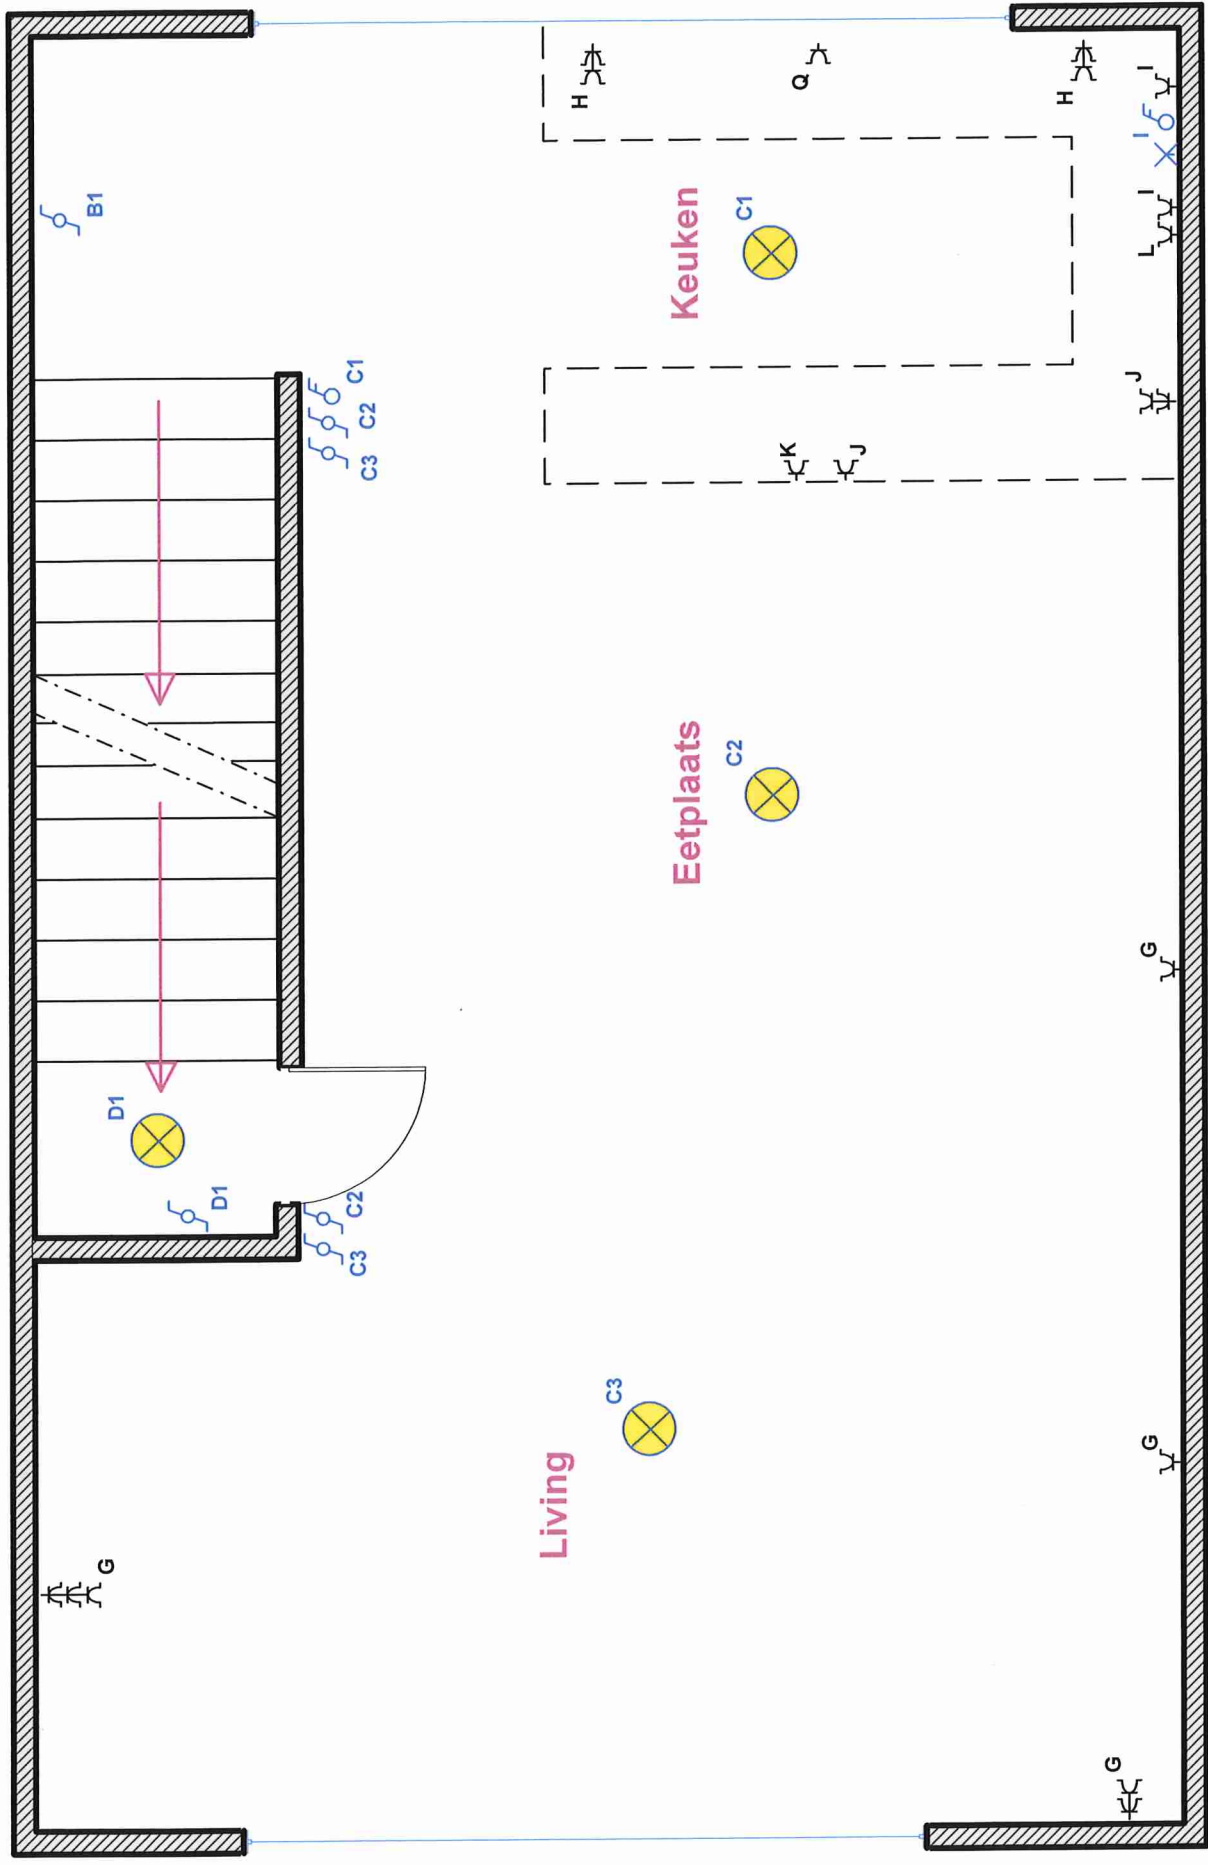

Keuring Controle-51
Nom: Shan GOEDHUYTS
Date: 02/07/07
Signature: (0472) 940.201

Werf/Chantier : 9470 Denderleeuw


1ste verdieping : Situatieschema

Installateur : Pilate Cabling Solutions bvba

BTW / TVA : BE 466.676.106

Date : 02/07/07


Signature : Pilate Dannv

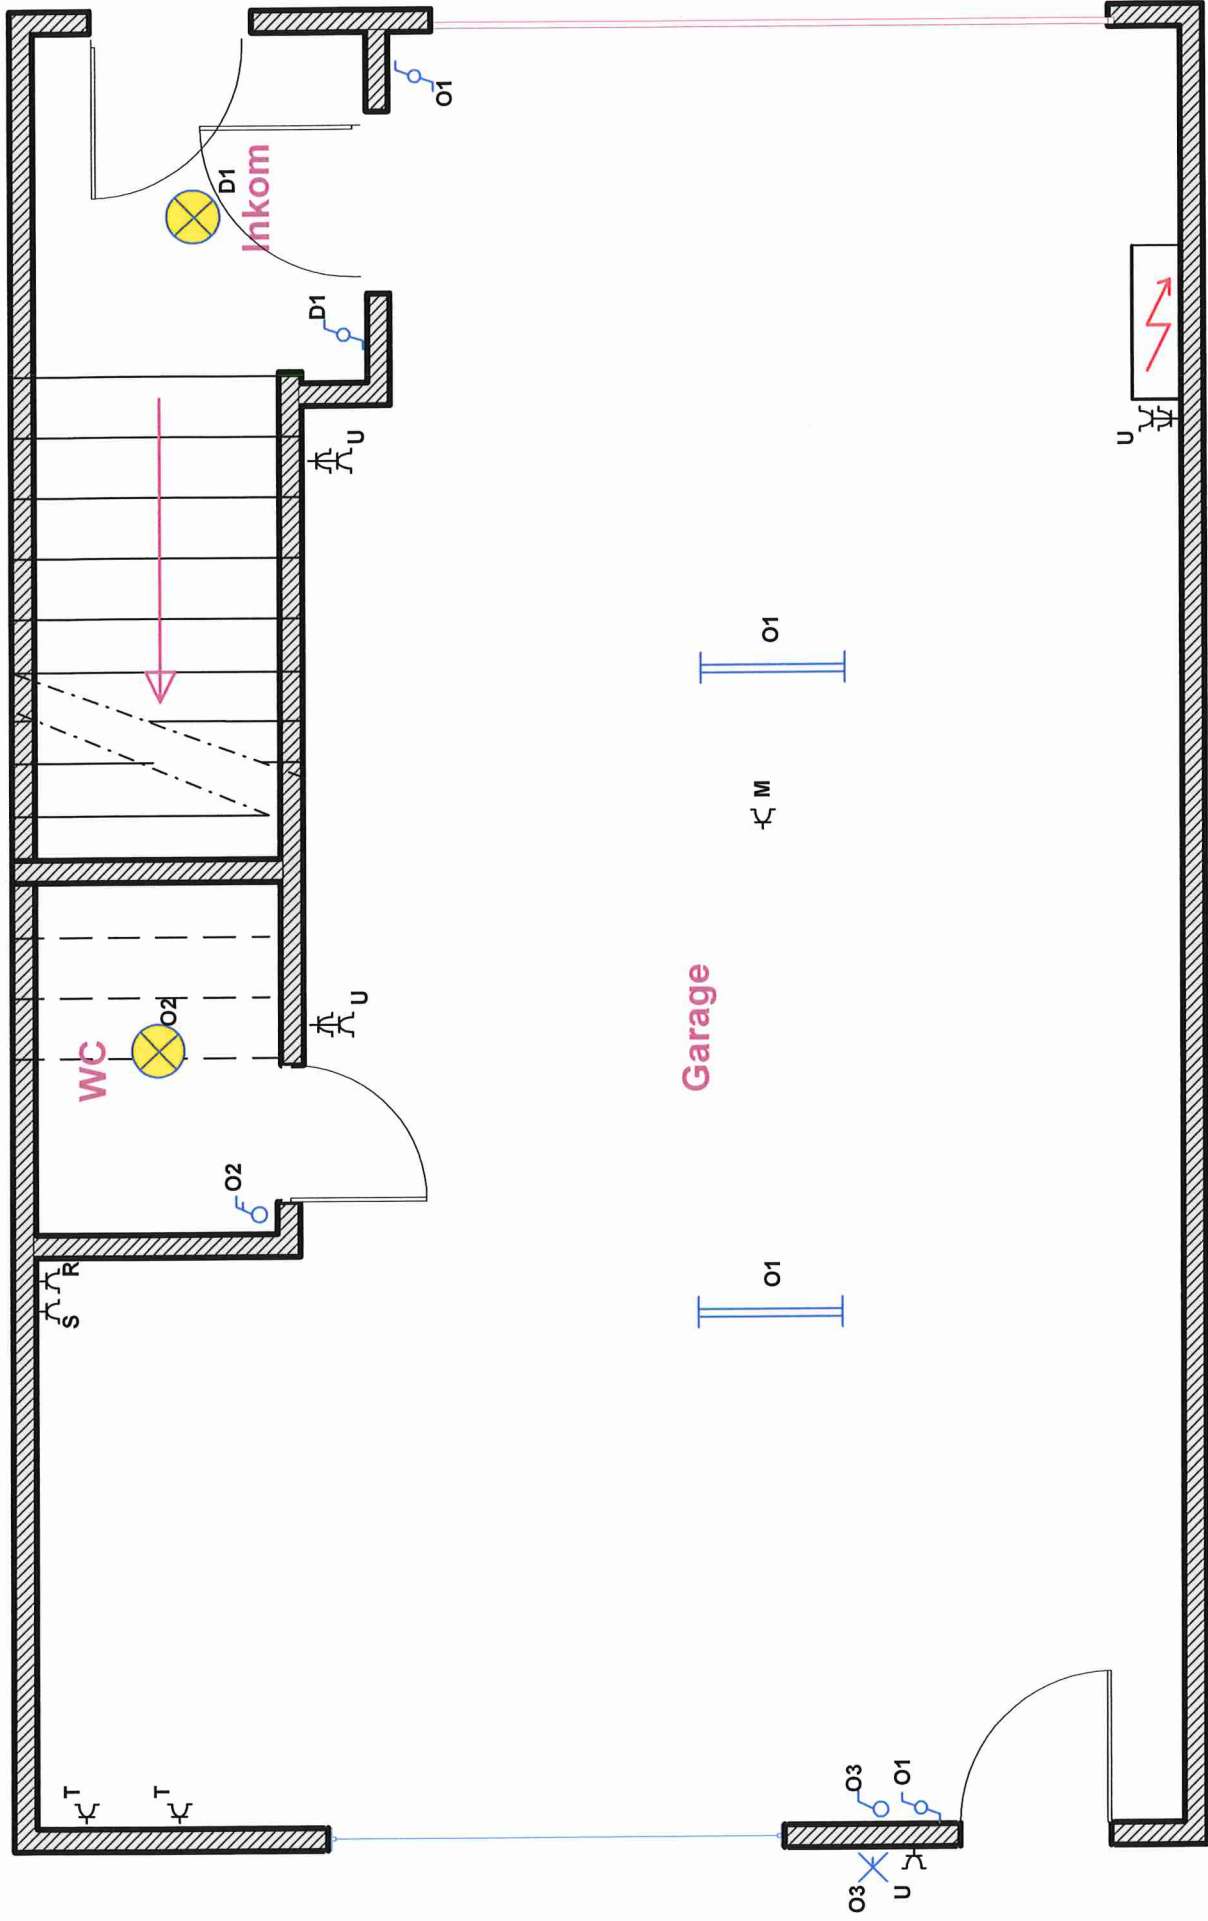

Keuring / Controle
Nom : **Johan GOEDHUYTS**
Date : **G.s.m. : (0472) 940.20**
Signature :

Werf/Chantier : **Bergstraat 9470 Denderleeuw**
Gelijkvloers : Situatieschema

Installateur : **Pilate Cabling Solutions bvba**
BTW / TVA : **BE 466.676.106**
Date : **02/07/07**
Signature : **Pilate Nannv**

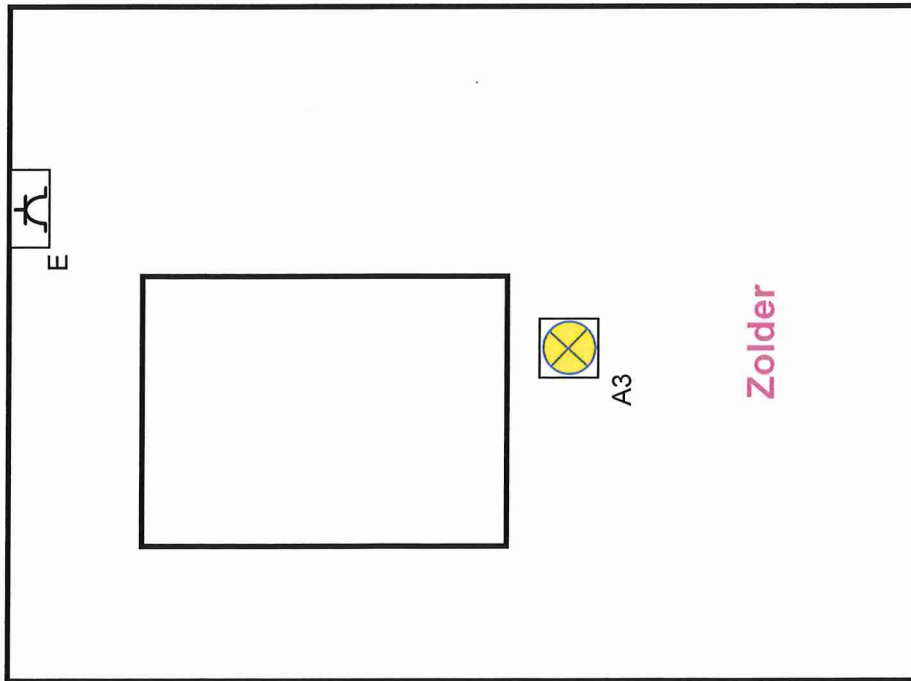

Installateur : Pilate Cabling Solutions bvba BTW / TVA : BE 466.676.106 Date : 02/07/07 Signature : Pilate Danny	Werf/Chantier :  Bergstraat 9470 Denderleeuw	Keuring /Controle : Nom :  ELECTRO-TEST v.z.w. Date : 10 Signature : Johan GOEDHUYTS Inspecteur G.s.m. : (0472) 940.201
Bovenverdieping : Situatieschema		

**Verslag van de tussenkomst
aan de gasmeetinstallatie**



Infrastructuurgebied: Zenne Dender

Leveringsplaats Naam, voornaam: <u>[redacted]</u> Straat: <u>Bergstraat</u> Nr.: <u>8u</u> Bus: <u>14A</u> Postcode: <u>9470</u> Gemeente: <u>Denderleeuw</u>	Eindafnemer (indien verschillend van leveringsplaats) Naam, voornaam: Straat: Nr.: Bus: Postcode: Gemeente:
Gasmeter Meternummer: <u>22664850</u> Metertype: <u>Gu</u>	Dichtheidsproef Meterstand na 10 min. : <u>0,133</u> m ³ Meterstand begin : <u>0,133</u> m ³ Debiet/10 min. : <u>0</u> liter

☒ De installatie werd in dienst gesteld:

- ☒ De installatie is gasdicht.
- ☐ Er werd een klein gebrek aan dichtheid vastgesteld.
Door de indienststelling van de installatie verbindt de eindafnemer zich ertoe de definitieve herstelling zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren volgens de regels van goed vakmanschap.
- ☐ Het toestel werd buiten dienst gesteld.

☐ De installatie mag NIET in dienst worden gesteld:

- ☐ Er werd een gebrek aan dichtheid vastgesteld. De meter mag pas na herstelling van de binnenleiding en een nieuwe positieve controle ervan door de uitvoerder worden geopend.
- ☐ Er werd een ernstige niet conformiteit met onmiddellijk gevaar vastgesteld.
Opmerking: dit vervangt niet de conformiteitscontrole door de installateur en/of een erkend controleorganisme.
- ☐ Er werd geen attest van conformiteit met de normen afgeleverd.
- ☐ Er is geen controleverslag van de keuring afgeleverd.
- ☐ De binneninstallatie ontbreekt.
- ☐ U was afwezig - neem contact op met de distributienetbeheerder.

Opmerkingen:


Het is me bekend dat ik volledig verantwoordelijk ben bij een ongeval als gevolg van een slecht werkende gasinstallatie. Hierbij verbind ik me er toe de definitieve herstelling van de vastgestelde gebreken zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren.

De installatie werd buiten dienst gesteld ☐ Om administratieve reden ☐ Wegens verhuizing

Een kopie van dit document:

- ☐ is overhandigd aan: ☐ de eindafnemer ☒ de afgevaardigde van de eindafnemer.
- ☐ is aan de gasmeter bevestigd.

Opgemaakt door de uitvoerder Naam, voornaam: <u>[redacted]</u> Datum: <u>26/09/07</u>	Voor ontvangst door de eindafnemer of zijn afgevaardigde Naam, voornaam: <u>[redacted]</u> Adres: <u>Bergstraat 8u</u> <u>9470 Denderleeuw</u> Hoedanigheid: - eigenaar/huurder - andere: Ik werd vooraf door de distributienetbeheerder ingelicht over de voorschriften terzake en ik bevestig dat de installatie sinds de sluiting van de gasmeter niet werd gewijzigd (bij het manueel openen van de gasmeter van een bestaande installatie). Handtekening: <u>[redacted]</u>
Handtekening: <u>[signature]</u>	Handtekening: <u>[redacted]</u>

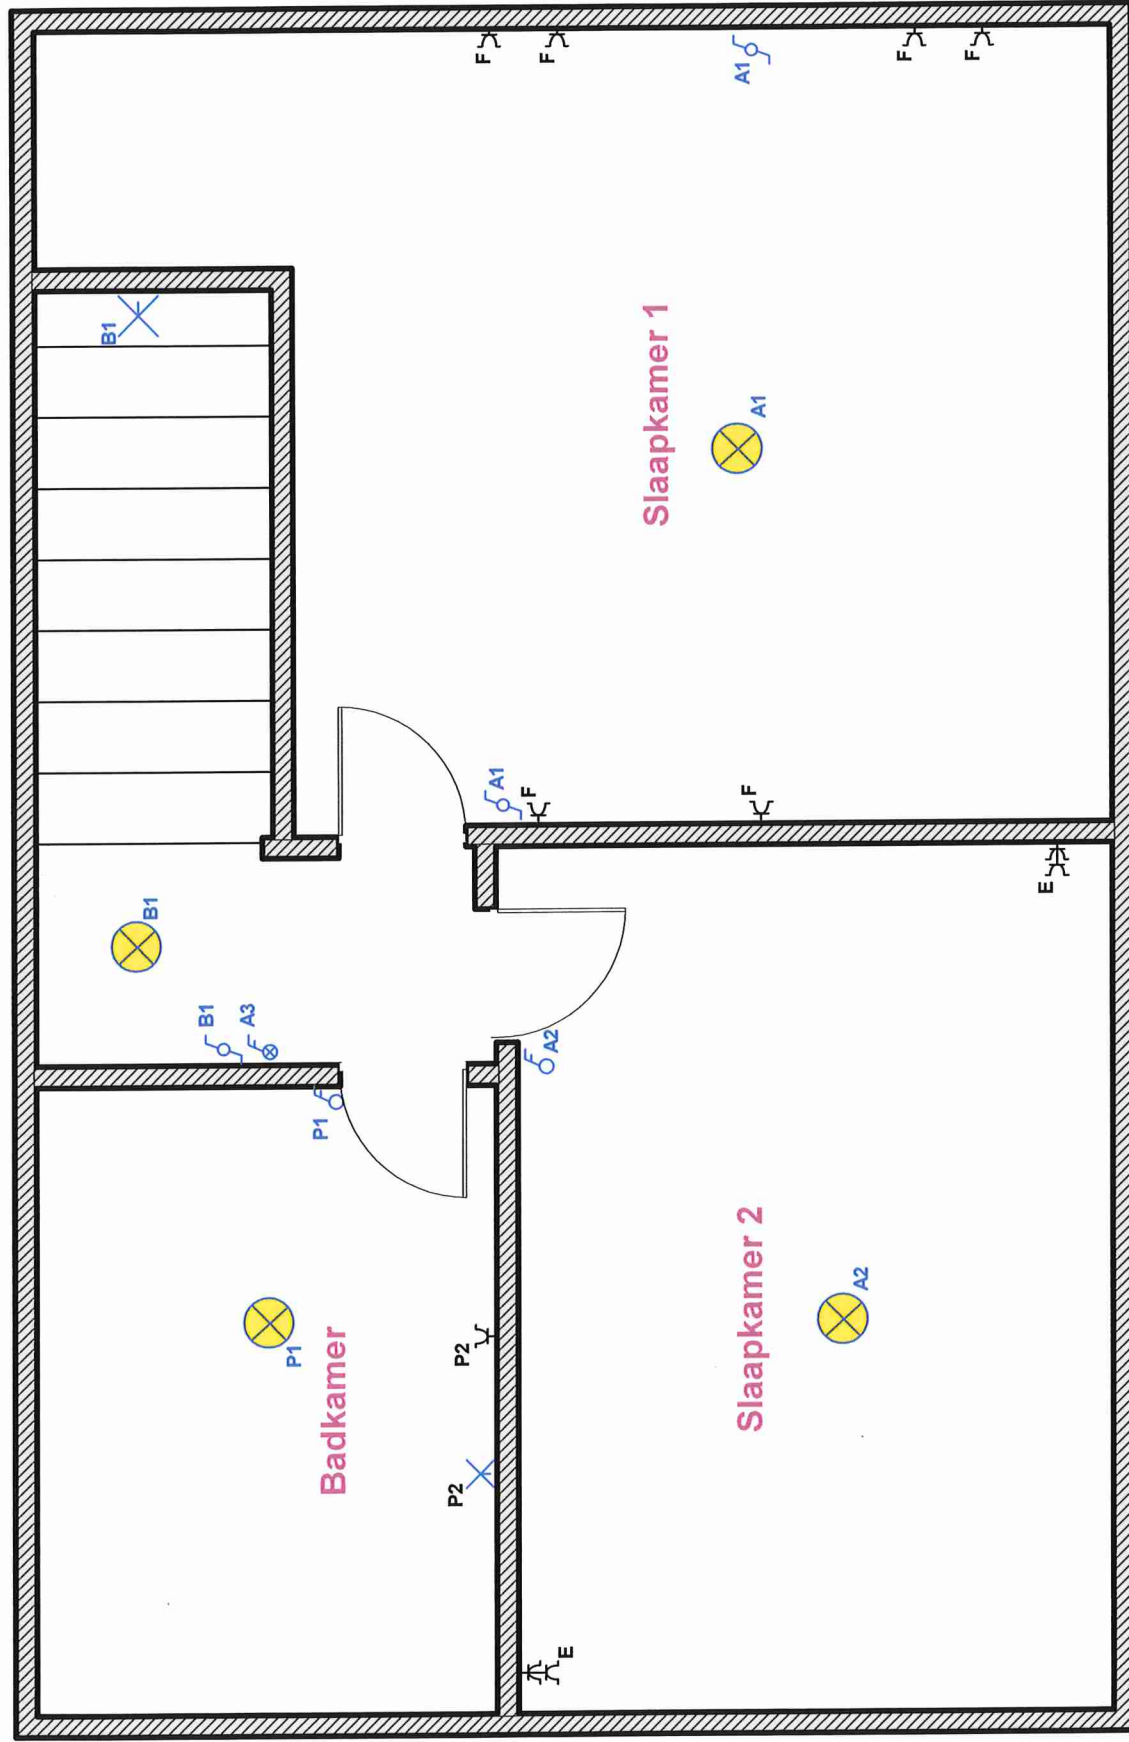

Installateur : Pilate Cabling Solutions bvba BTW / TVA : BE 466.676.106 Date : 02/07/07 Signature :  Pilate Danny	Werf/Chantier :  Bergstraat 9470 Denderleeuw Bovenverdieping : Situatieschema	Keuring / Controle :  GOEDHUYNS V.Z. 192 Nom : Johan GOEDHUYNS Date : 02/07/07 Signature :  Johan GOEDHUYNS Inspecteur (0472) 940.201
--	---	--

