

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.  
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

P.L.E

Nr teller :

N° comp :

Index :

## Verslag van onderzoek

## Rapport de contrôle

N° : 15.0151/6

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	ARAB	262	TT TN IT	Voorschr. stroomlev. Prescription du distributeur
Nature du contrôle :	RGIE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RGPT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tijdelijk : Temporaire :	<input type="checkbox"/>	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	<input type="checkbox"/>	Indienststelling : Mise en service :	<input checked="" type="checkbox"/>	Uitbreiding : Extension :	<input type="checkbox"/>	Vernieuwing : Renouvellement :	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle : Rue VINAVE 124 4030 Quirieu

Eigenaar :

Propriétaire : SPAL DANCO Adres :

Ik. / C.I. :

Installateur :

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

21.02.05

Inspecteur : Lollo Antonio

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Apart. - 3 ☐

Spanning 3x400V Tension	Meter / bord verbinding : EXUB 4x40V Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : Prot. maximale : Max 3x40A
----------------------------	--	--

Aardelektrode : Riquit Electrode de terre : 12.2 Ohm	Isolatie : 15 Mohm Isolement :	Aantal verdeelborden : 1 Nombre de tableaux :
---	-----------------------------------	--

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels		Beschermde kringen - Circuits protégés :		AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)			270	276
40W	300	Differentiël generaal		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40W	30	Differentiël lokale kringen combi de 1-2-29		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3 Disjunctoren de 16A IV		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		1 " de 20A IV		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		18 " de 20A II		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6 " de 16A II		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opmerkingen / Remarques :

(zie keerzijde / voir verso)

Des accumulateurs ne sont pas installés à ce jour.

356 353

VISUM :

ELECTRO-TEST ASBL

Lollo Antonio  
Tel. 041/38 06 57  
Mob. 075/74 84 06

Datum/date :

## Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.  
L'installation est — ~~niet~~ — conforme au RGIE et peut — ~~ne peut pas~~ — temporairement — être mise en service — ~~rester en service~~.  
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.  
Het einddraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.  
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.  
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 21.02.2020

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :



voor de technisch directeur,  
de inspecteur :

pour le directeur technique,  
le contrôleur :

Lollo Antonio

NOTA ONDERNEMINGEN : Krachtens art. 14 van het hoofdstuk II van Titel II van de Codex moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Preventie en Bescherming van het Werk.  
NOTA HUURDEURS, EIGENAARS : Krachtens het AREI bent u verplicht : 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie ; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier ; 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directe elektr. energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPRISES : Conformément à l'art. 14 du chapitre II du Titre II du Codex ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.  
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique ; 2) de noter dans le dossier de l'installation électrique ; 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Économiques, direction "Énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à l'imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

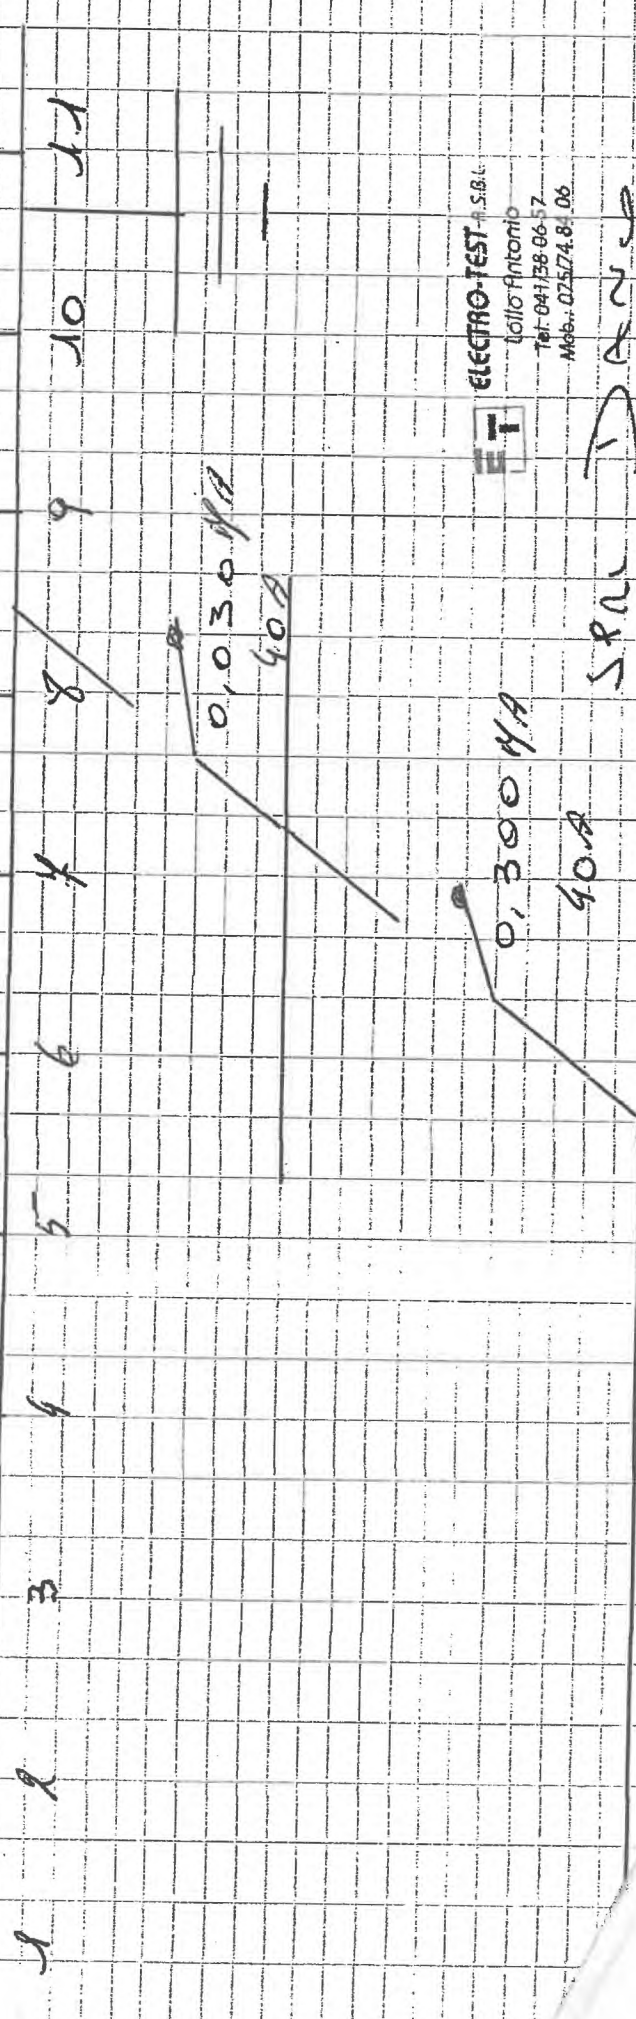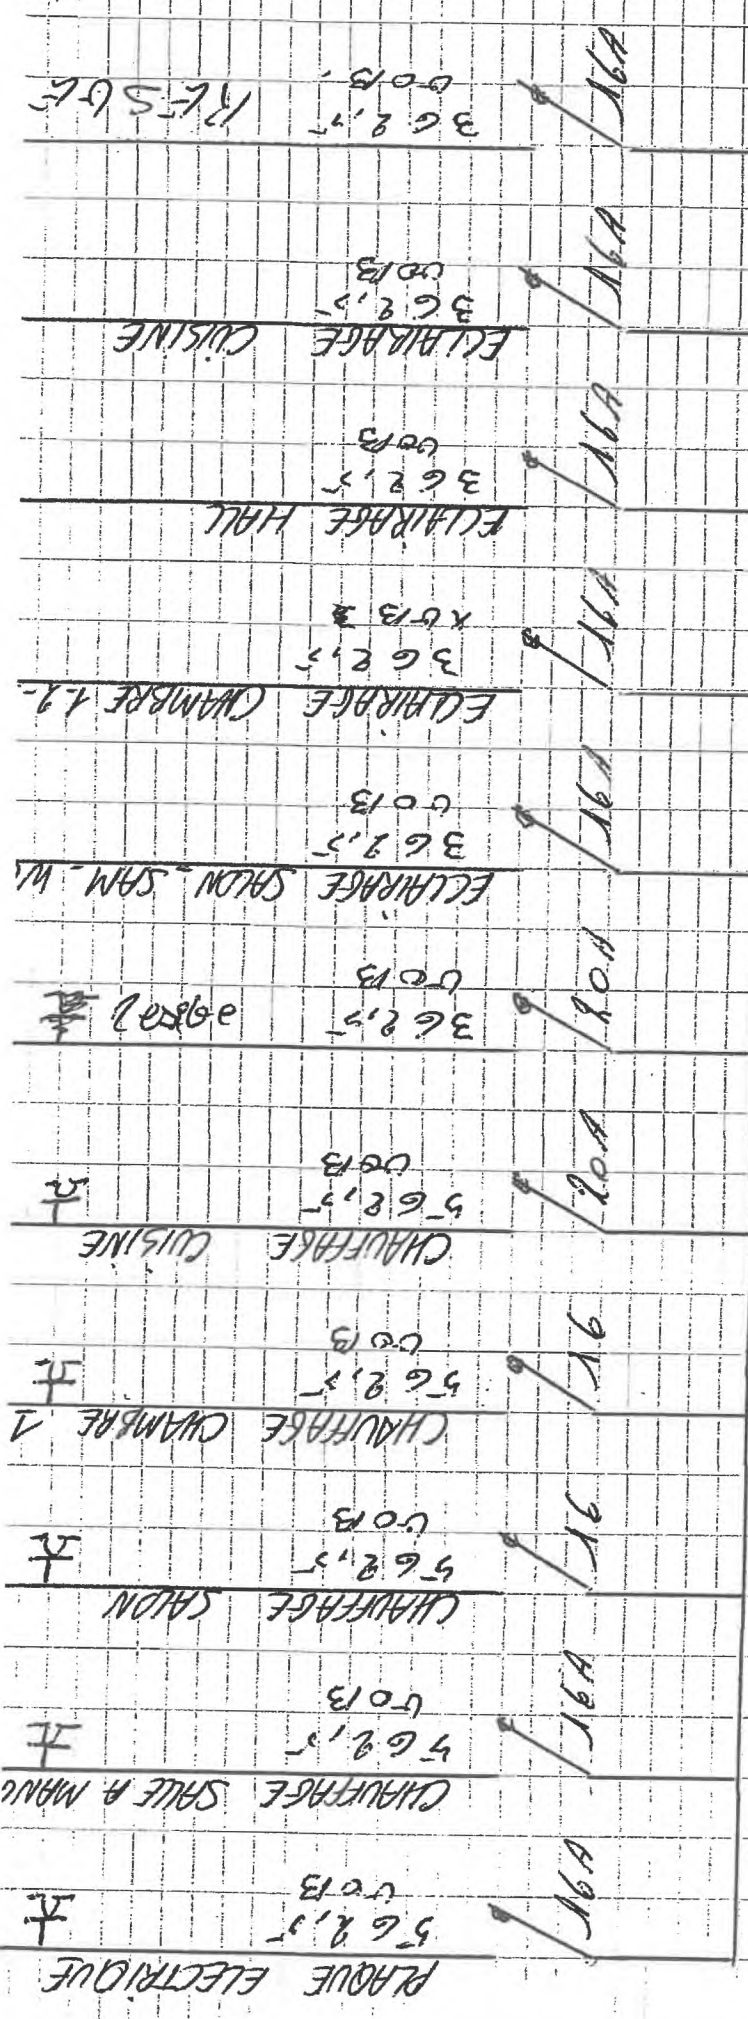

ELECTRO-TEST S.B.L.  
 Lillo Antonio  
 Tel: 04138 0657  
 Mob: 07574 8106

SPN TANS

13 4 x 10' 13 x 4000 + N.

-3



SECHOIR

362,5  
0013

20A

12

MACHINE A LAVER

362,5  
0013

20A

13

BOILER

362,5  
0013

20A

14

PRISE CHAMBRE 2 et 3

362,5  
0013

20A

15

PRISE ECLAIRAGE CHAMBRE 4

362,5  
0013

20A

16

PRISE SALON

362,5  
0013

20A

17

PRISE SALON

362,5  
0013

20A

18

PRISE CHAMBRE 1

362,5  
0013

20A

19

CHAUFFAGE HALL

362,5  
0013

20A

20

CHAUFFAGE CHAMBRE 2

362,5  
0013

20A

21

CHAUFFAGE CHAMBRE 3

362,5  
0013

20A

22



4x 10A  
1x 4N

0,300 HA  
40A

0,030 HA  
40A



ELECTRO-TEST A.S.B.C.  
Jollo Antonio  
Tel. 041/38 05 57  
Mob: 075/74 84 06

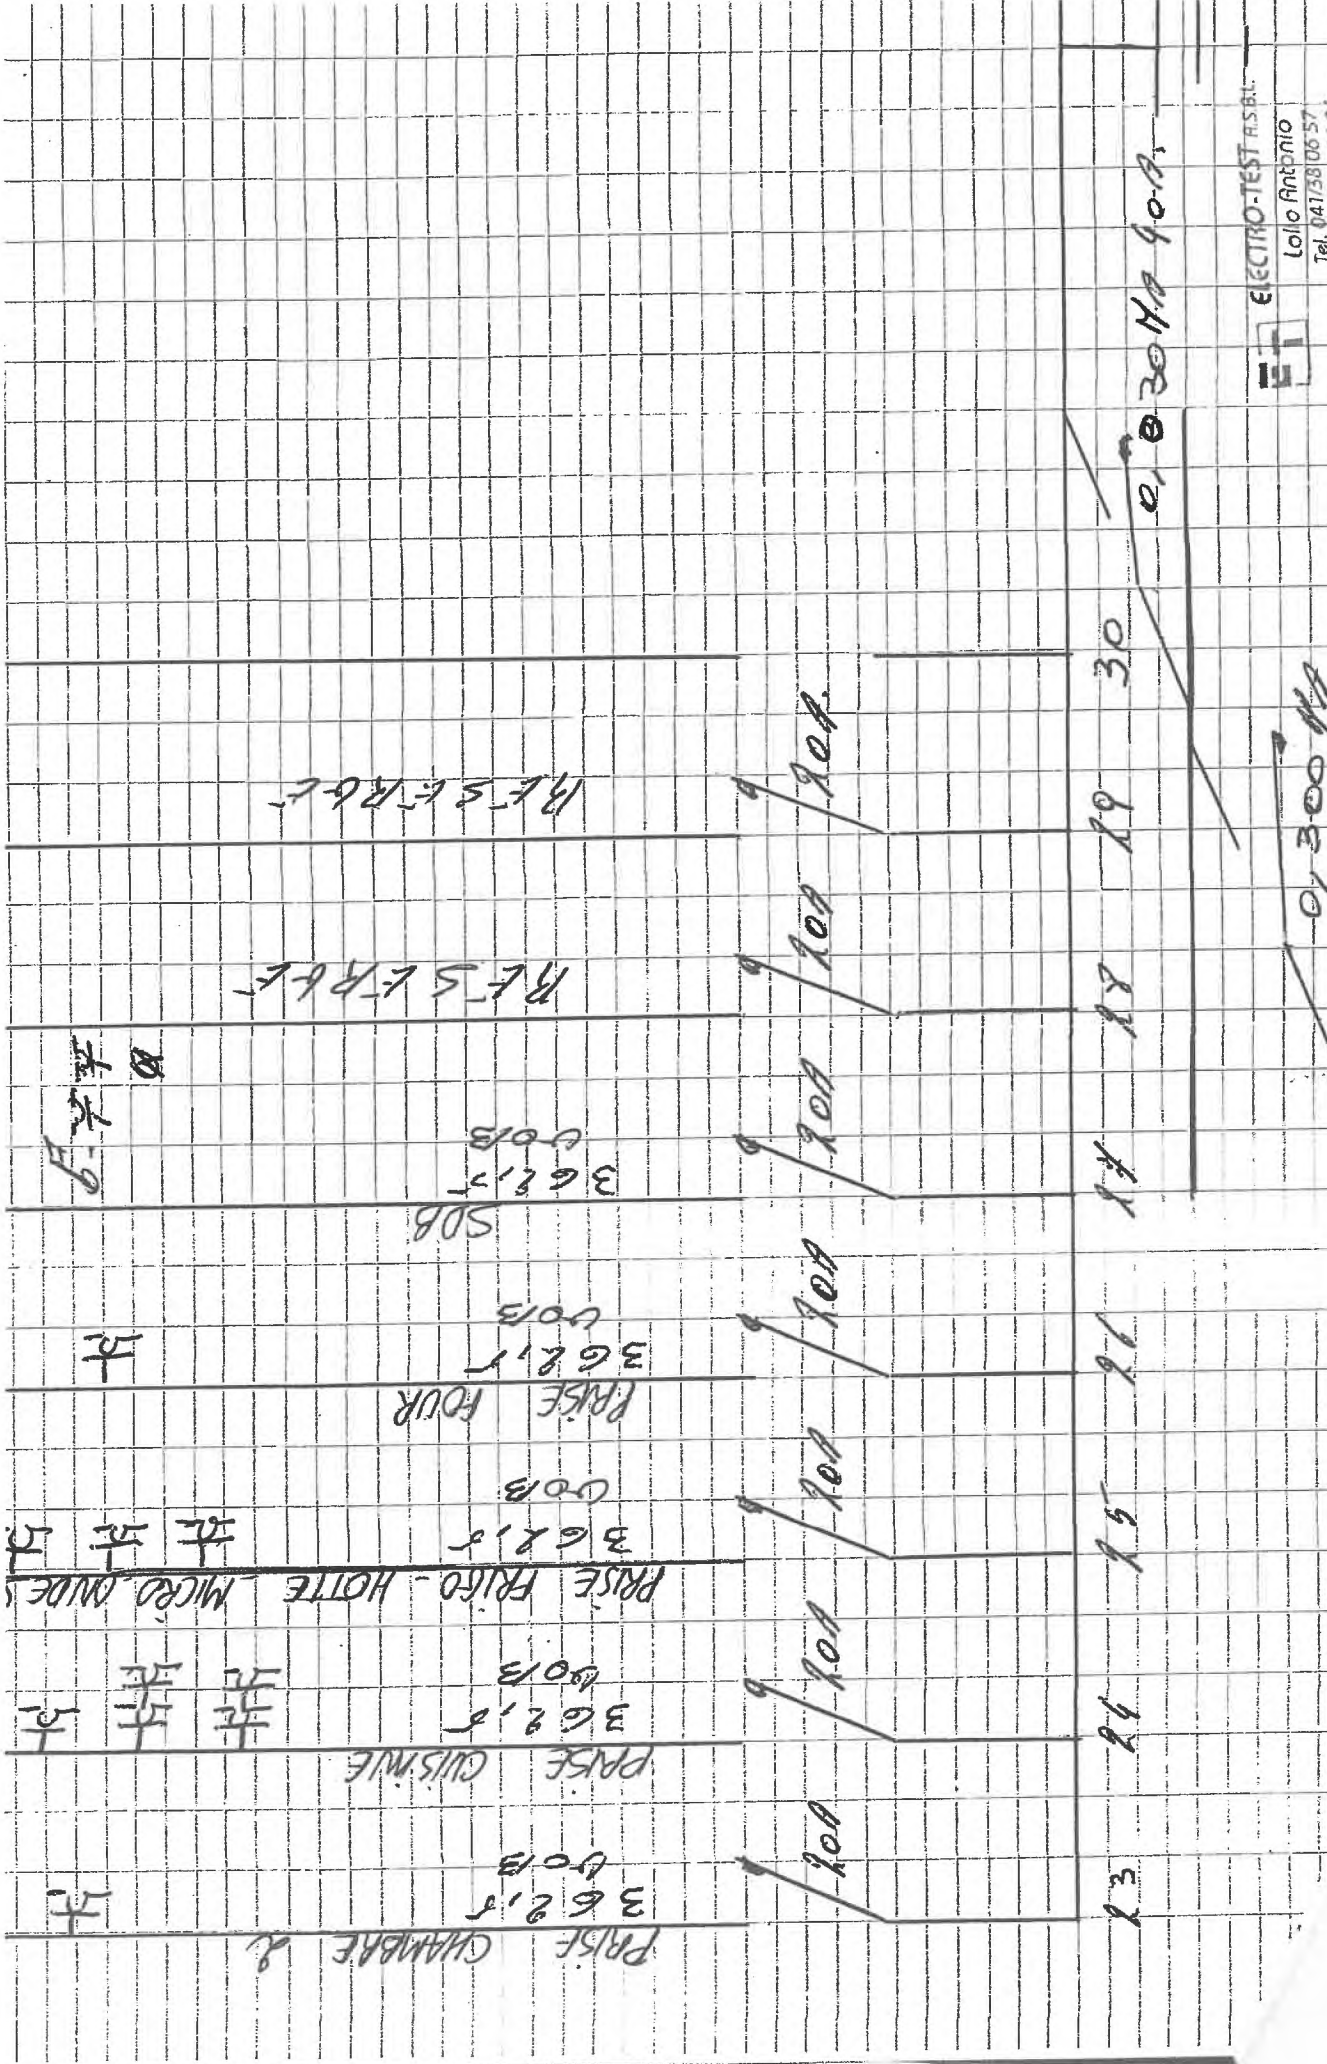

ELECTRO-TEST ASBL  
Lolo Antonio  
Tel. 04138 06 57  
MOS. 07571-84-06

2013 4 X 10<sup>3</sup> V  
2013 4 X 10<sup>3</sup> V
