

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

Datum(s) van controle: 21/01/2021
Verslagnummer: 0535-210121-01

Uitgiftedatum verslag: 21/01/2021

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 011 42 18 34 E: btv.limburg@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0535

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: [REDACTED]
Adres: GENKERSTEENWEG 212, 3500 HASSELT
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: [REDACTED]
Adres: GENKERSTEENWEG 212, 3500 HASSELT
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Onbekend
Adres:
BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: AMAZING L&D
Adres: GENKERSTEENWEG 212, 3500 HASSELT
EAN- code: 541449206005239695
Nummer teller: 93445175
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Kamerverhuur / Privé

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hoofdbord: Type: EXVB - Doorsnede: 4 x 16 mm²

Type aardelektrode: Aardingsbaren

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A

Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA


Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 24 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A,
beschermde stroombanen: A t/m E

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A,
beschermde stroombanen: F t/m X

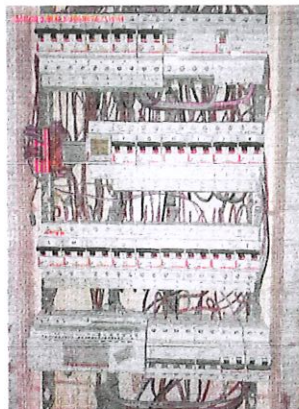

Document met uitwendige invloeden: Niet aanwezig

Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.

Andere gegevens: Geen meegedeeld

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: NG Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: >0,5 MOhm

Vastgestelde inbreuken:

- 1 Het stroombaanschema / prinsipeschema strookt niet met de werkelijkheid (Boek 1: 3.1.2.1). o.a niet alles ingetekend na uitbreiding
- 2 De situatieplannen stroken niet met de werkelijkheid (Boek 1: 3.1.2.1).o.a keuken eiland
- 3 Er is geen ondergeschikte differentieelstroominrichting van maximum 30 mA geplaatst voor de beveiliging van de "vochtige kringen" (Boek 1: 4.2.4.3). o.a Droogkast
- 4 Het document met de uitwendige invloeden ontbreekt (Boek 1: 9.1.6).
- 5 De aardingsonderbreker ontbreekt of is niet op een normale manier bereikbaar (Boek 1: 5.4.3.5). Spreidingweerstand niet gemeten.
- 6 De voeding van het stopcontact binnen volume 2 van de badkamer is niet beveiligd door een differentieelstroominrichting van max. 10 mA of beschermingstransfo van max. 100W (Boek 1: 7.1).o.a kamer loopband.
- 7 Een schakelaar op laagspanning mag niet geplaatst worden in volume 2 van de badkamer (Boek 1: 7.1).
- 8 De hoofdequipotentiale verbindingen ontbreken of zijn onvolledig (Boek 1: 4.2.3.2).

Opmerkingen:

- 1 Oude niet gebruikt leidingen of toestellen die niet meer indienst zijn, dienen te worden verwijderd.
- 2 Het is mogelijk dat na het voorleggen van de schema's en/of beschrijving van de kringen er bij een volgende keuring bijkomende inbreuken kunnen opgemerkt worden.



Besluit van de controle:

3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1, van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):
