



Belgische Industriële Controle v.z.w

Erkend Controleorganisme
Externe dienst voor de technische controles op de arbeidsplaats



C I B
Nr 2341

Luik : 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse

Vilvoorde : 277 Mechelsesteenweg - 1800 Vilvoorde

Henegouwen : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières

B.T.W. BE 0406.671.312

cibic@skynet.be

Tel : 04 234 17 00 Fax : 04 234 17 80

Tel : 065 34 76 50 Fax : 065 36 15 88

VERTROUWELIJK

Onderzoeksverslag - Conformiteitsverslag - Huishoudelijke bestaande LS / ZLS installatie

Verslag nr : 12/130717/1

Betreft: ☐ Controle in het kader van een verkoop ☒ periodieke controle

Aanvrager : Buis elektrische

Persoon ter plaatse : Buis Willem EAN-code van de installatie :

Type woning : ☐ huis ☐ appartement ☒ andere: Studio

Adres van bezoek : Kuyperlaan 112A/101 3000 Leuven

Datum van bezoek : 12/07/2018 Datum redactie : Referenties klant : 0463-557-057

Reglementaire voorschriften : AREI art. ☒ 271 ☐ 276 bis met gebruik van de uitzonderingen van ☒ 271 bis ☐ 278

Gebruikte BIC-vzw procedure : PRO-INS-E- 11

Beschrijving van de bezochte installatie :

Nominale spanning : <input checked="" type="checkbox"/> 230V	Algemene bescherming van de aansluiting : A
<input type="checkbox"/> 3N400 V <input type="checkbox"/> 3x230V <input checked="" type="checkbox"/> 2x230V <input type="checkbox"/> 1N400V	Aantal borden : 1 aantal eindstroombanen : 6

Controles door visueel onderzoek, testen en metingen :

Beschrijving	In orde	Niet in orde	Niet v toep. of uitzondering.
Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's	✓		
Staat van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel	✓		
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking	✓		
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking, werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testknop. Nota : differentieel <input checked="" type="checkbox"/> was verzegeld <input type="checkbox"/> niet verzegelbaar <input type="checkbox"/> terug verzegeld	✓		
Foutlussen en juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen	✓		
Continuïteit van de: equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende), continuïteit vb de beschermingsgeleiders tot de apparaten	✓		
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel	✓		
Visuele controle van verplaatsbaar materieel, op het moment van de controle aangeschakeld	✓		
De doorsnede van de geleiders behoren tot het M.B. van 27/7/1981 & uitz.	✓		
Algemene isolatieniveau : 4 MΩ	✓		
Spreidingsweerstand van de aardelektrode : 7,1 Ω	✓		

Identificatie van de meetapparaten : hernomen in het dossier individuele uitrusting van de BIC agent

Gebreken / Nota's :

INBREUKEN: geen

Besluiten :


☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn van 12/07/2018

☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het Algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.). Een aanvullende onderzoek is uit te voeren door hetzelfde organisme na conformiteit ☐ na afloop van 18 maanden na handtekening van de verkoopakte.

☐ De resultaten van de controle staan niet toe om tot een conclusie te komen. Een aanvullende onderzoek is uit te voeren door hetzelfde organisme om het dossier aan te vullen.

Naam en handtekening van de inspecteur : in opdracht voor BIC, John Kuyper

Naam en handtekening van de aanvrager, voor ontvangst :

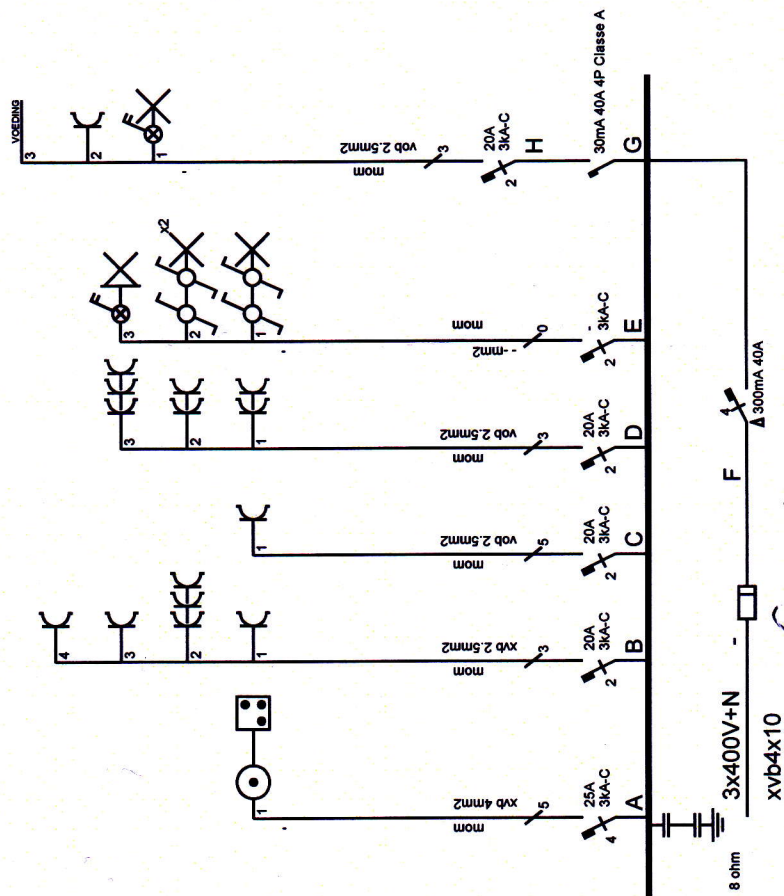

Afgev. erkend organisatie

09/07/2013

Colleman Patrick
Kapucijnenvoer 112A/0101
3000 Leuven
EAN ?


Verantw. uitvoering

09/07/2013

Bries Elektrotechniek

BE 0463.567.057

Jozef Eerdekenstraat 9
3001 Heverlee

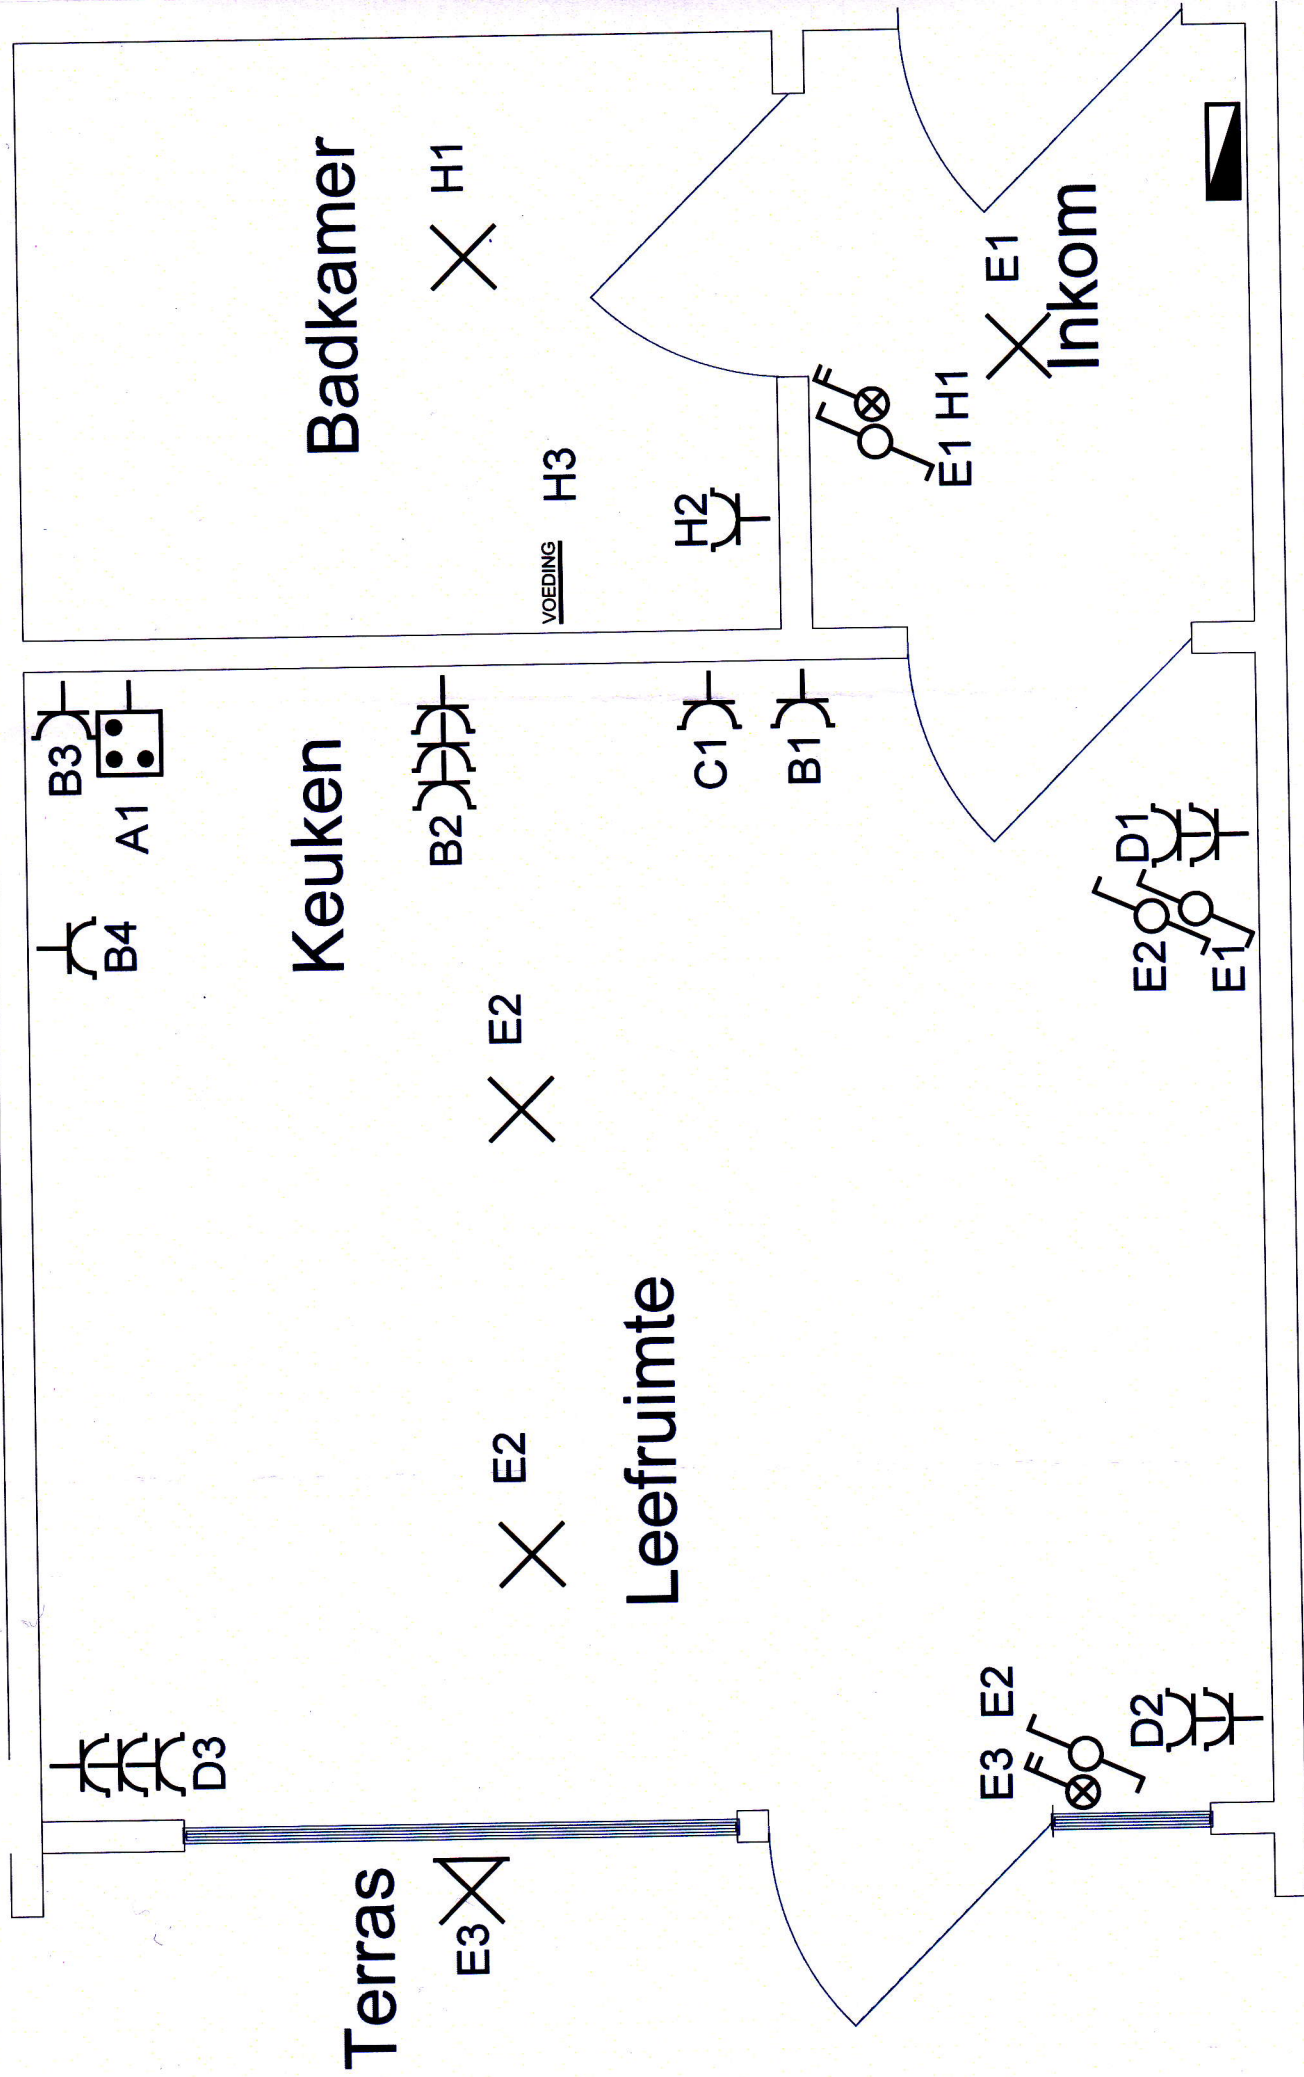

Kapucijnenvoer 112a/01.01 te 3000 Leuven.
