

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 28/04/2025

Inspecteur: Selim Akbel

Mentor:

Installateur: Daco Elektro

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0563 472 703

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102 BT

Serienummer: 23280801

Datum verslag: 28/04/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Elslopark
Huisnummer: 30
Busnummer:
Postcode: 9940
Gemeente: EVERGEM
Land: België

Eigenaar

Naam: Xaver Vermeulen
Straatnaam: Elslopark
Huisnummer: 30
Busnummer:
Postcode: 9940
Gemeente: EVERGEM
Land: België

Installateur

Naam: Daco Elektro
BTW nr.: BE 0563 472 703
Telefoonnummer: 0496 02 44 23
E-mail: info@daco-elektro.be

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 54

Teller Nr. : 26133879



Aard onderzoek:

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Ja

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 14



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 181,8 MΩ

RE: 0,15 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	14	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's	-	-		-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 28/4/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.
Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 08:41 tot 09:17
De inspecteur Selim Akbel

Selim Akbel
ACEG VZW - 378

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 28/4/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



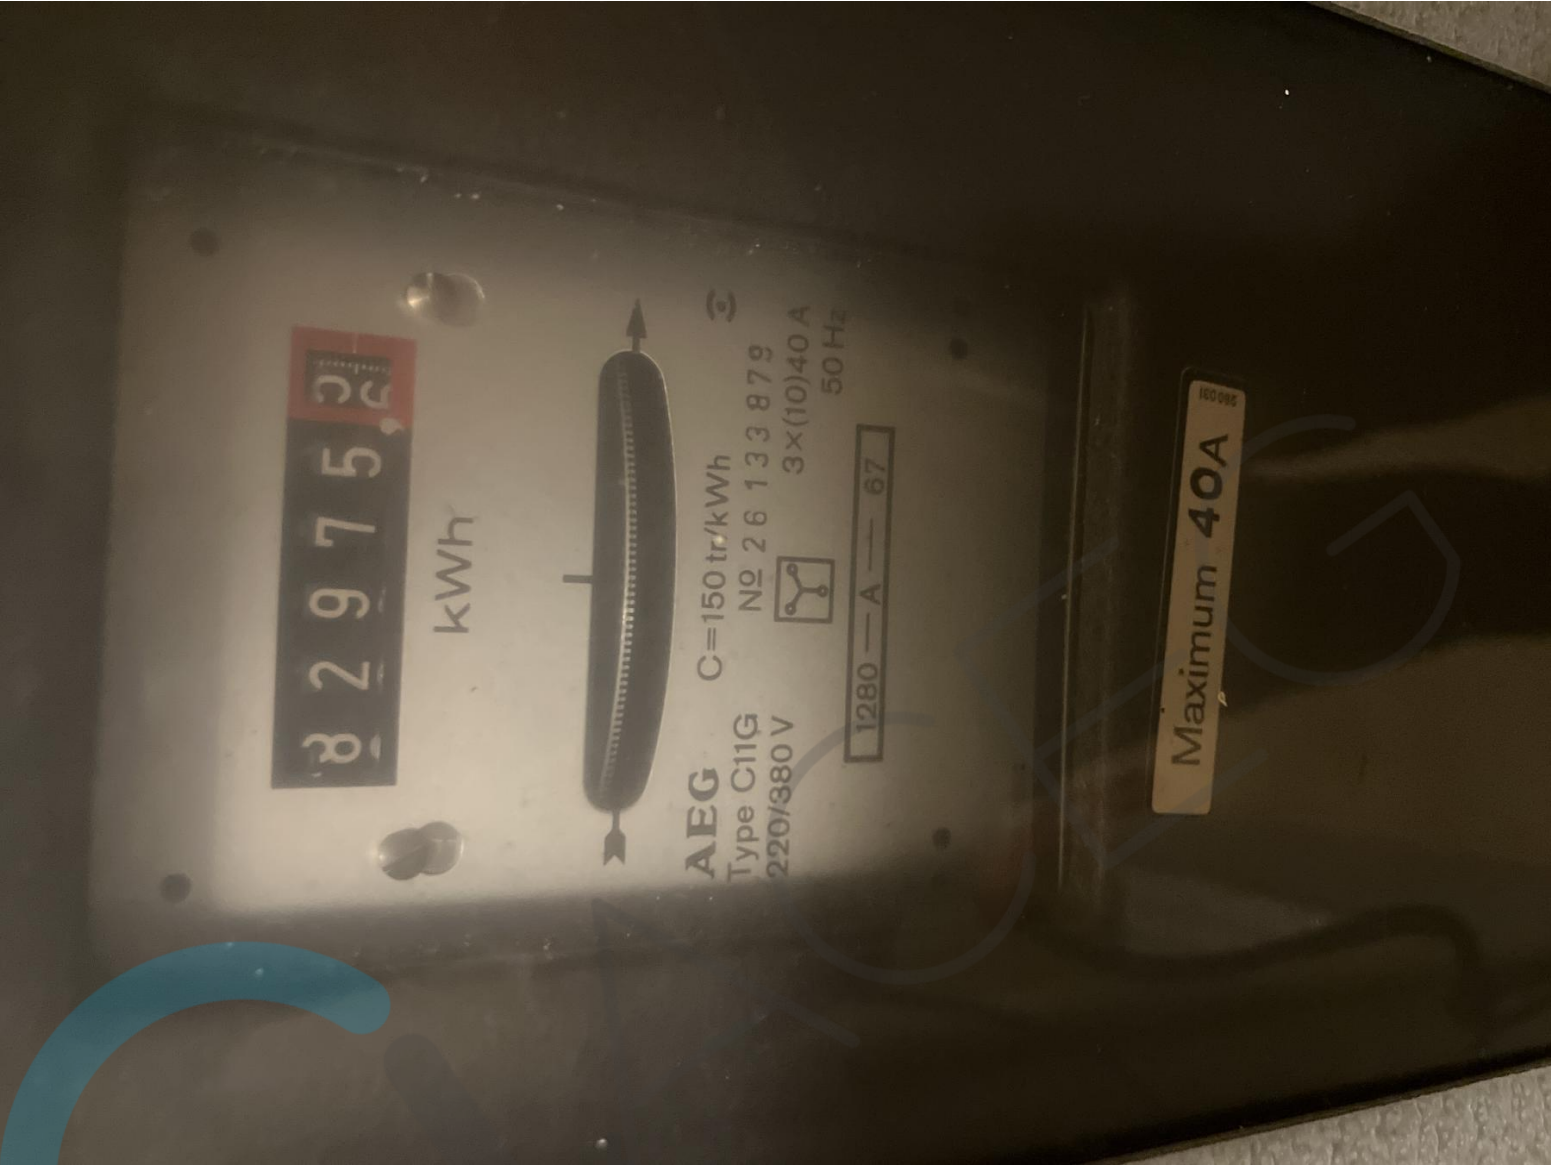





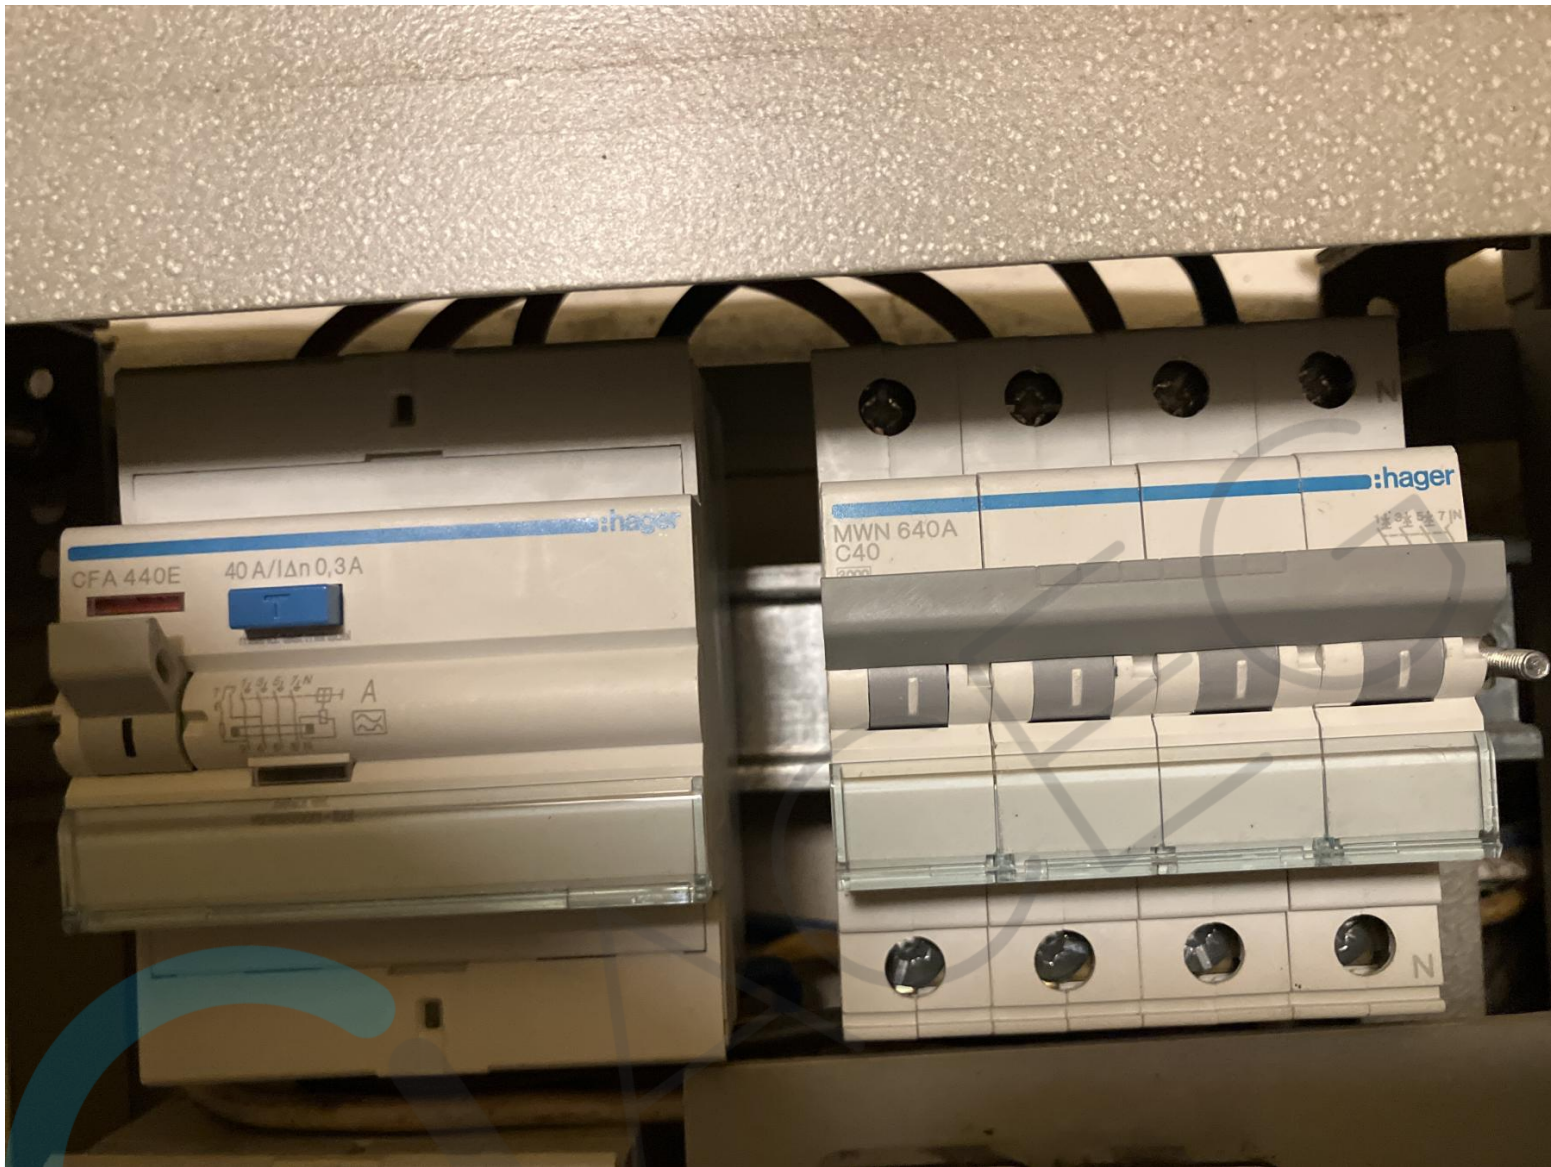


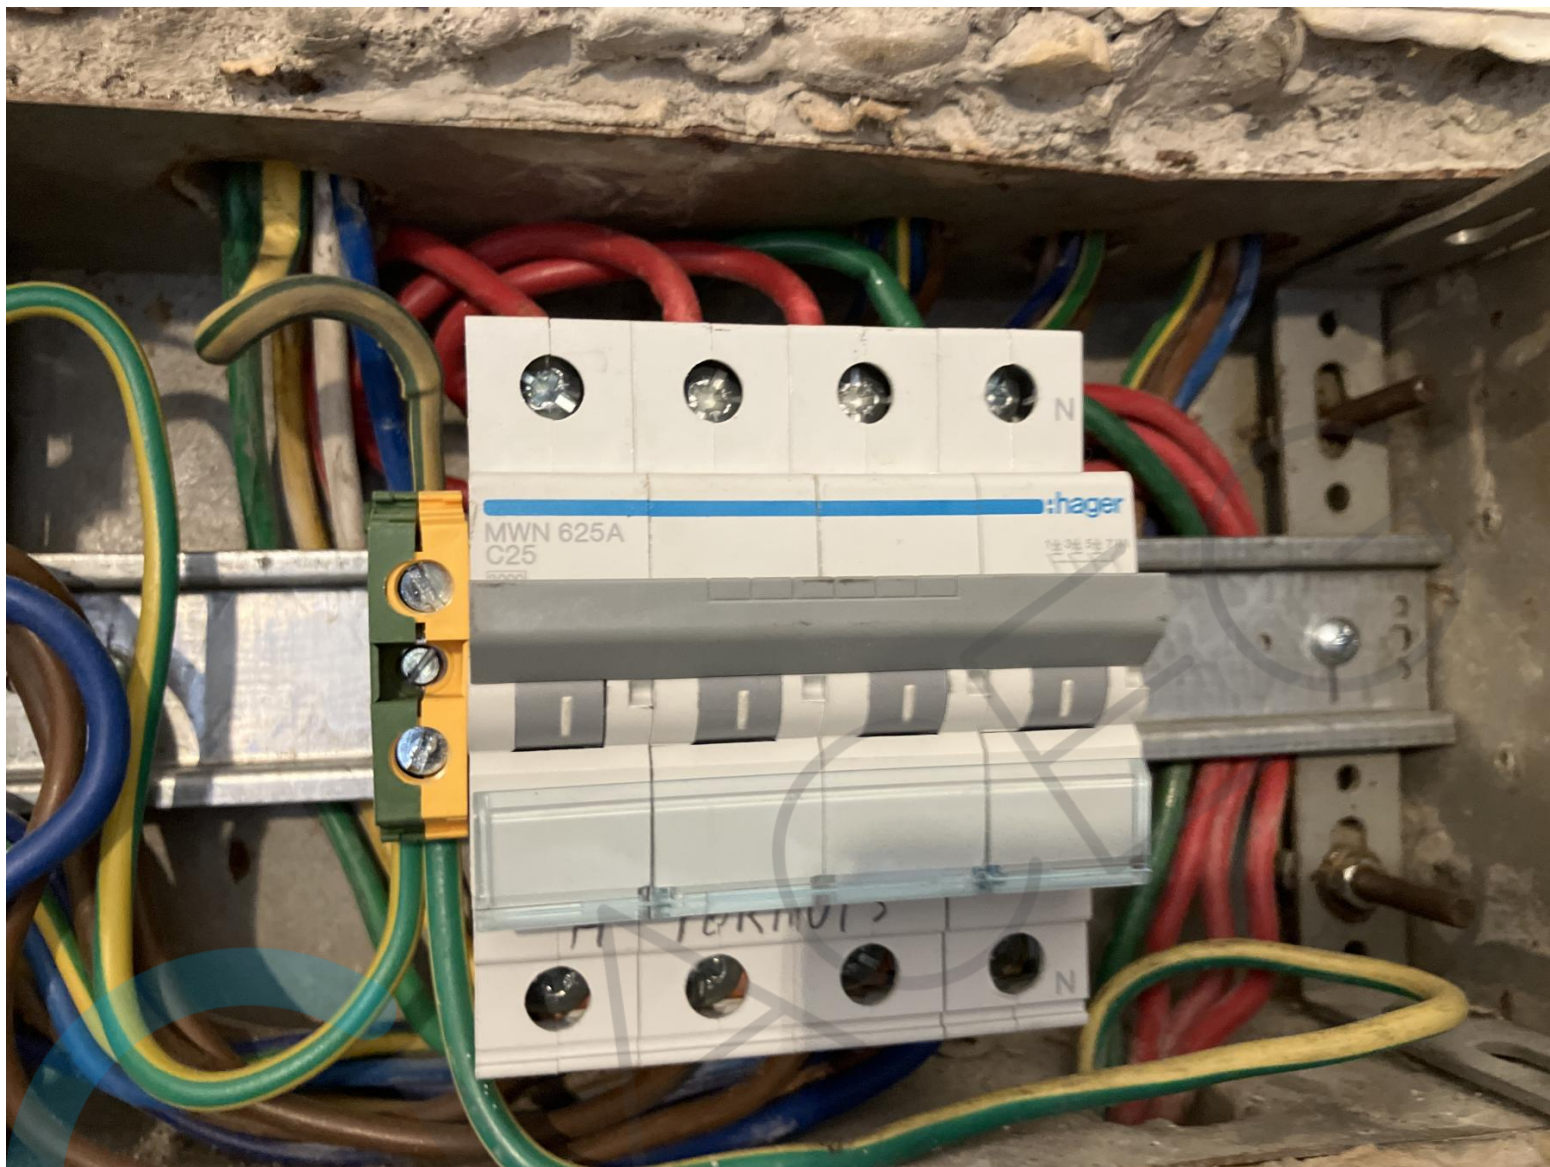



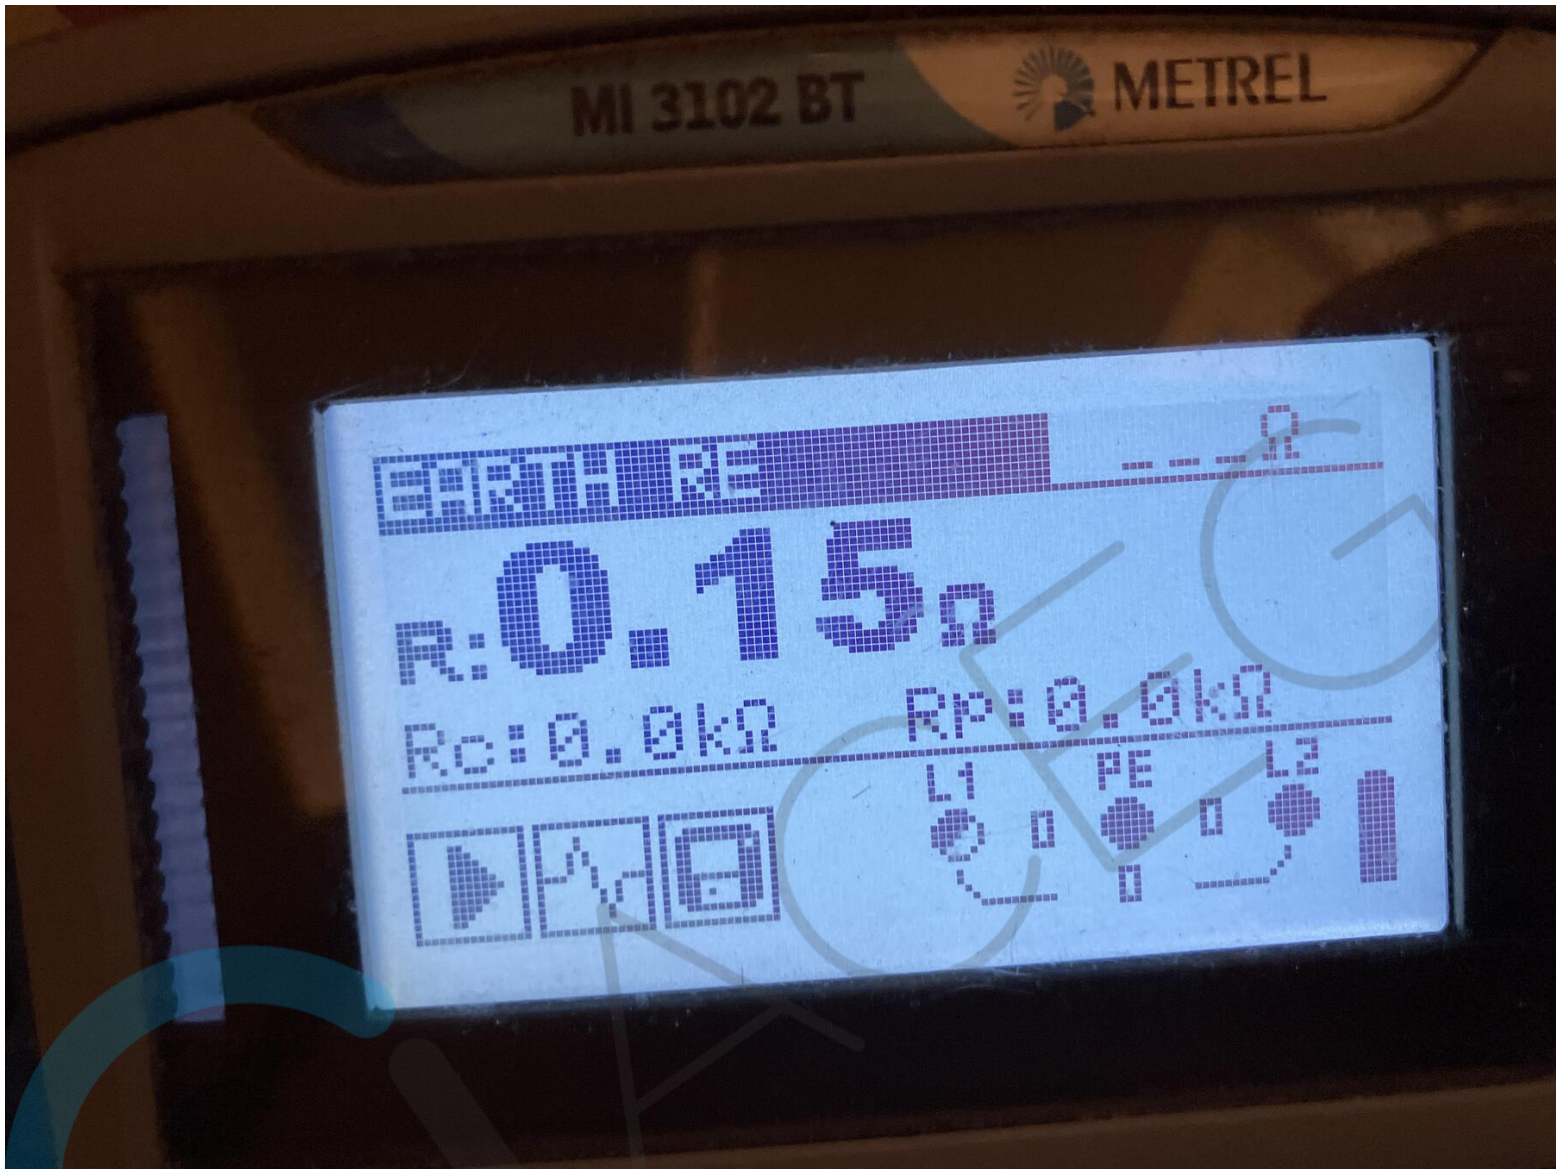

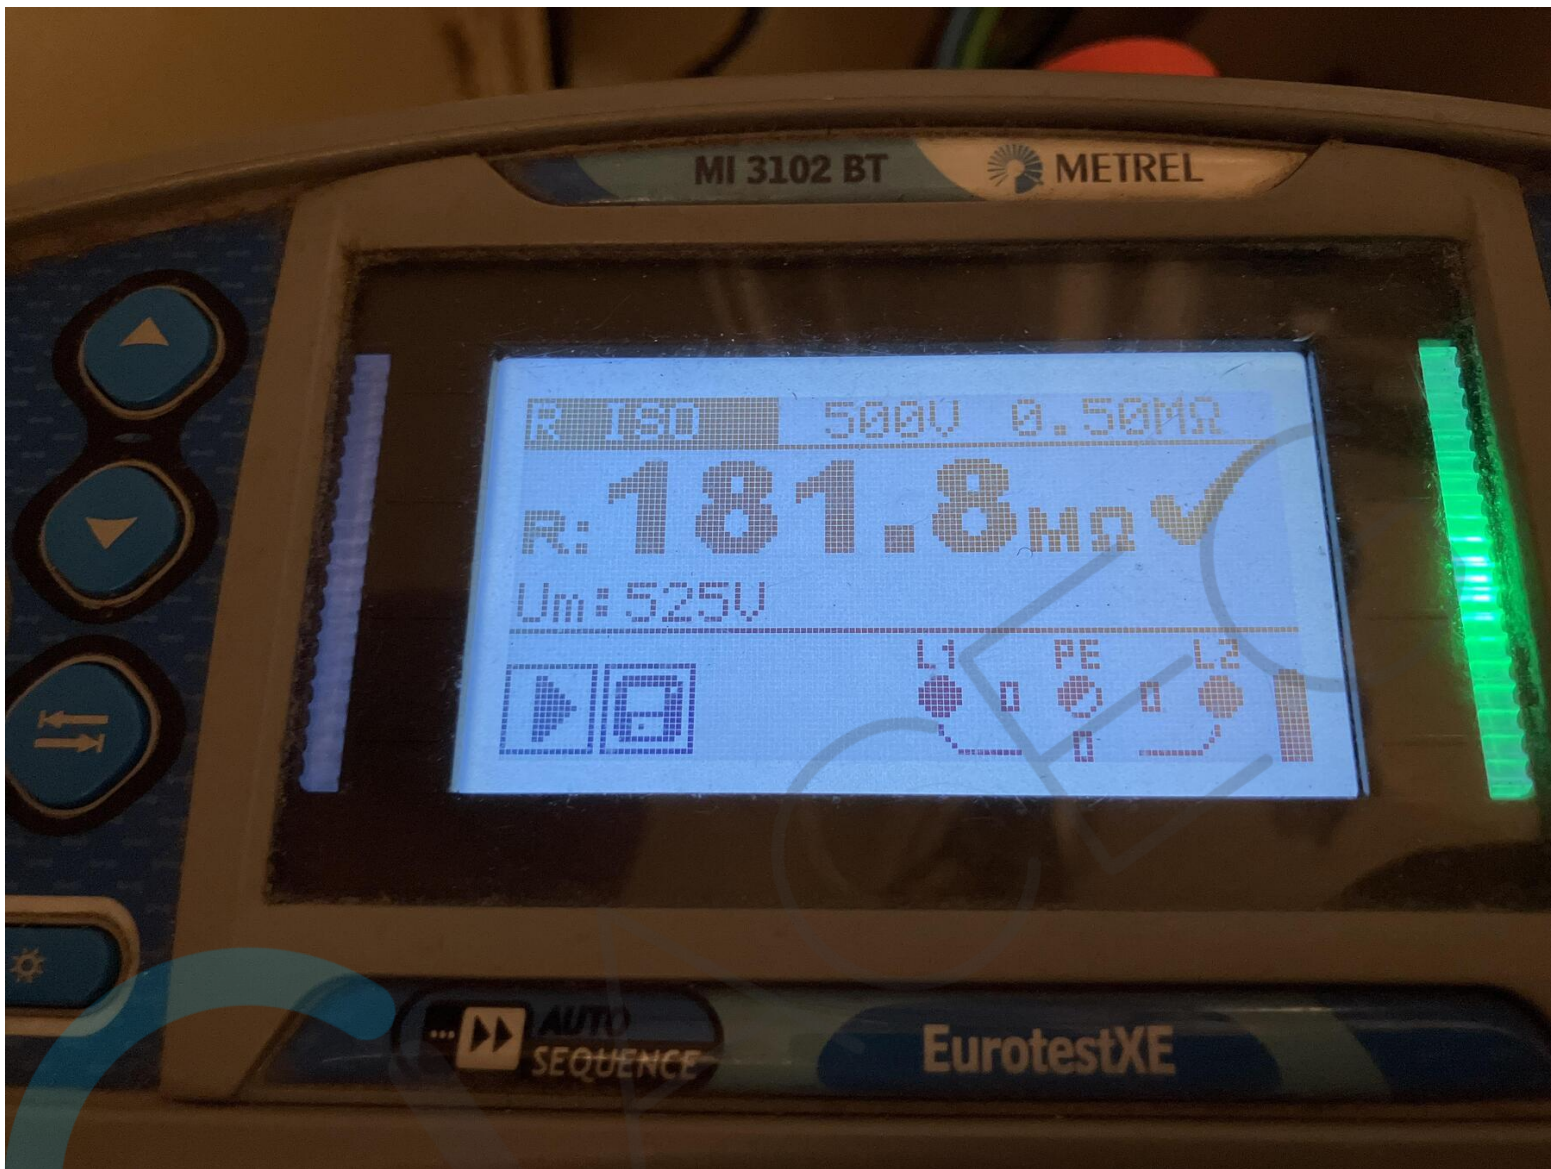

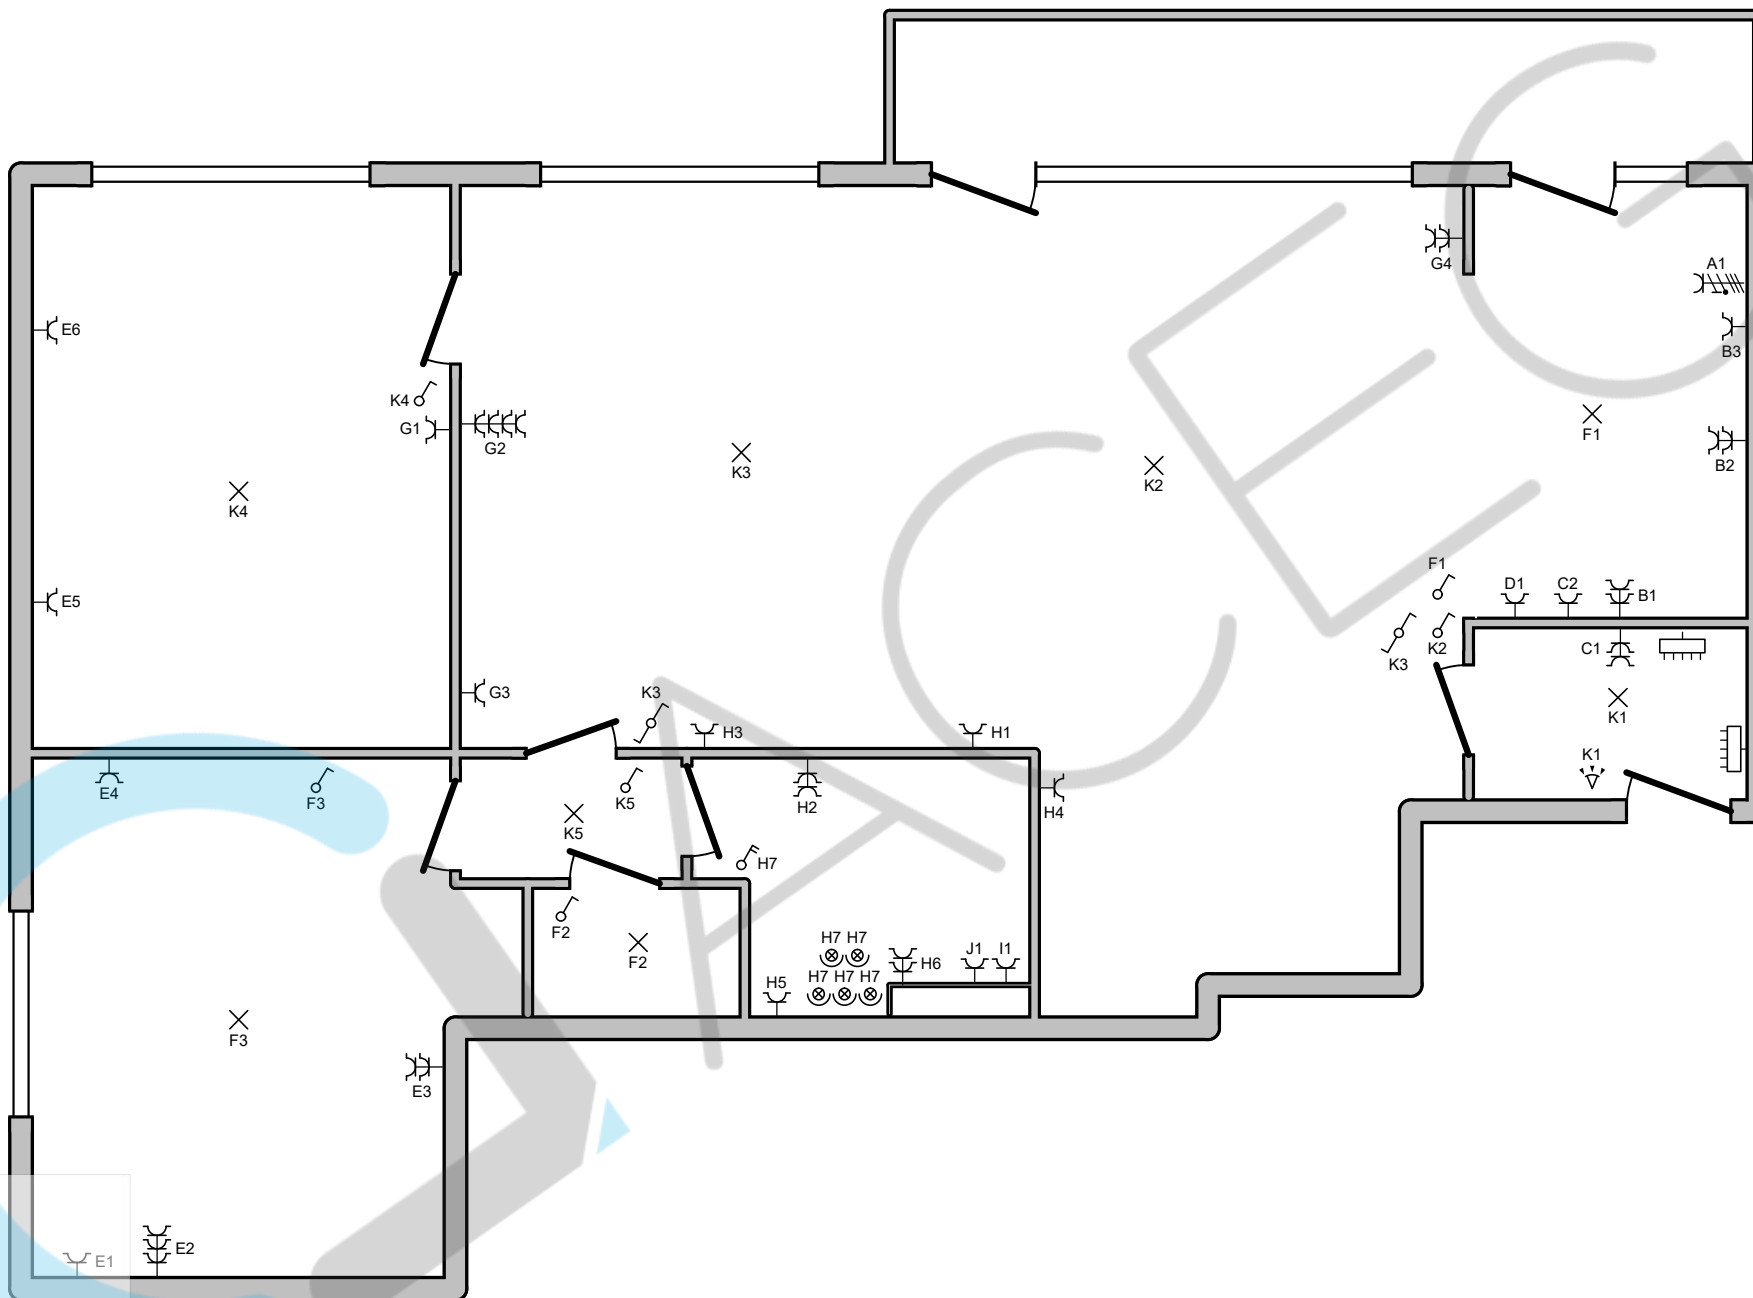

Erkend Organisme
O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be

Selms Akbel
ACEG VZW - 378

28/04/2025

Plaats van de elektrische installatie

Xaver Vermeulen
Elslopark 30
9940 Evergem

Installateur

DaCo Elektro
Liefbilkstraat 25
9032 Wondelgem
GSM: 0496 02 44 23
e-mail: info@daco-elektro.be
BTW BE 0563.472.703

DaCo ELEKTRO

p. 2/3
Situatieplan

3 x 400V + N ~ 50Hz

A Fornuis

B Keuken en
Dampkap

C Ijskast

D Microgolf

E Bureau en
Slaapkamer

F Keuken,
WC en
Bureau

G Slaapkamer,
TV en
Modem

H Woonkamer en
Badkamer

I Wasmachine

J Droogkast

K Inkom,
Woonkamer,
Slaapkamer en
Nachthal

L Reserve

M Reserve

Erkend Organisme


O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be

Selms Akbel
ACEG VZW - 378

28/04/2025

Plaats van de elektrische installatie

Xaver Vermeulen
Elslopark 30
9940 Evergem



Installateur

DaCo Elektro
Liefbilkstraat 25
9032 Wondelgem
GSM: 0496 02 44 23
e-mail: info@daco-elektro.be
BTW BE 0563.472.703



p. 3/3
Lijst Kringen

3 x 400V + N ~ 50Hz
