

Num. rapport: 20200017492-V.1

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RAPPORT DE VISITE DE CONTRÔLE LIBRE D'UNE ANCIENNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT & TBT DOMESTIQUE

GENERALITE

Type d'installation: Ancienne installation
Lieu d'inspection: App 43 / Breughelpark 6, 1731 Asse
Référence: Livre I Chapitre 6.5., Livre 1 Section 8.2.1
Date d'inspection: 04/09/2020
Inspecteur: Mohamed TAKADDOUMI
Propriete de: MEKAMGAN DELICE DIANE
Pers.Cont.:
Documents de référence:

Type de locaux: Appartement
Type d'inspection: Visite de contrôle
Autres Reglements:
Prochain contrôle au plus tard le: 04/09/2045 ou dans un délai de: 300 mois
Installateur: Elam Elect
T.V.A.: BE0730847092
tel.:

DETAILS DU POINT DE FOURNITURE

Nom de l'entreprise distributrice d'électricité: FLUVIUS
Numero EAN: **Compteur:** 5338226 **Marque:**
Raccordement: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)
Tension de serv.: 3x230V **I max. instal.:** 40A
Liaison comptage-coffre de repart. **Type de cable:** VOB

Nature du courant: Alternatif
Index I: 64222,6 **Index II:**
Prot. princ. branchement: /
Nombre de cond.: 3 **Section:** 10 mm²

CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS

Schémas conformes et signés: OUI
Description Installation: ☒ voir les schemas en annexe
Installation executee conformément aux schemas: en ordre ☒ schema unifilaire et schema de position ont ete signes pour approbation
Inventaire des influences externes present et signe: p.a **Etat du matériel électrique (fixation, dégradation...):** en ordre
Protection contre les chocs électriques:
Différentiels essaie par bouton test: en ordre **Contrôle des boucles de défaut:** en ordre **Contact direct:** en ordre **Contact indirect:** en ordre
Electrode de terre: type: piquets **Section:** 16 mm² **Resistance de dispersion:** 1,31 Ohm
Continuite PE et liaison equipotentielle: en ordre **Matériel et influences externes:** p.a
Inter.Diff.General: 4p 40A/300mA **Scellé par plombage:** en ordre **Diff. supplém.:** 2p 40A/30mA
Pas encore places: cuisine,
Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux:** 5
Adéquation entre les dispositifs de protection et la section des conducteurs: En ordre
Adéquation entre le différentiel et la valeur de la resistance de dispersion de terre: En ordre

CONCLUSION



L'INSTALLATION EST CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par le Livre 1 (voir ci-dessus).

Pour le Directeur Technique,
L'inspecteur,



CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction au Livre 1 (I) - Dérogation (D) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

- N11** - Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection..
N12 - Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.
N13 - Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

Num. rapport: **20200017492-V.1**


L'inspecteur certifie avoir suivi toutes les étapes de la check-list: OUI

EXEMPLAIRE ORIGINAL

CONSEILS

Suivant la sous-section 6.5.7.2.b.7. du Livre 1, il est obligatoire de rappeler :

- a) l'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ;
- b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- c) l'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques;
- d) L'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

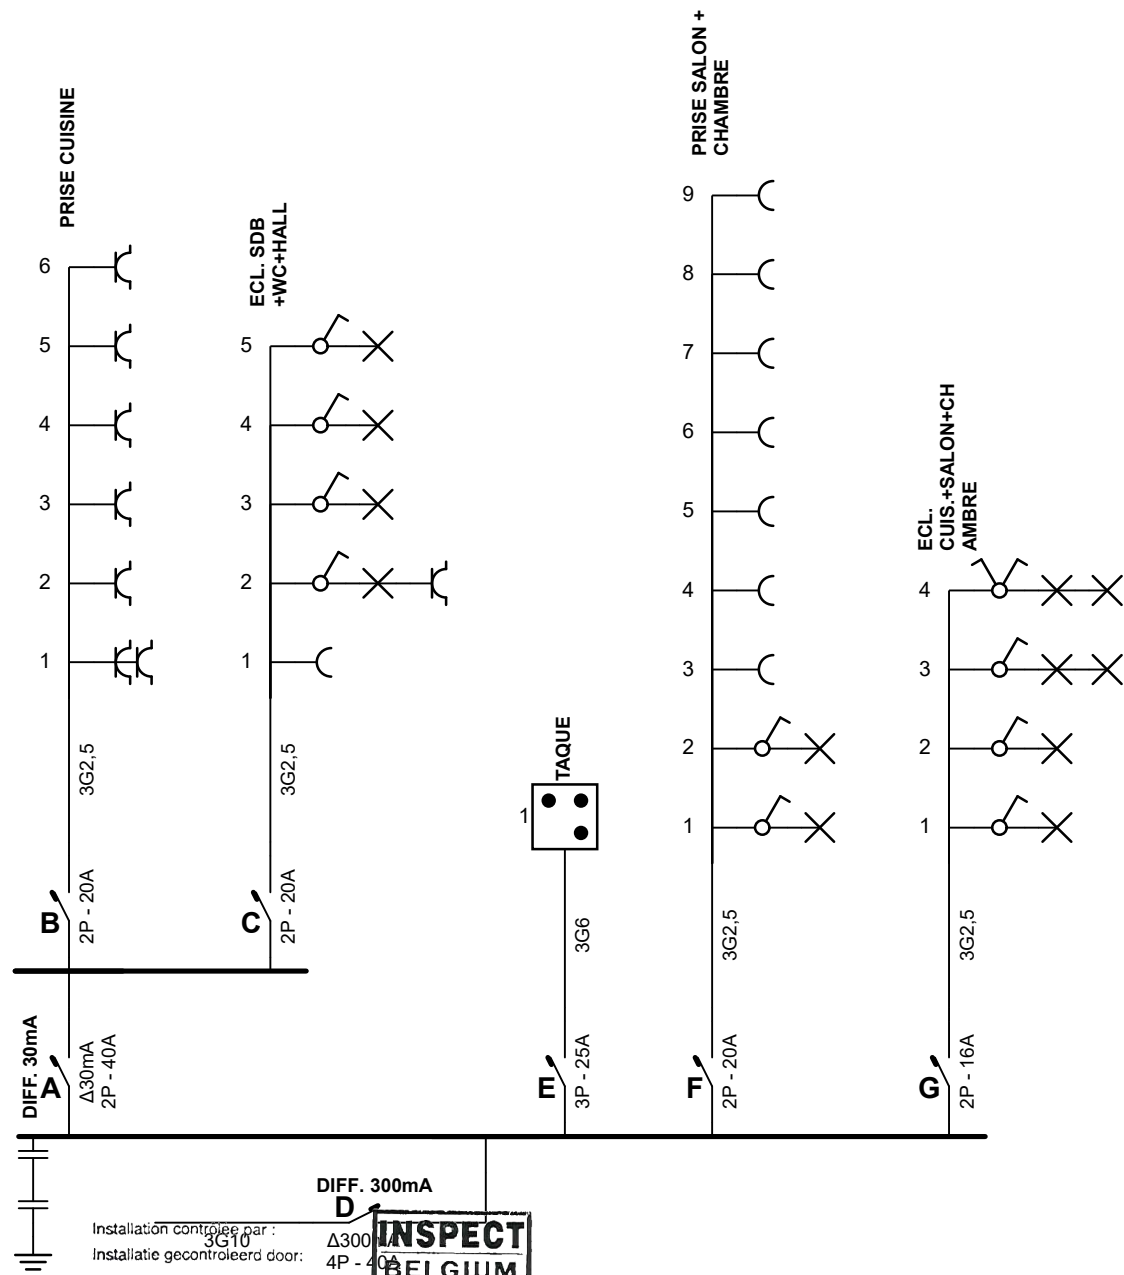


Installation controlee par : **INSPECT BELGIUM**
Installatie gecontroleerd door : **INSPECT BELGIUM**

Organisme agréé INSPECT BELGIUM Date / Datum : PV n° : Signature / Handtekening : Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Adresse de l'installation électrique MEKAMGAN DELICE DIANE BREUGHELPARK 6 (ETAGE 11) Boîte 43 1731 ZELLIK Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Installateur ELAM ELEC Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	p. 1/3 Schéma unifilaire 3 x 230V ~ 50Hz
Schéma dessiné par:			



11 IEM ETAGE BT43

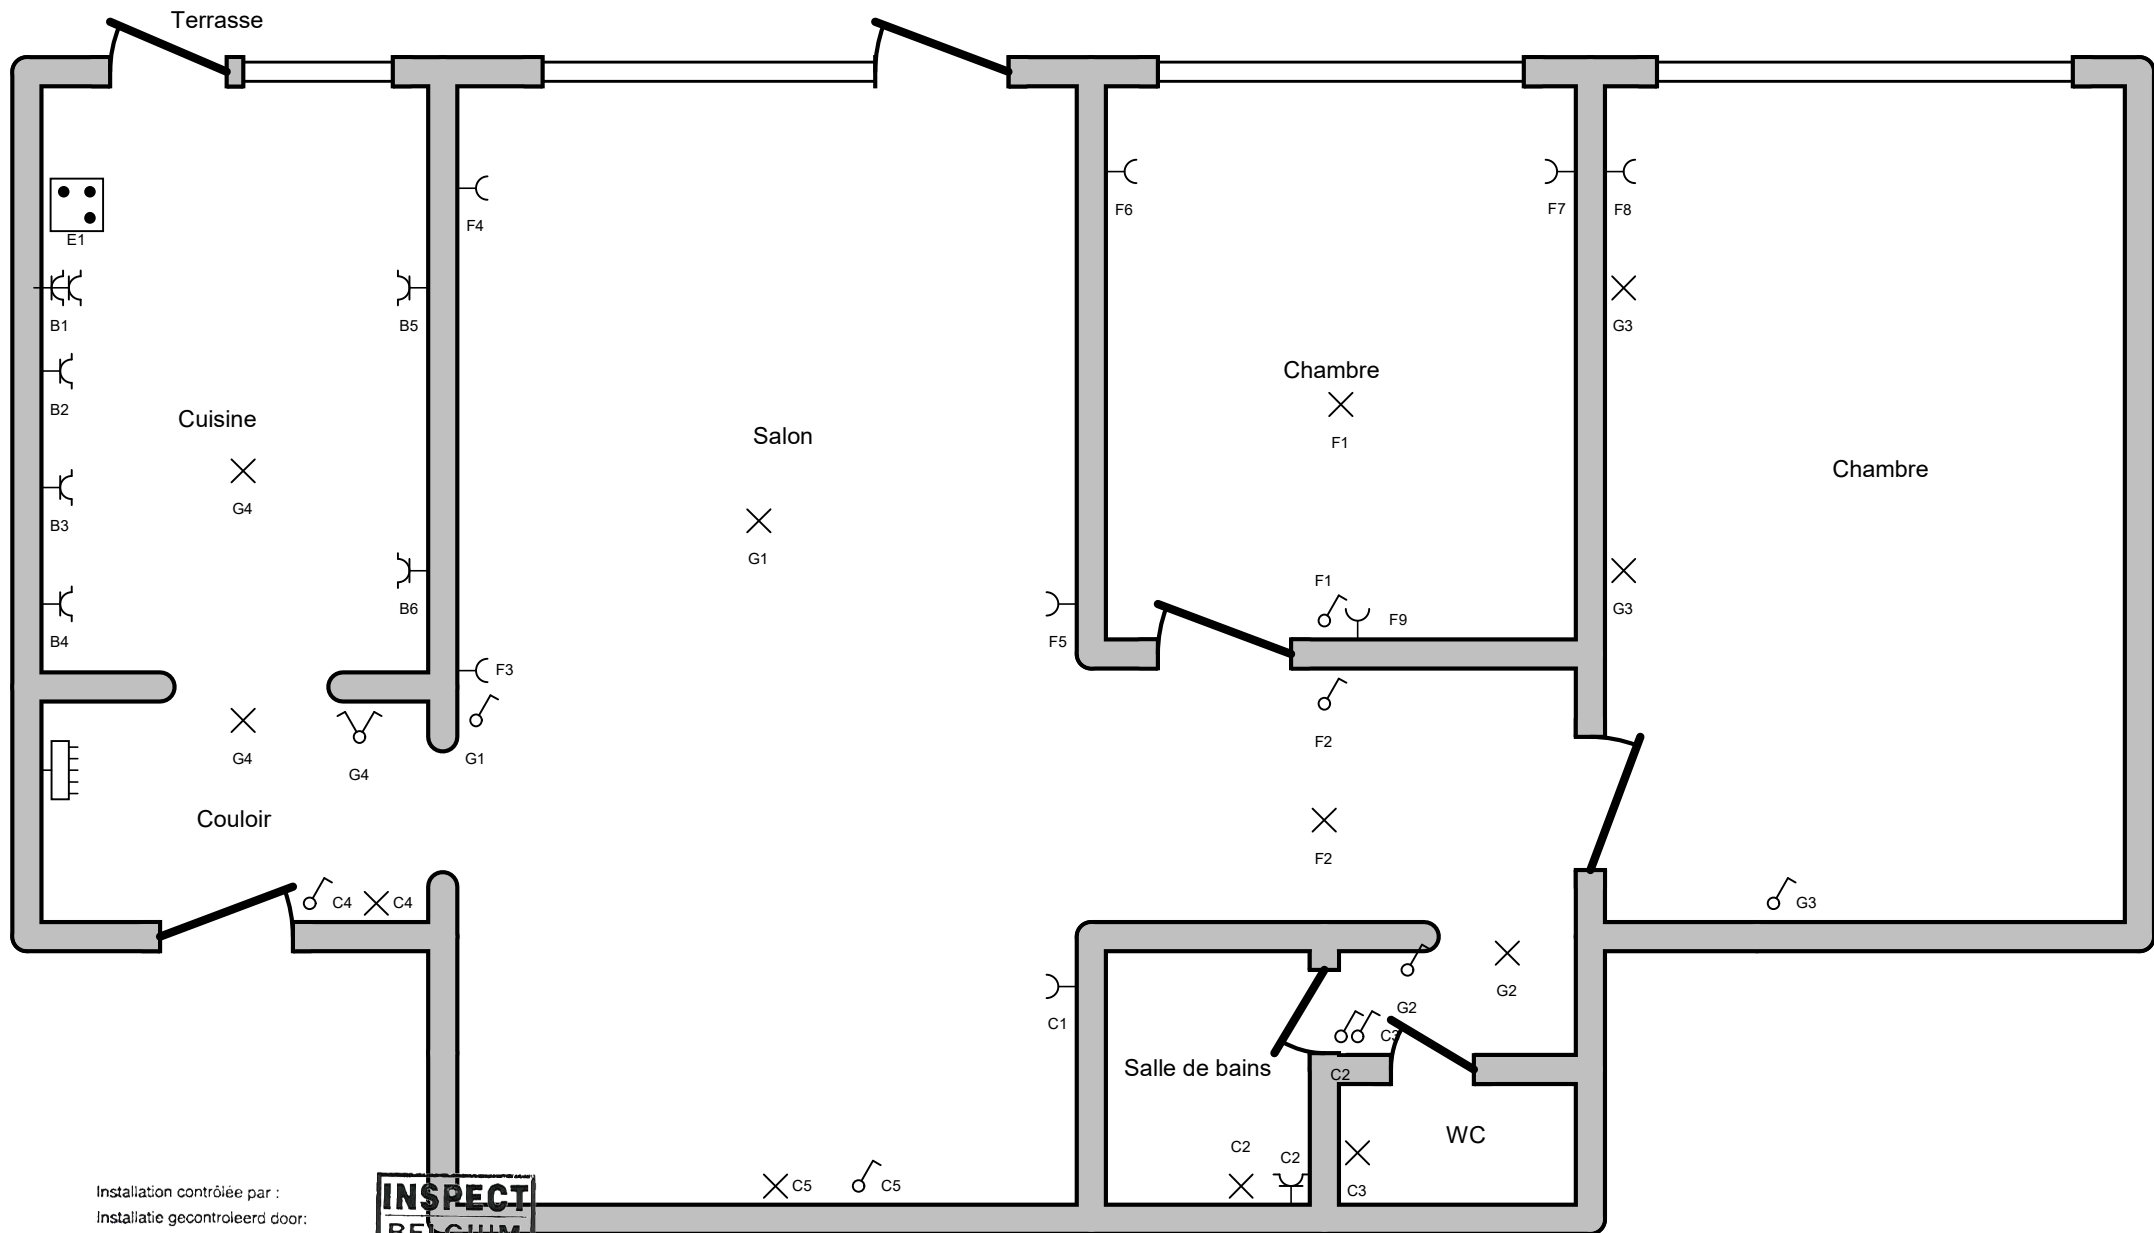

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:



Organisme agréé - 8 - 1300 Wavre - 010/280 577

INSPECTIE ONTOEGANG MI M

Date / Datum :

PV n° :

Signature / Handtekening :

Tél.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: -

Adresse de l'installation électrique

MEKAMGAN DELICE DIANE

BREUGHELPARK 6 (ETAGE 11) Boîte 43

1731 ZELLIK

Tél.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: -

Installateur

ELAM ELEC

Tél.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: -



p. 2/3

Schéma de position

3 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

- A: DIFF. 30mA
- B: PRISE CUISINE
- C: ECL. SDB +WC+HALL
- D: DIFF. 300mA
- E: TAQUE
- F: PRISE SALON + CHAMBRE
- G: ECL. CUIS.+SALON+CHAMBRE

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:



Organisme agréé
Avenue Eiffel 8 - 1300 Wavre - 010/280 577
INSPECT BELGIUM
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Adresse de l'installation électrique
MEKAMGAN DELICE DIANE
BREUGHELPARK 6 (ETAGE 11) Boîte 43
1731 ZELLIK
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
ELAM ELEC

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -



p. 3/3
Liste des circuits
3 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par:
