

☒ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. **A3**

2 de VERDIJF

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: P007220431
Naam, Voornaam: WALEN	Lid nr: Ontvangstbewijs nr:
BTW nr:	Installatie: Naam: WALEN
of identiteitskaartnr:	Adres: C. DYCK STRAATLAAN, 13
Stroomleverancier: ELECTRA 302	2100 DEURDRE
.....	Datum onderzoek: 21/02/2008
.....	Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Meter nr: stand:	Naam, Voornaam: WALEN
Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input checked="" type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	Adres: C. DYCK STRAATLAAN, 13, 2100
.....	Aanvrager: IDEM

Type van bezoek: ☐ 270 ☐ 271 ☒ 276 AREI Aard installatie: ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☒ Bestaande ☐ Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: ☐ AREI. art. ☐ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☒ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van **230** V, AC, Bescherming aansluiting: **40** A Type: **DBI**
 Omschrijving aansluiting: **ONDERGROEFS** Kabeltype: **BESTAND** Doorsnede: x mm²
 Voeding hoofdbord: **2** x **6** mm² Aantal borden: **2** Aantal eindstroombanen: **4**
 Type aardelektrode: **PEN** Spreidingsweerstand: **18,4** Ohms Algemeen isolatieniveau: **10** M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

ZIE SCHEM A		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

GEEN

Electrisch
4/3/03

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór **21/02/2008** evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

GEEN

De installatie moet vóór **21/02/2008** opnieuw gekeurd worden.


Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: **2**
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening

BOER TOEGEVOEGD

[Handtekening]

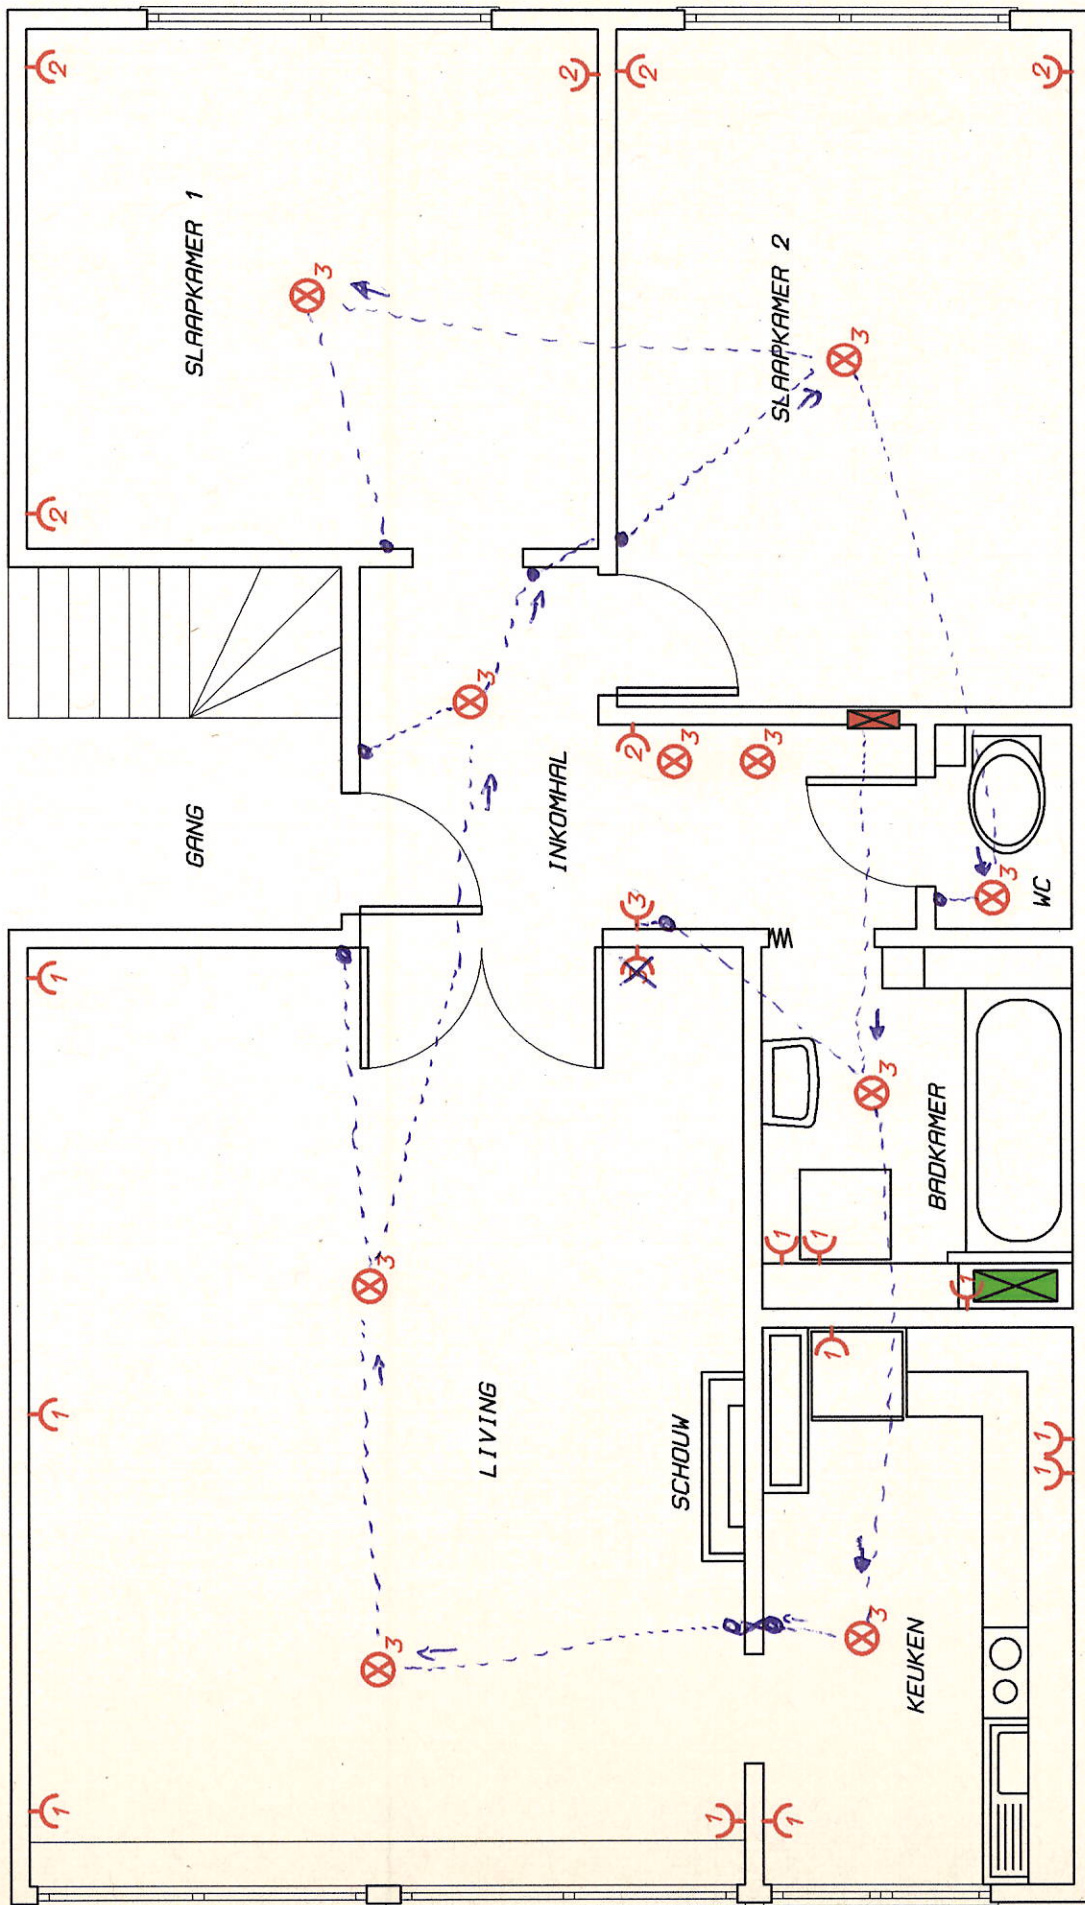


KRING 1: STOPCONTACTEN LIVING, KEUKEN EN BADKAMER
 KRING 2: STOPCONTACTEN SLAAPKAMER 1 EN 2 EN 1 STOPCONTACT IN DE INKOMHAL
 KRING 3: ALLE VERLICHTING, 1 STOPCONTACT IN DE INKOMHAL EN 1 STOPCONTACT IN DE LIVING

AIB-VINÇOTTE BELGIUM

JOZEF BOEL
 0722



21/02/2003

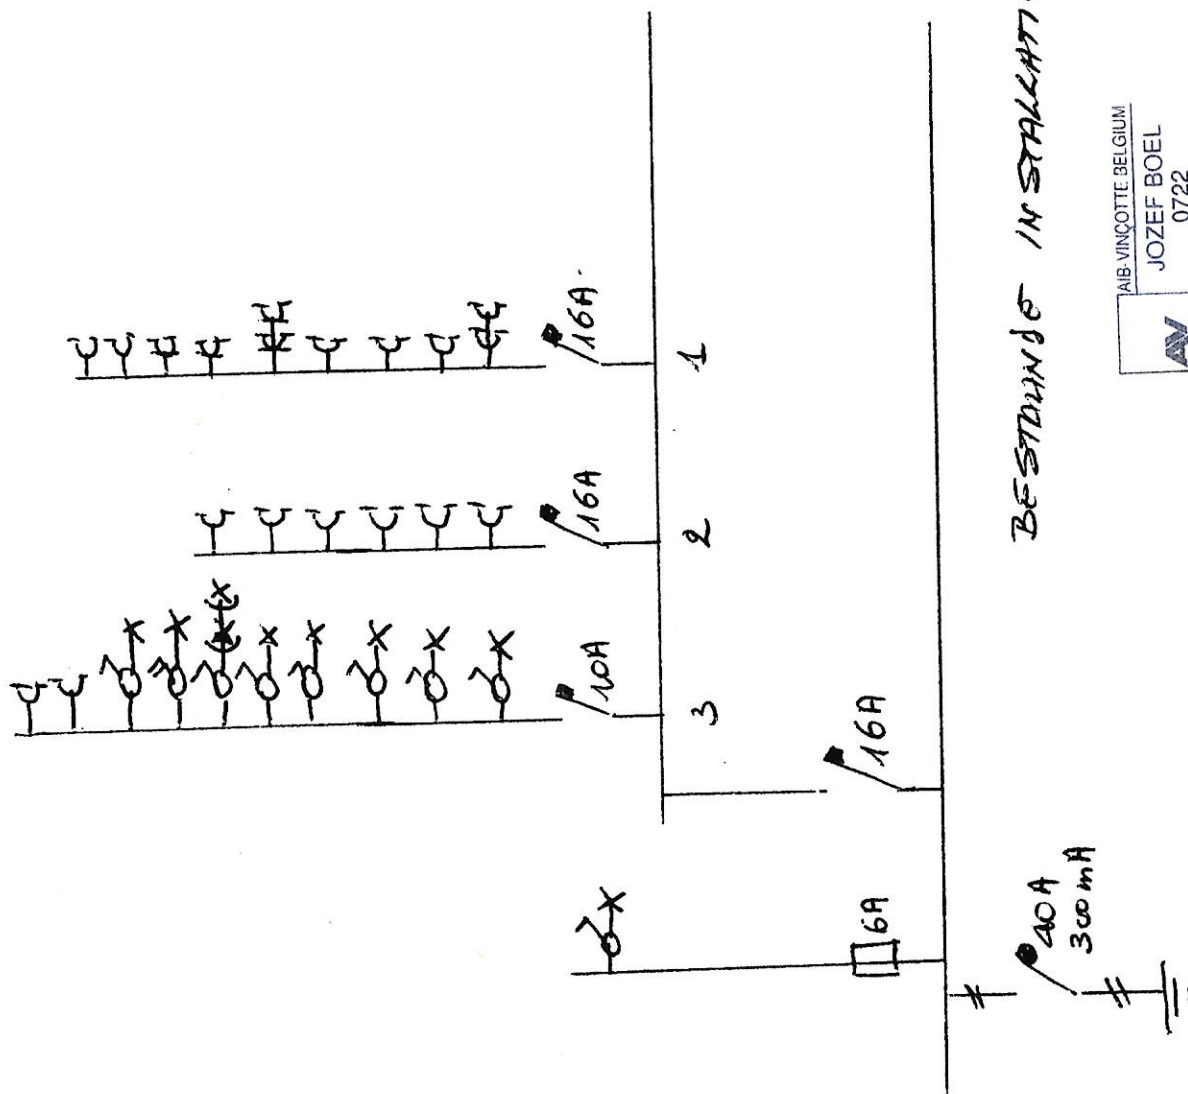

BESTUURDE INSTALLATIE



[Handwritten signature]

21/02/2003
