

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 24/01/2025

Inspecteur: Tom Anthonis

Mentor: -

Installateur: Foorkes R.E.A.L. Fix

ID-label: GLV r

B.T.W. nr.: BE 0726 669 362

Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 21251308

Datum verslag: 24/01/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Scheidingstraat
Huisnummer: 10
Busnummer: GLV r
Postcode: 2610
Gemeente: Wilrijk
Land: België

Eigenaar

Naam: D&C Projects
Straatnaam: Scheidingstraat
Huisnummer: 10
Busnummer: GLV r
Postcode: 2610
Gemeente: Wilrijk
Land: België

Installateur

Naam: Foorkes R.E.A.L. Fix
BTW nr.: BE 0726 669 362
Telefoonnummer: +32 478 73 33 70
E-mail: Foorkesrealfix@hotmail.com

Type : appartement

EAN : 541448820049761311

Teller Nr.: : 1SAG1100727934

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische installatie van voor 1981 volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- hoofdstuk 8.4.3. en 4.2.4.3. en 8.2.1

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 12

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 10.03 MΩ

RE: 25.5 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	11	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
- nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.
- nota/note 28 Volgens AREI boek 1 8.2.1. is het toegelaten stopcontacten zonder aarding in dienst te laten. Op deze stopcontacten mag men enkel toestellen van de klasse II aansluiten.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 24/1/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 10:31 tot 11:30

De inspecteur Tom Anthonis

Tom Anthonis

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte​sreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 24/1/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



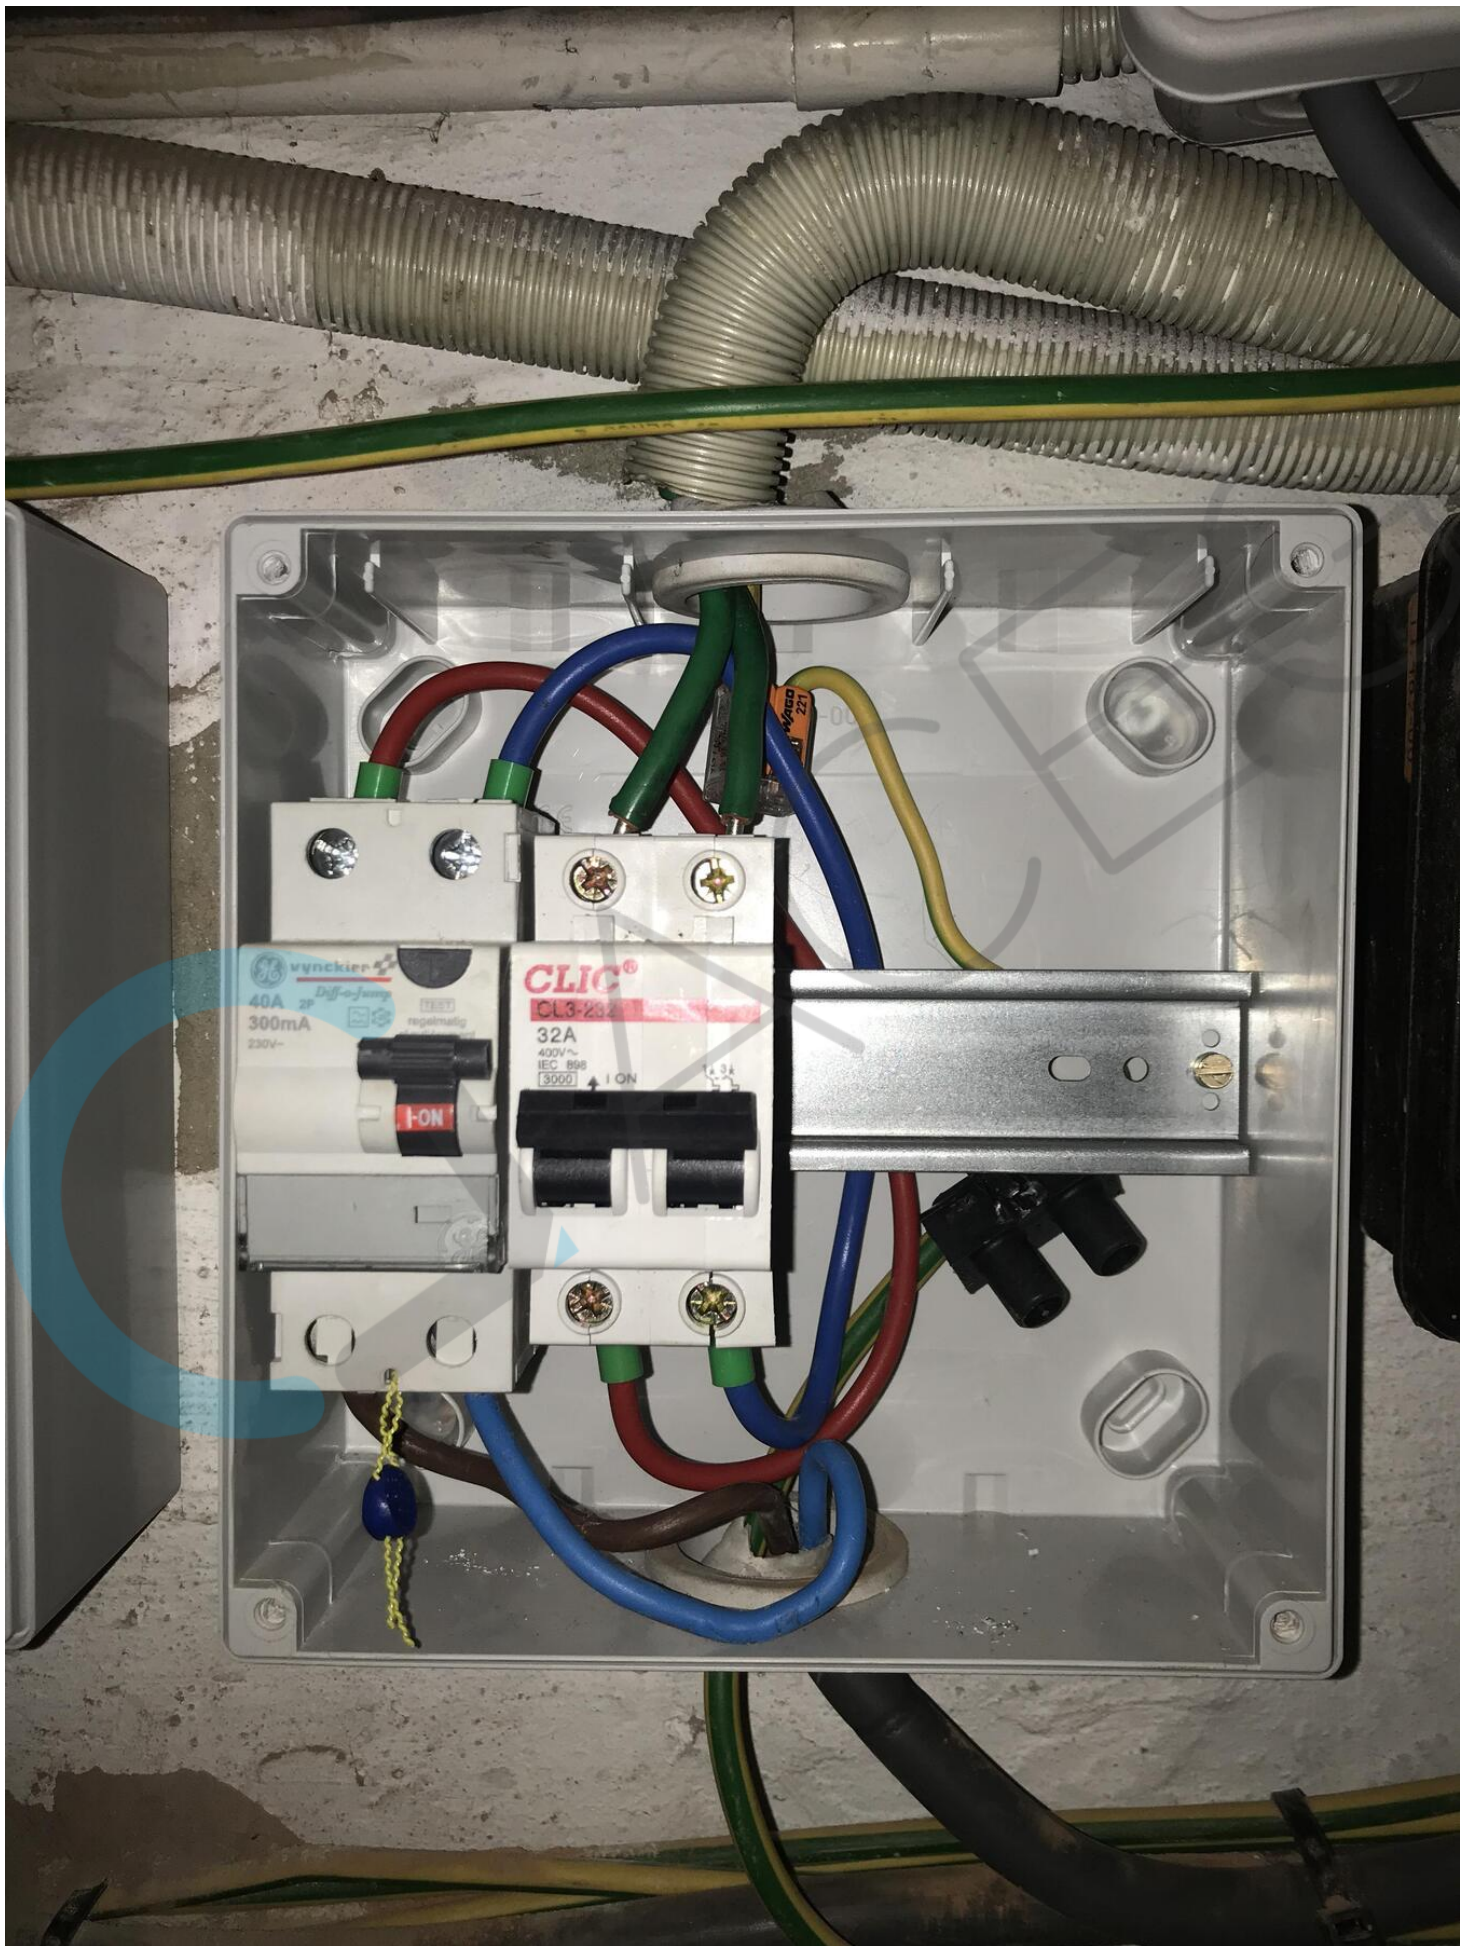

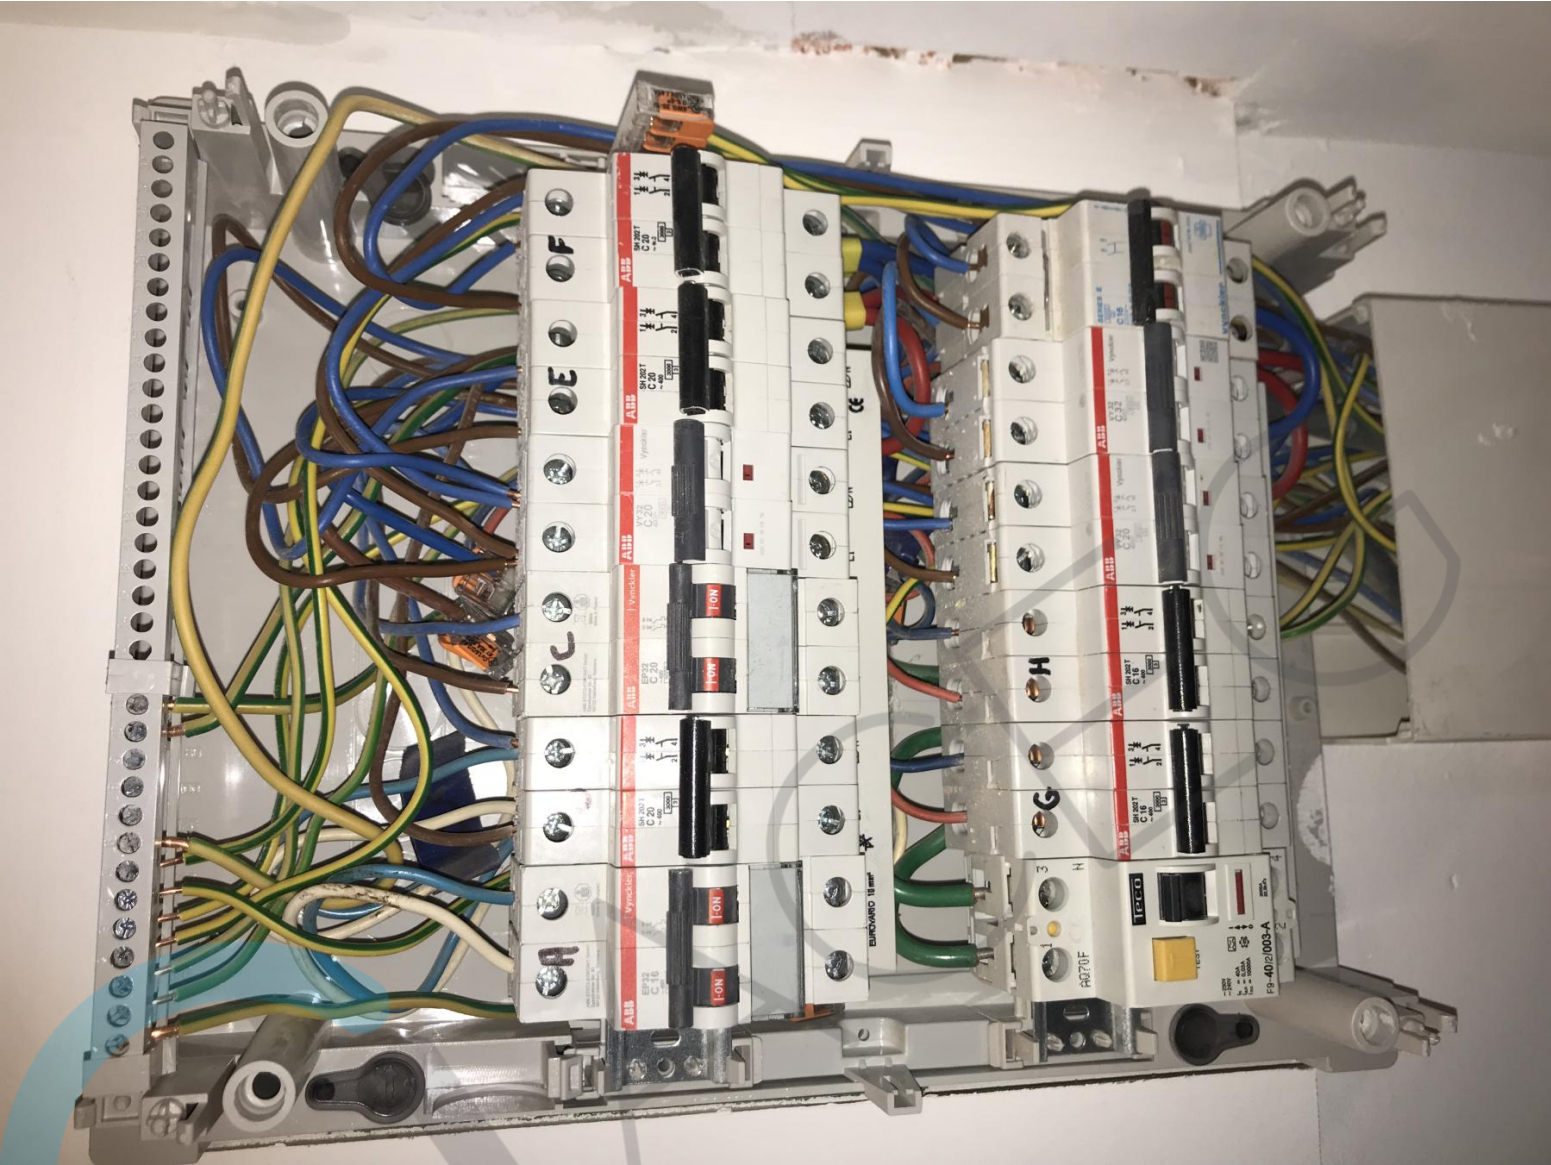














Kelder

Tuinzijde

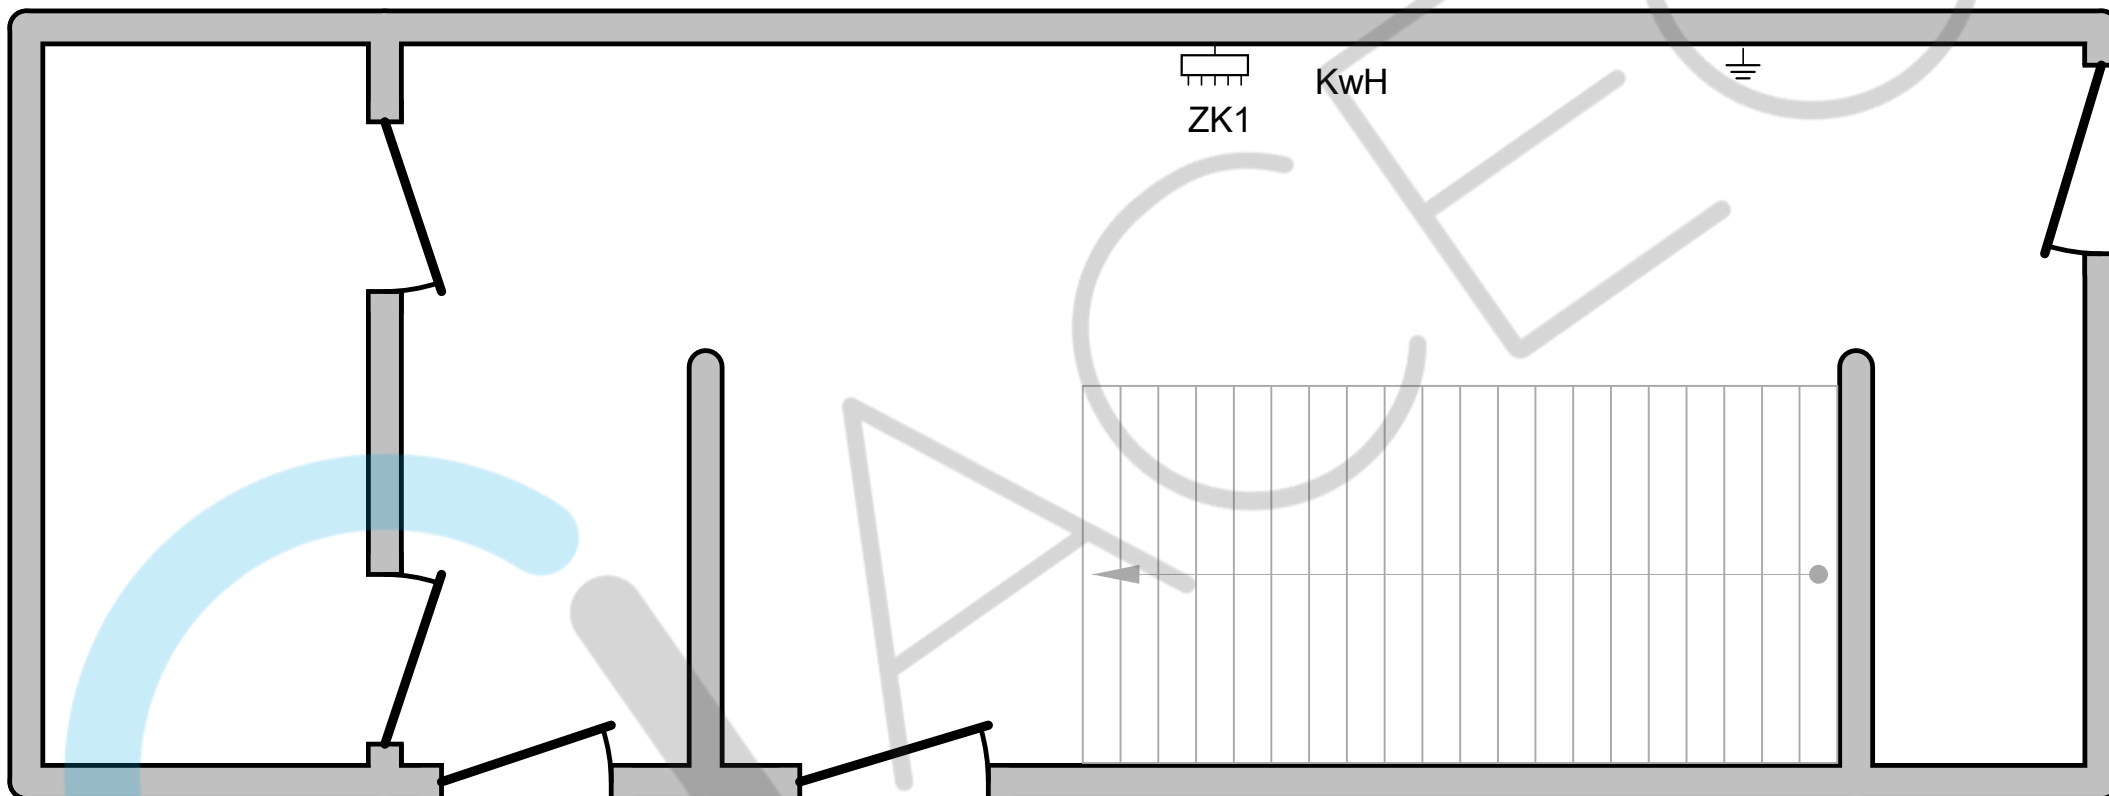

Straatzijde

Erkend Organisme

-

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Plaats van de elektrische installatie

D&C Projects
Scheidingstraat 10 Bus GLV R
2610 Wilrijk
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE0718.878.480

Installateur

Foorkes R.E.A.L Fix

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: Foorkesrealfix@hotmail.com
BE0726.669.362

p. 2/4


Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

24/01/2025

Erkend door: Foorkes R.E.A.L Fix

Appartement GLV R

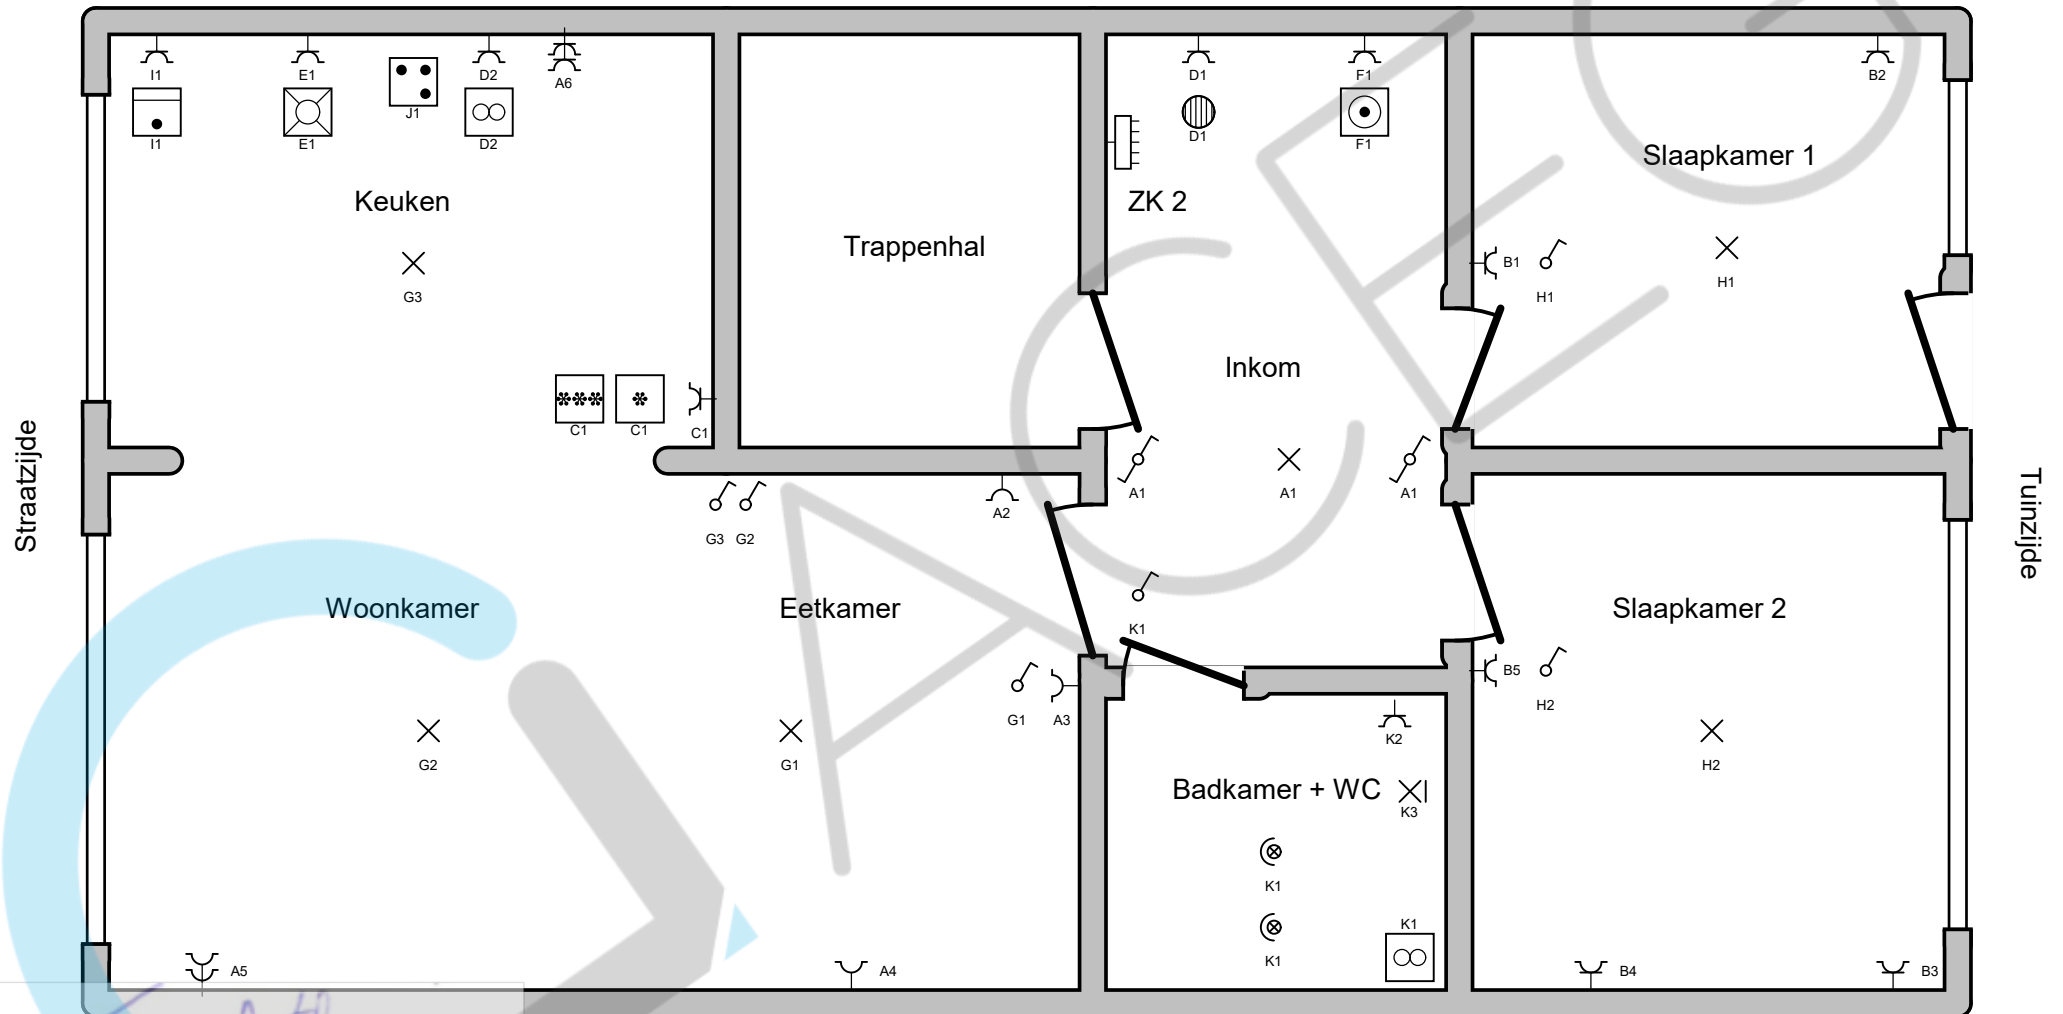

Erkend Organisme

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Plaats van de elektrische installatie

D&C Projects
Scheidingstraat 10 Bus GLV R
2610 Wilrijk
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE0718.878.480

Installateur

Foorkes R.E.A.L Fix

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: Foorkesrealfix@hotmail.com
BE0726.669.362

p. 3/4
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

24/01/2025
Erkend door: Foorkes R.E.A.L Fix

A':

A: Verlichting inkom, stopcontacten woonkamer, eetkamer en keuken

B: Stopcontacten slaapkamer 1 en 2

C: Koelkast en diepvriezer

D: Boiler en dampkap

E: Vaatwasmachine

F: Wasmachine

G: Verlichting woonkamer, eetkamer en keuken

H: Verlichting slaapkamer 1 en 2

I: Oven

J: Kookvuur

K: Verlichting en stopcontact badkamer

Erkend Organisme

-

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Plaats van de elektrische installatie

D&C Projects
Scheidingstraat 10 Bus GLV R
2610 Wilrijk
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE0718.878.480

Installateur

Foorkes R.E.A.L Fix

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: Foorkesrealfix@hotmail.com
BE0726.669.362

p. 4/4

Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz

24/01/2025
Erkend door: Foorkes R.E.A.L Fix
