


Rapportnummer: RAP.1154.004.8401531.REV0

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie: Wondelgemstationstraat 10 te 9032 Wondelgem
Naam eigenaar: Brewaays - De Nul
Adres eigenaar:
Type object: eengezinswoning
EAN-code: niet beschikbaar
Aard installatie: bestaand
Doel onderzoek: periodiek

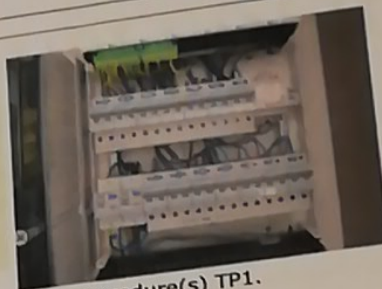

Het onderzoek is verricht op 19/05/2014 volgens artikel art 270 van het AREI en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V): 2 x 230 (2f)
elektrode: pen
bedingsleiding (mm²): 10
in hoofdbeveiliging (A): 40

In hoofdschakelaar (A): 40
 ΔI differentiële schakelaar(s) (mA): 300 en 30
Aantal verdeelborden: 1
Aantal stroombanen per verdeelbord: 14

Metingen

Ra / Zs (Ω): 15,7 /
Continuïteitsmeting: goed

Werkingsdifferentiële schakelaar(s): goed
Isolatiweerstand van de installatie (M Ω): >0,5

Inbreuken

1. nihil
ADS: Automatische differentiële schakelaar
Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na okt 1981
Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

Besluit

De installatie is conform het AREI.
De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 19/5/2039, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 19/5/2014

Handtekening:


Naam agentonderzoeker: Davy Defour

Opmerking


Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.

Bij elk ongeval aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
Wanneer er overtreedingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtreedingen zijn verdwenen. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtreedingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.





DROOG-KAST






C.V.







SLPKO ~~de Vind.~~




KEUKEN



KEUKENI




BADKAMER




KEURTECH VZW
DAVY DEFOUR
INFO@KEURTECH.BE
0470/507992

3G2,5°




A

3G2,5°




B

3G2,5°




C

3G2,5°




D.

3G2,5°



E

3G2,5°



F

U 230V



40A/300mA



40A/300mA



Houtings

WONDELGEMSTATIONPLEIN 10 9032 WONDELGEM

De installateur

Voor de erkende
controle-instelling

De eigenaars

SAMCELEC
D. John Kris
Hundelgemsebaan 91
9630 Hundelgem (Zwalm)
0496 51 44 30
BE 0824.815.051
www.samcelec.be

Dhr. & Mevr. Brewaeys - De Nul
Sint-Christianastraat 32
9200 Dendermonde

Datum + handtekening


19/05/2014
De Nul

Datum + handtekening

19/5/14
KEURTECH VZW
DAVY DEFOUR
INFO@KEURTECH.BE
0470/507992

Datum + handtekening

Gelykvloers

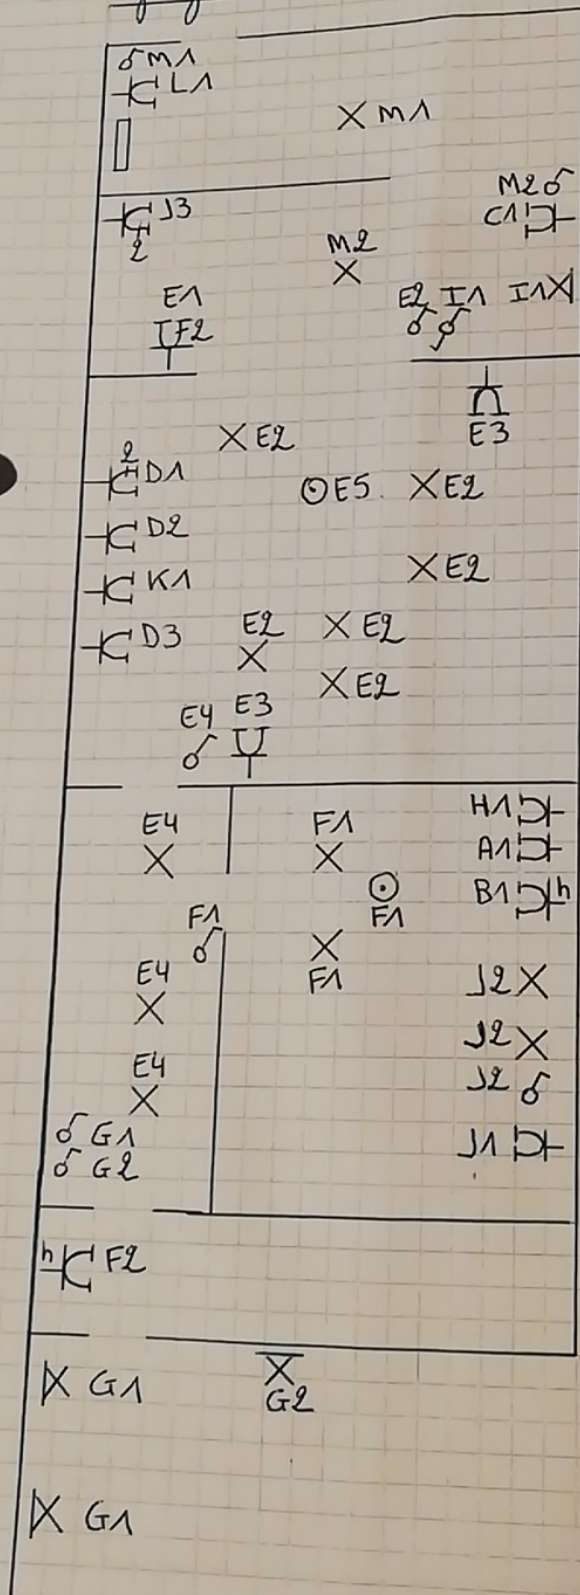


KEURTECH VZW
DAVY DEFOUR
INFO@KEURTECH.BE
0470/507992


Hoofdenzaal

4


Eerste verdieping.

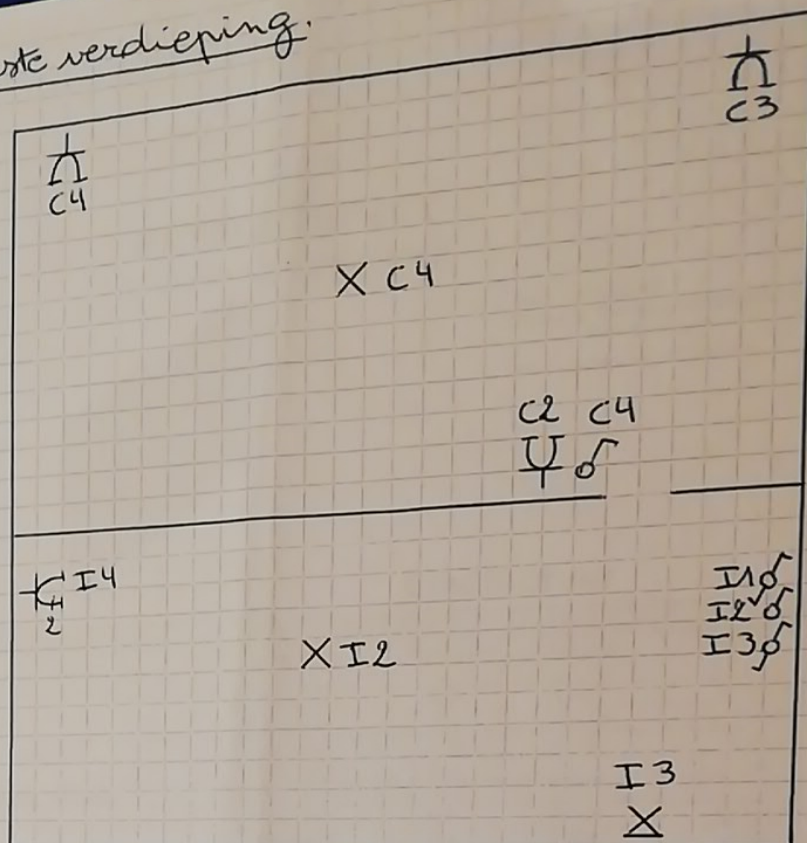

Tweede verdieping.

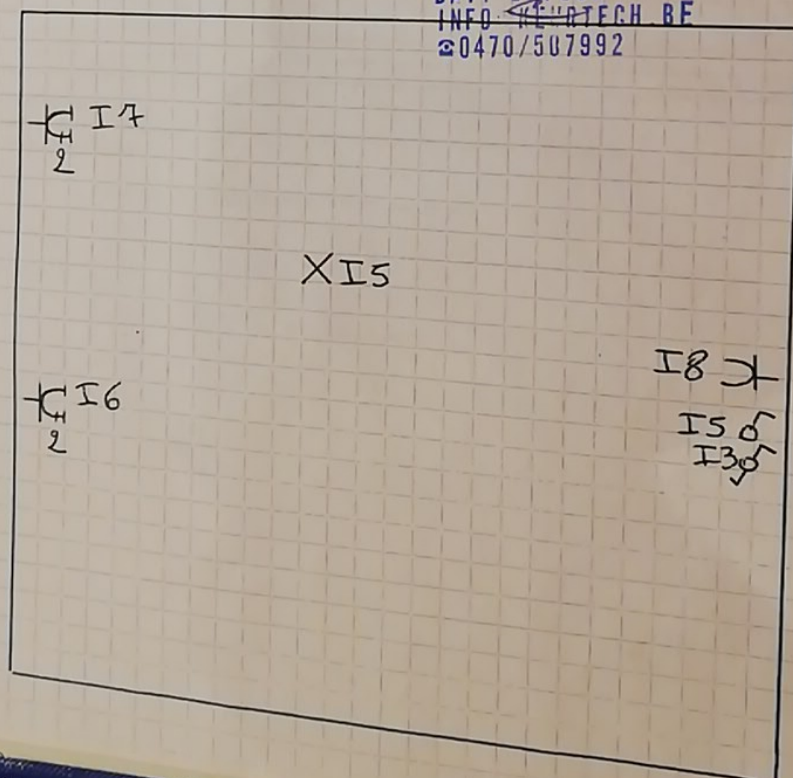

KEURTECH VZW
DAVY DEFOUR
INFO KEURTECH BE
0470/507992

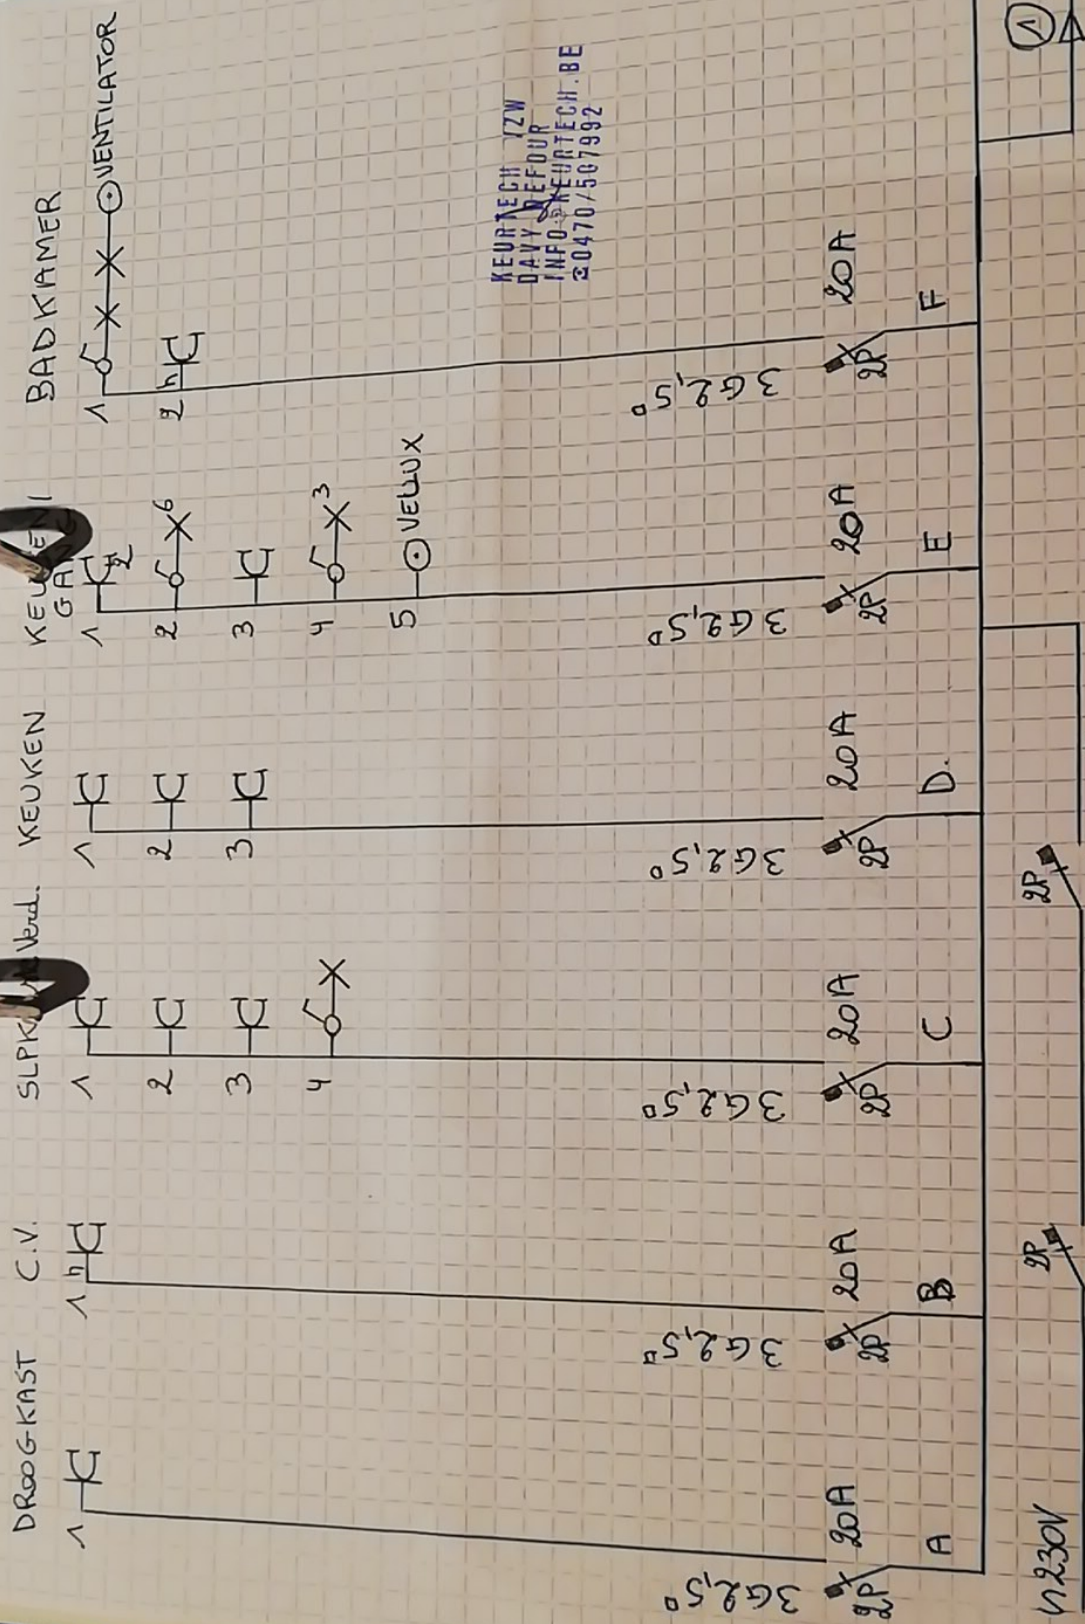

KEURTECH 12W
DAVY DEFOUR
INFO@KEURTECH.BE
30470/507992

