



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 02/02/2024

Inspecteur: Stefano Micoli

Mentor:

Installateur: Electro-Technics

ID-label: Kerstine Liedekensstraat 15 bus 1201 Leuven

Klantreferentie:

B.T.W. nr.: BE 0480 054 582

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102
BT

Serienummer: 22320400

Datum verslag: 02/02/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kerstine Liedekensstraat
Huisnummer 15
Busnummer 1201
Postcode 3000
Gemeente LEUVEN
Land België

Eigenaar

Naam io van Electro-Technics
Straatnaam Kerstine Liedekensstraat
Huisnummer 15
Busnummer 1201
Postcode 3000
Gemeente LEUVEN
Land België

Installateur

Naam Electro-Technics
BTW nr. BE 0480 054 582
Telefoonnummer +32 89 75 19 56
E-mail joris@electro-technics.be

Type : appartement

EAN : 541448860022616818

Teller Nr. : 1SAG3105129738

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Ja

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 18

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 130,4 MΩ

RE: 0,60 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IA (mA)	In (A)	In - andere (A)	Ist	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	2	NVT	NVT
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	NVT	NVT
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	16	Kelder	4	2,5
1	C	20	Kelder	2	2,5
	-	-		-	-
1	C	20	Appartement	4	2,5
13	C	20	Appartement	2	2,5
2	C	16	Appartement	2	1,5

Visueel nazicht (algemeen) OK

Aansluitingen OK

Equipotentiale verbindingen in afwachting

Continuïteit OK

Directe aanraking OK

Indirecte aanraking OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Doorsnede geleiders OK

Verlichting / toestellen NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.

nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 2/2/2049
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 7

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Stefano Micoli

Stefano Micoli
ACEG VZW - #337

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 2/2/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.




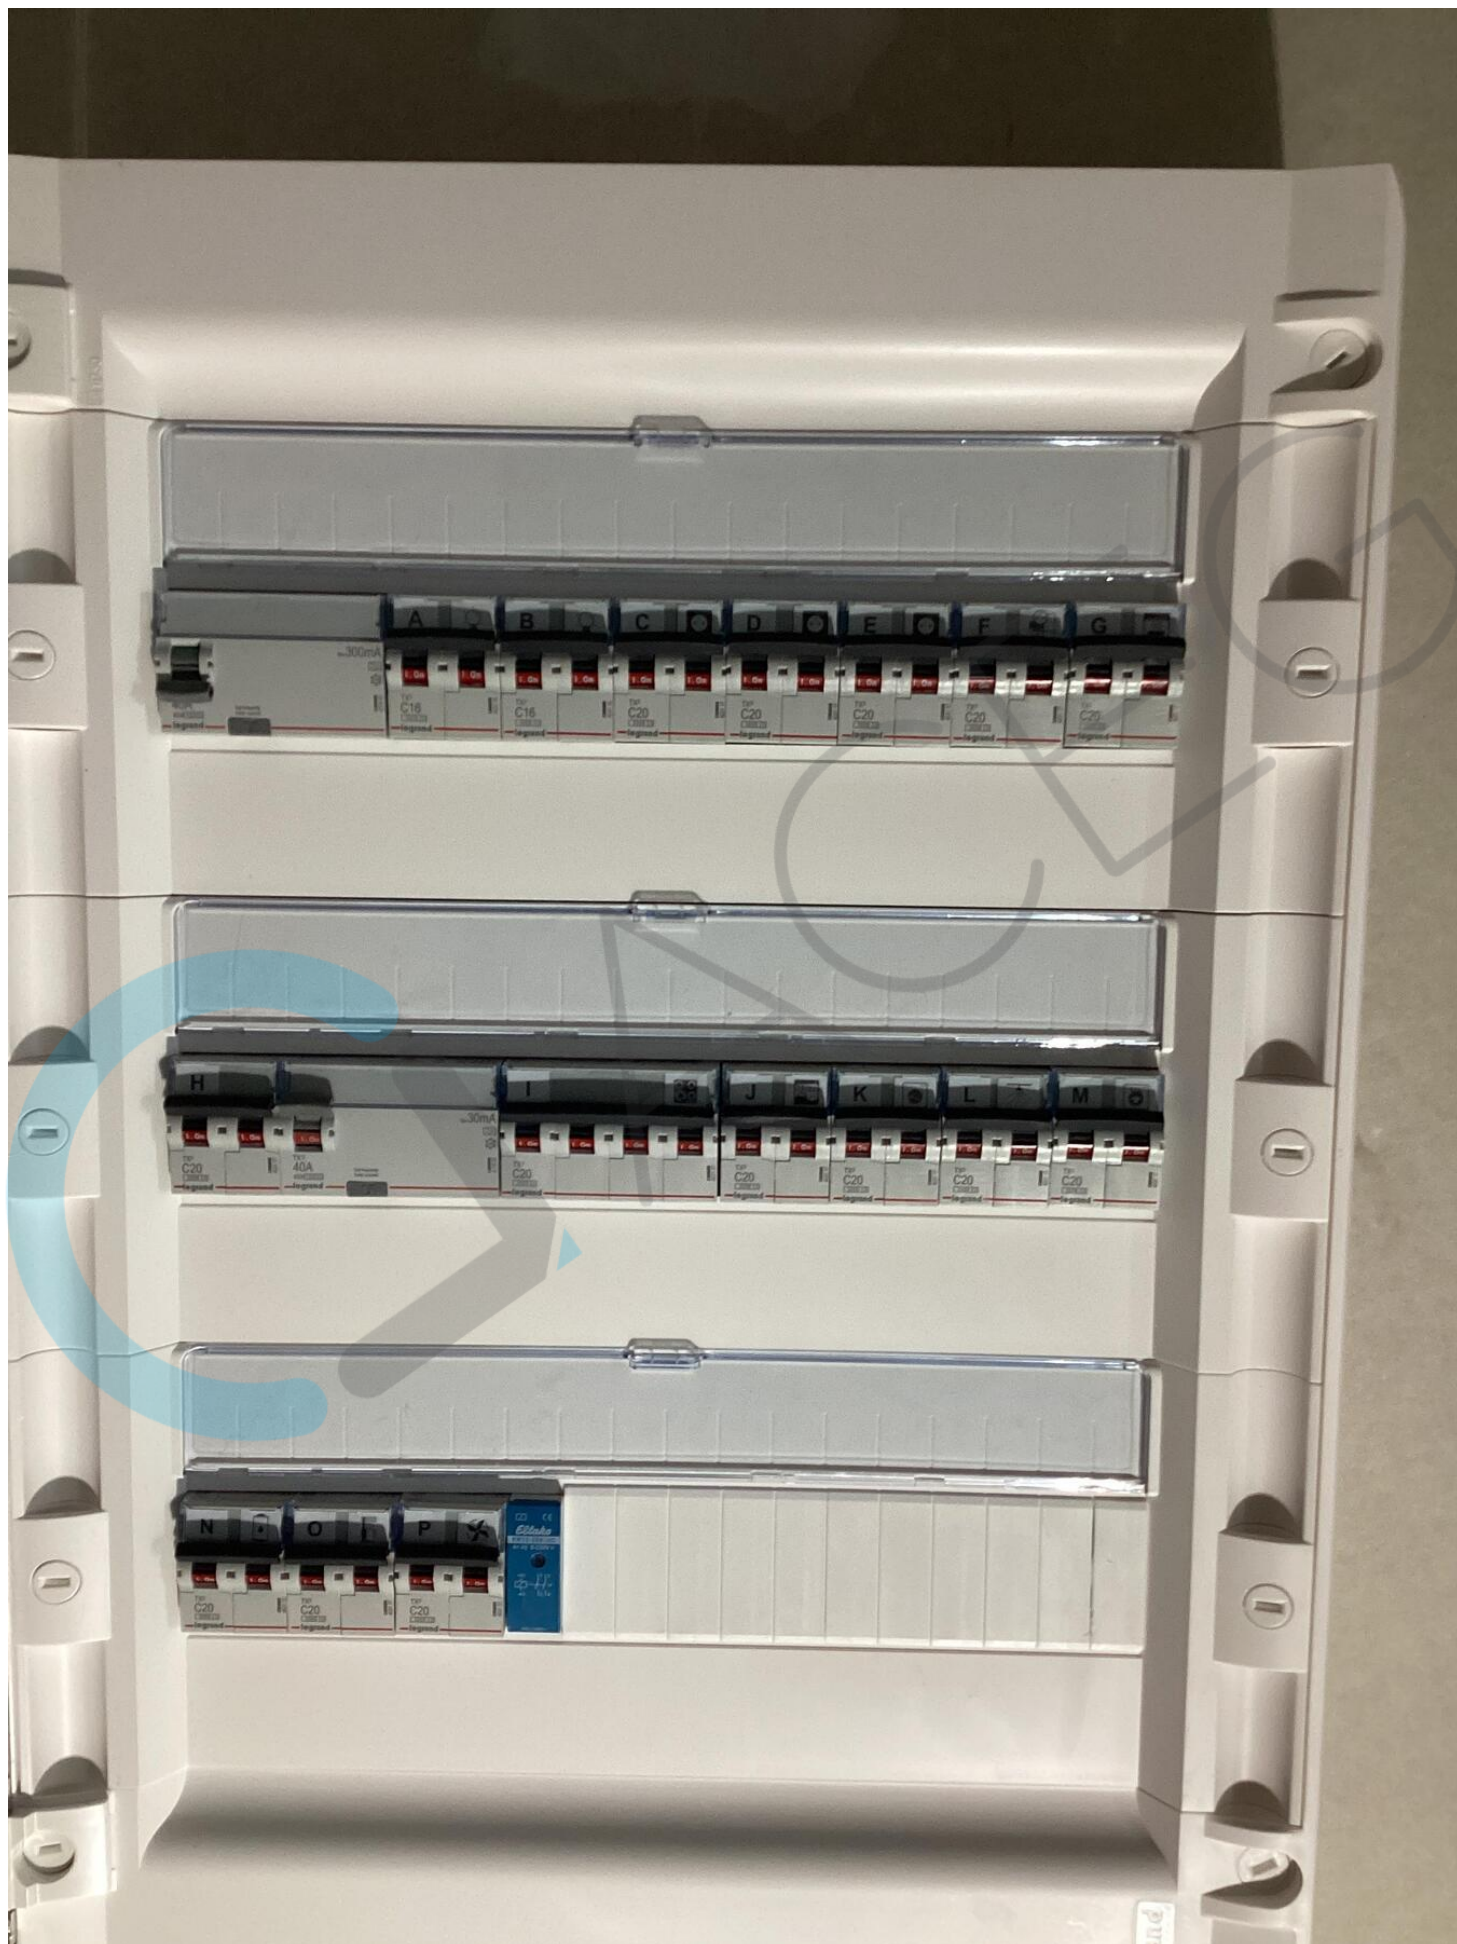






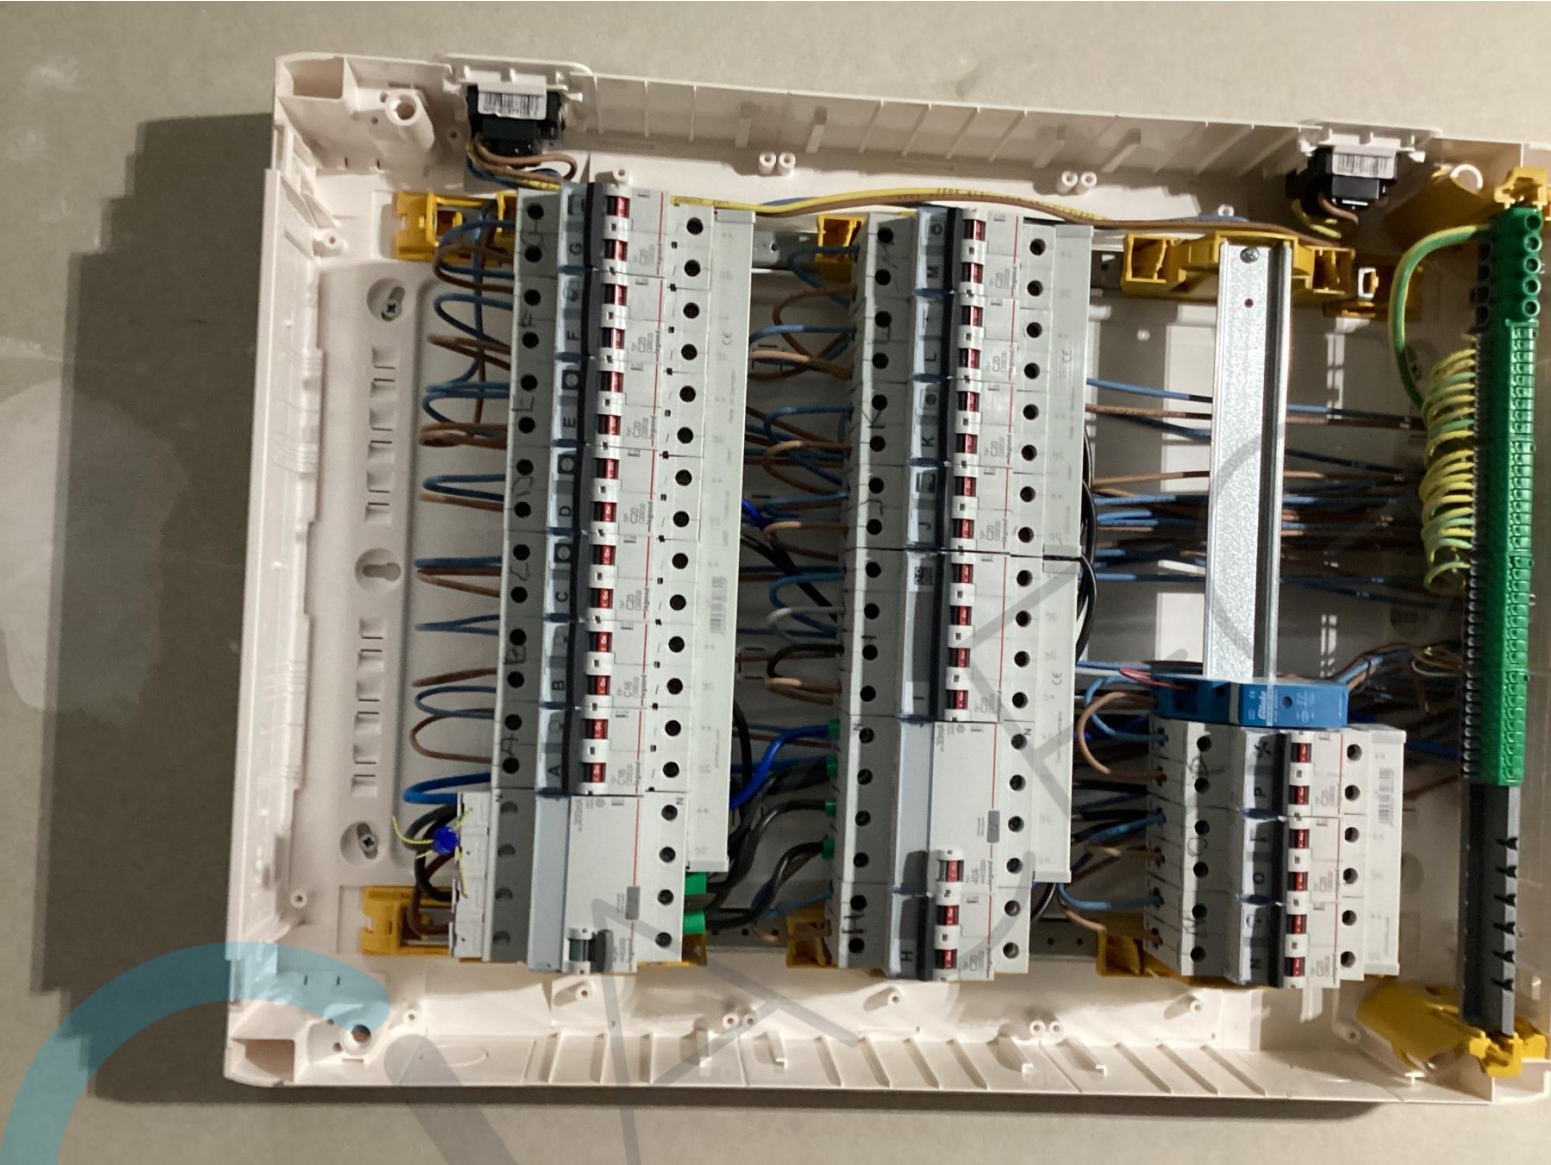

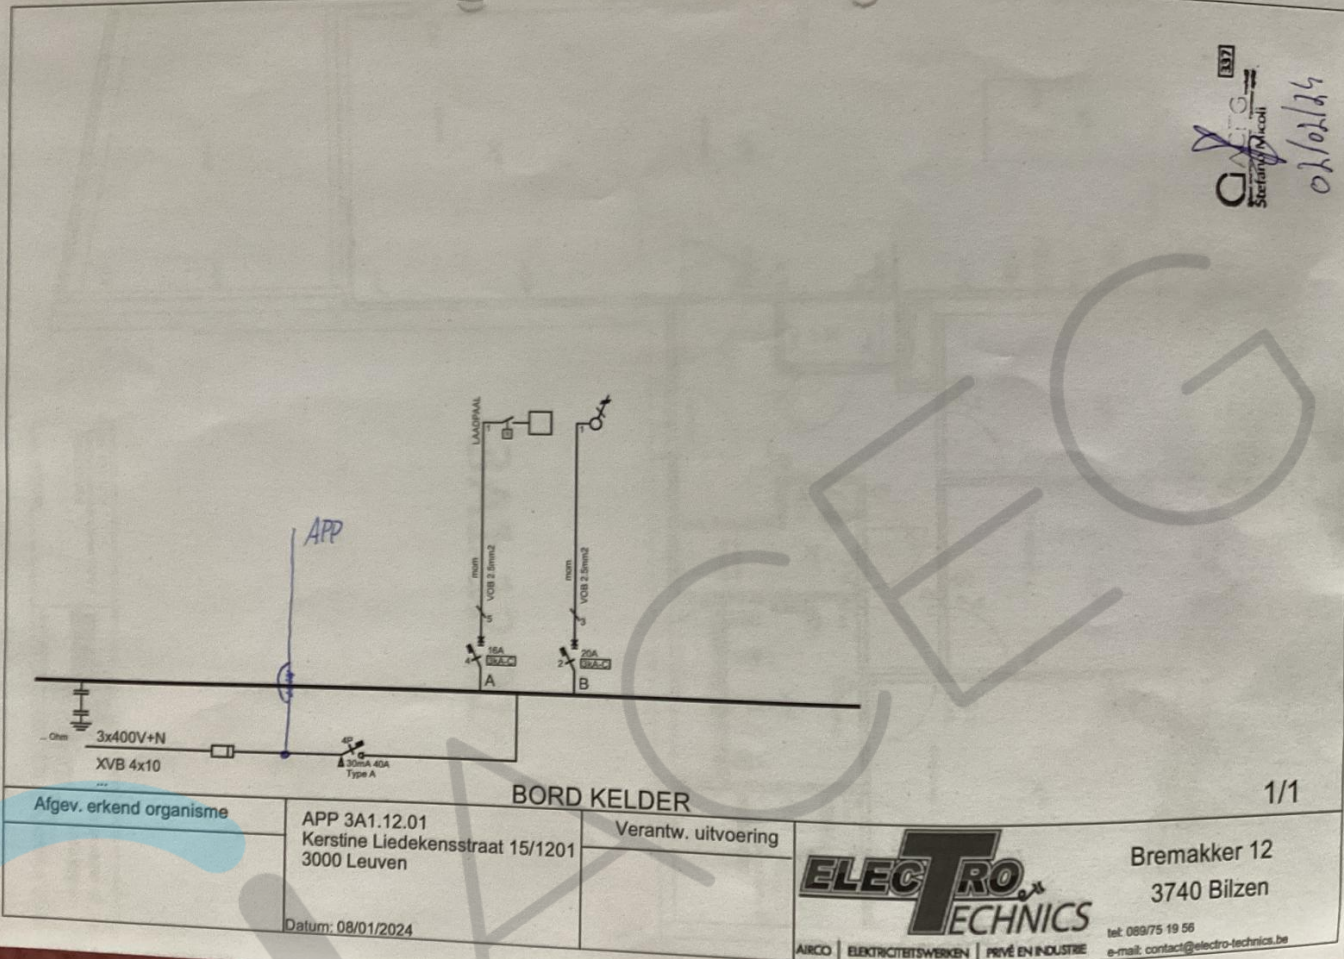

137
Stefan Macol
02/02/24

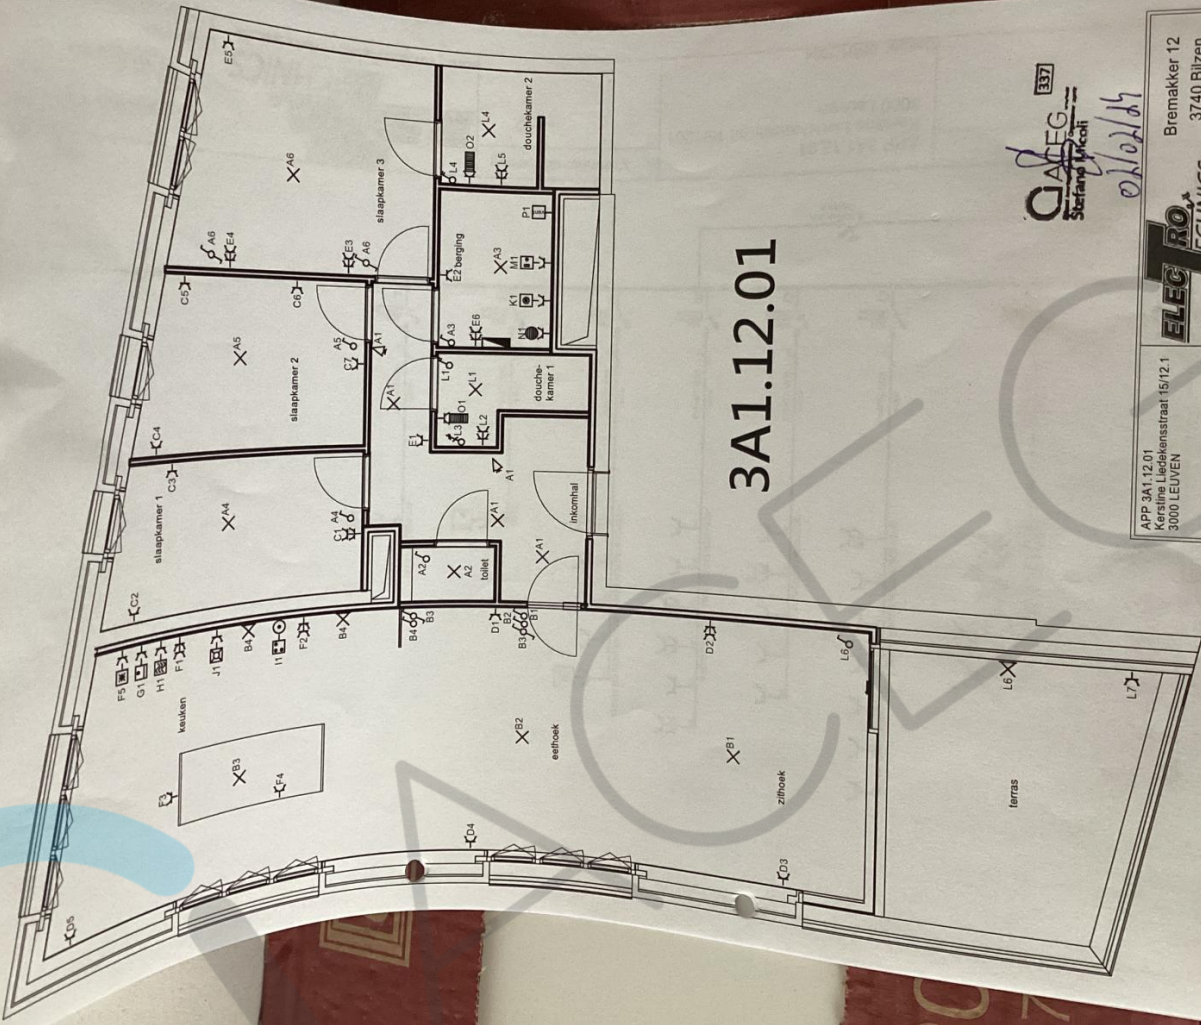

3A1.12.01

GALEGO 337
Stefan Wicoll

02/02/14

APP 3A1.12.01
Kerstina Liederstraal 15/12.1
3000 LEUVEN

ELEGRO TECHNICS


AMCO | BAKKERIJEN | PAKETEN | INDUSTRIE

Bremakker 12
3740 Blizen

14-03-2015 10:58
e-mail: info@elegro-technics.be

Datum: 08/01/2024

 $\frac{1}{2}$



6/20/20



