



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 09/09/2024
Inspecteur: Wesley Tumelaire
Mentor:
Installateur: MR Solar.
Étiquette d'identification: 111B
Référence client:

N° TVA:BE 0842 496 864

Marque et type d'appareil de mesure:
Metrel ET67551
Numéro de serie: 19481210

Date rapport: 09/09/2024

Adresse de l'installation

Rue Rue de la liberté
Numéro 111B
Boîte
Postcode 7540
Commune Rumillies
Pays Belgique

Propriétaire

Nom BVBA Deryco
Rue Rue de la liberté
Numéro 111B
Boîte
Postcode 7540
Commune Rumillies
Pays Belgique

Installateur

Nom MR Solar.
N° TVA BE 0842 496 864
Numéro de téléphone 056 90 00 00
E-mail administratie@mrgroup.be

Type : Installation PV et/ou une batterie domestique

EAN : 54

N° compteur: : 1SAG1100806757

☒ Non communiqué

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:



Type de contrôle:

Contrôle de conformité d'une installation PV $\leq 10\text{kVA}$ et/ou une batterie domestique (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.4. et 4.2.4.3. et 7.112. et synergrid C10/11.

L'installation a-t-elle été entamée avant le 01/06/2023?

Non

Distributeur: ORES

Tension: 1~230V

Liaison comp / tableau: 16 mm

Protection Max: 63 A

Nombres tableaux: 1

Nombre de circuits: 2(controlés)

Prise de terre: Boucle

Ri général: 13,25 MΩ

RE: 2,74 Ω

OK

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL


IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	IΔt	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	Tous	OK	OK
DESCRIPTION INSTALLATION							
Nombres circuits		Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)	
1		C	20	Pv	2	6	
1		C	40	Limiteur	2	10	
Contrôle visuel (général)	OK		Contact direct	OK		Contact indirect	OK
Raccordement	OK		schéma en annexe par Aceg asbl		NA		
Liaisons équipotentielle	BON		Section des conducteurs	OK			
Continuité	OK		Éclairage / machines	NVT		Fonctionnement en ilotage	OK

FORMULAIRE GRD-CWAPE

Meter type: Compteur digital


DIGITAL METER

1.8.0: Index: 000185,620

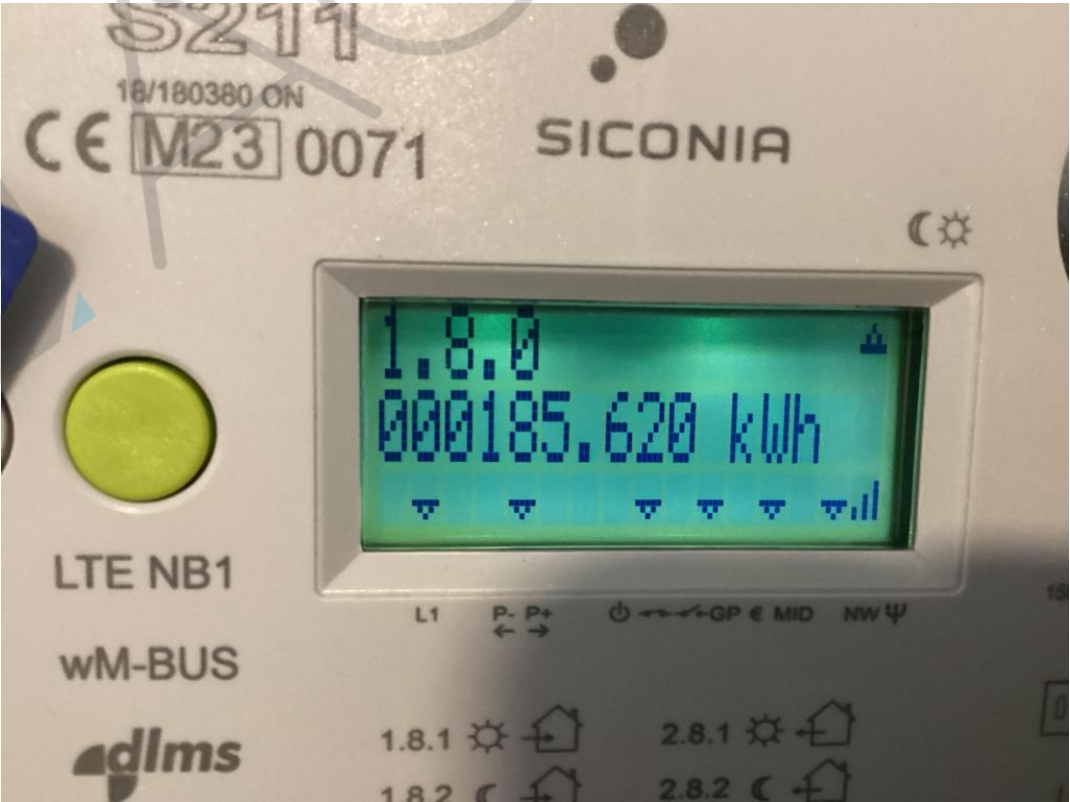


1.8.1:

Index: 000091,826

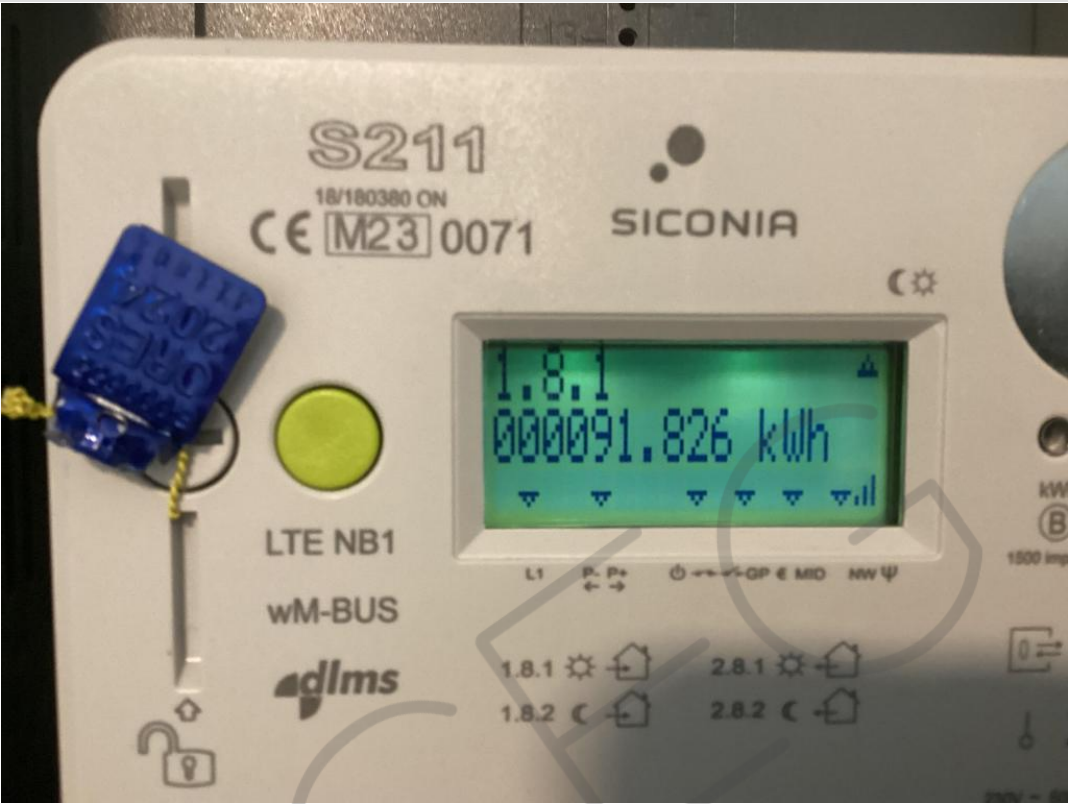

1.8.2:


Index: 000093,794

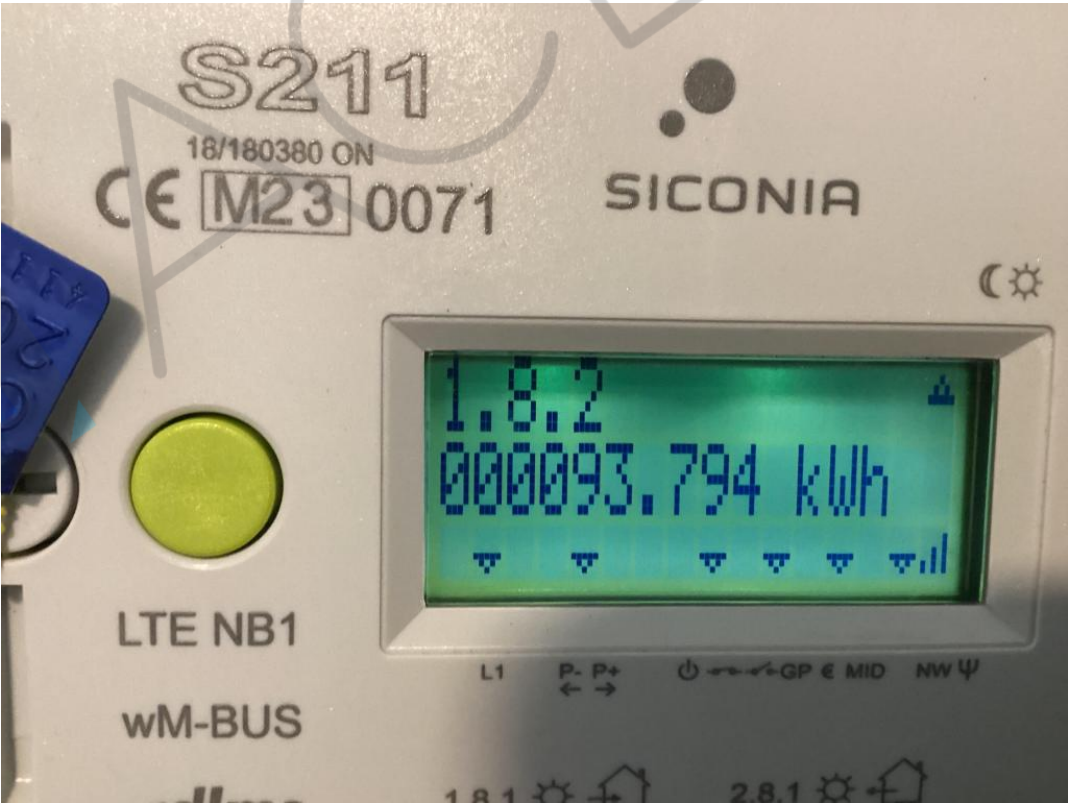


2.8.0: Index: 001095,233



2.8.1: Index: 000745,593

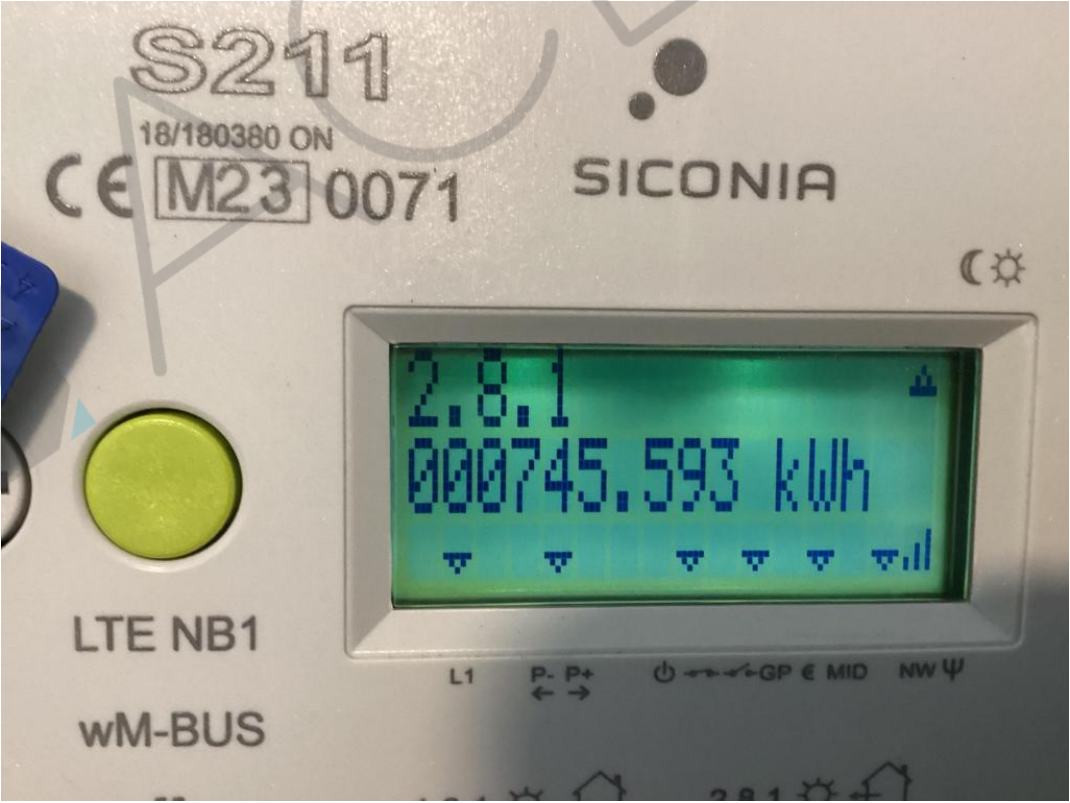

2.8.2: Index: 000349,635

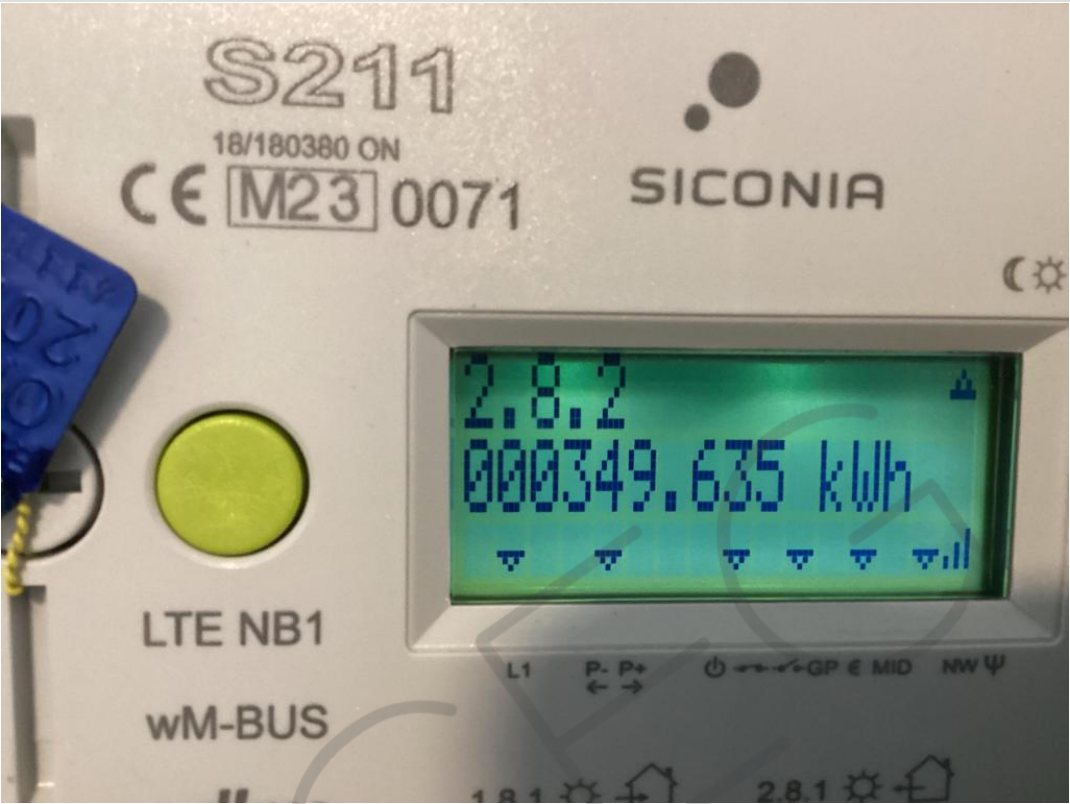

COMPTEUR VERT

Phase	N° série	Affichage du compteur	CE marquage	MID marquage
-------	----------	-----------------------	-------------	--------------

ONDULEUR

Nombre: 1				
Marque: HUAWEI	Series: SUN2000	Type: 3,68KTL-L1	Raccordement: 1-phase	
Numéro de serie: HV22A0193947	Smax (VA): 3680	I AC - nom (A): 16		
Courbe: C	IN (A): 20	UDC Max > UDC panelen/string: BON	IDC Max > I str1 + Istr2 + ...: BON	

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE

Nombre	Marque	Type	Puissance de crête (Wc)	Puissance de crête totale (Wc)
12	Stem	Full black	430	5160

BATTERIE DOMESTIQUE

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

- nota/note 25 Les panneaux PV ne sont pas visible et accesible.
- nota/note 27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.
- nota/note 6 Cette inspection ne comprend que le système PV .

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 9/9/2049
- ☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Wesley Tumelaire



Wesley Tumelaire
ACEG VZW-435

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.
Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Feuille de route pour une installation qui est conforme:

Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 9/9/2049	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.






(1P)PN/ITEM:01075349-015 Y
(32P)MODEL:SUN2000-3.68KTL-L1
(S)SN:HV22A0193947 MADE IN CHINA




MAC:C0F6EC70F866-66(1)


WIFI
SSID:
SUN2000-HV22A0193947
PSW:
Changeme



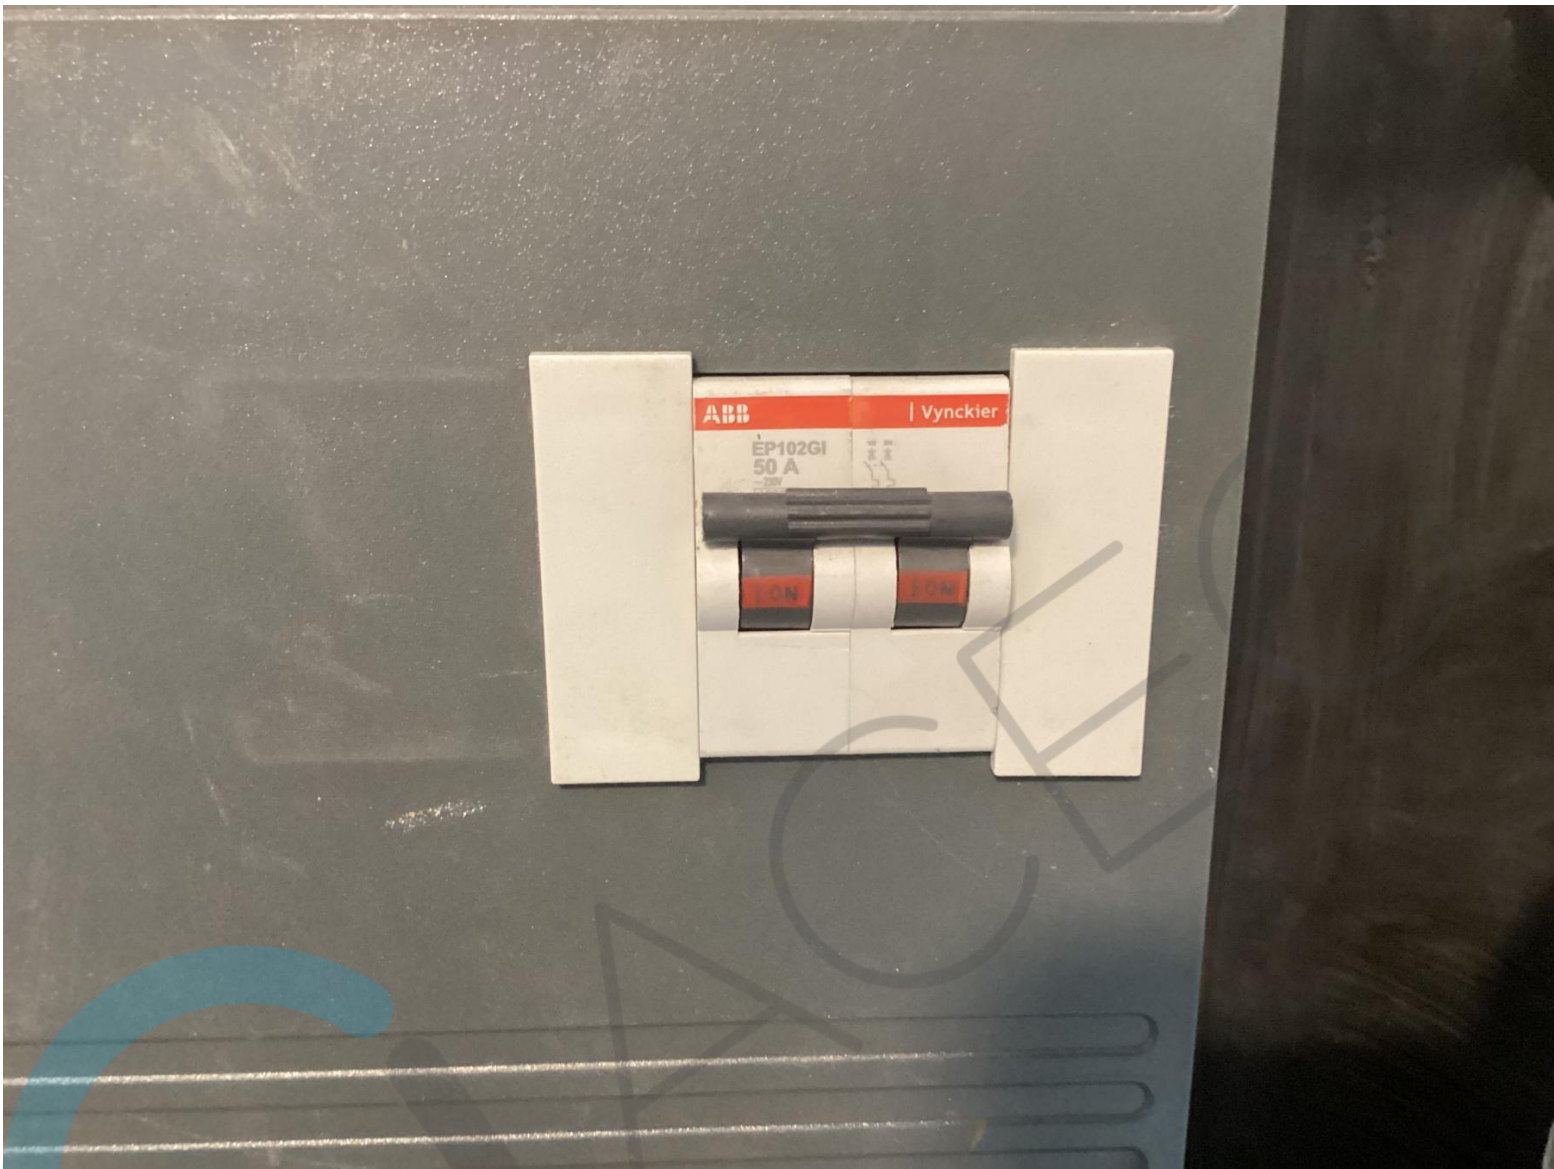





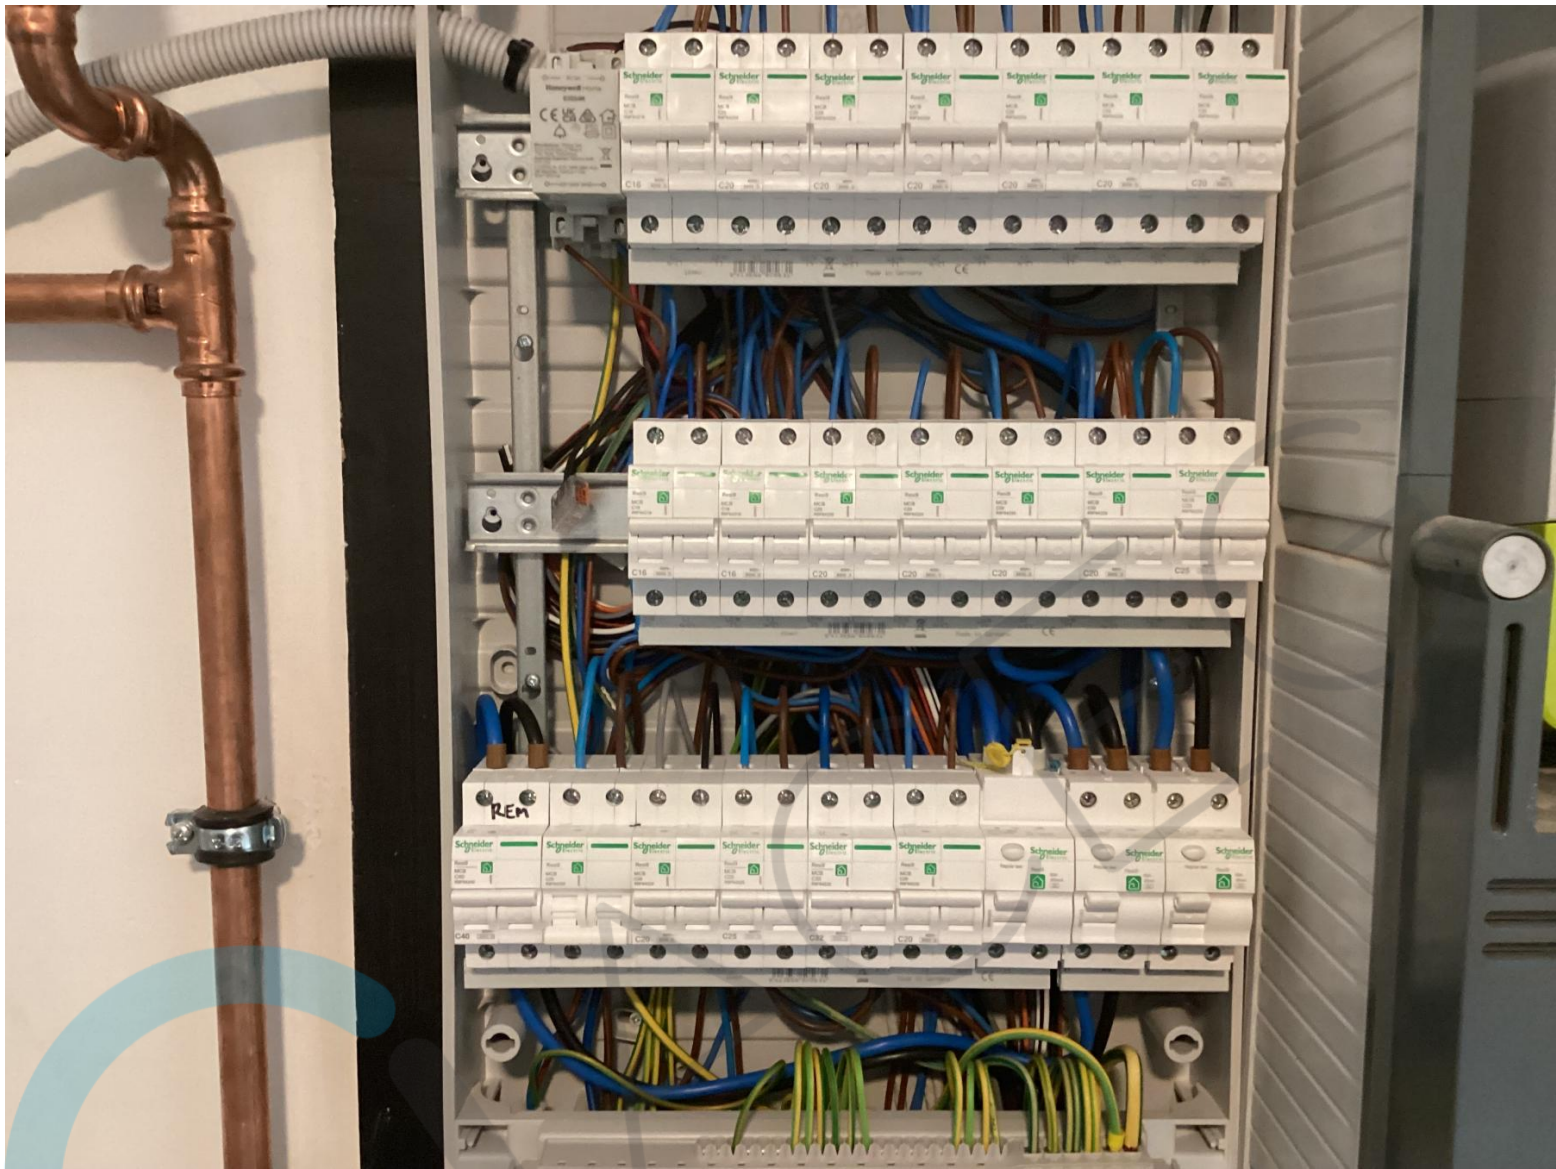

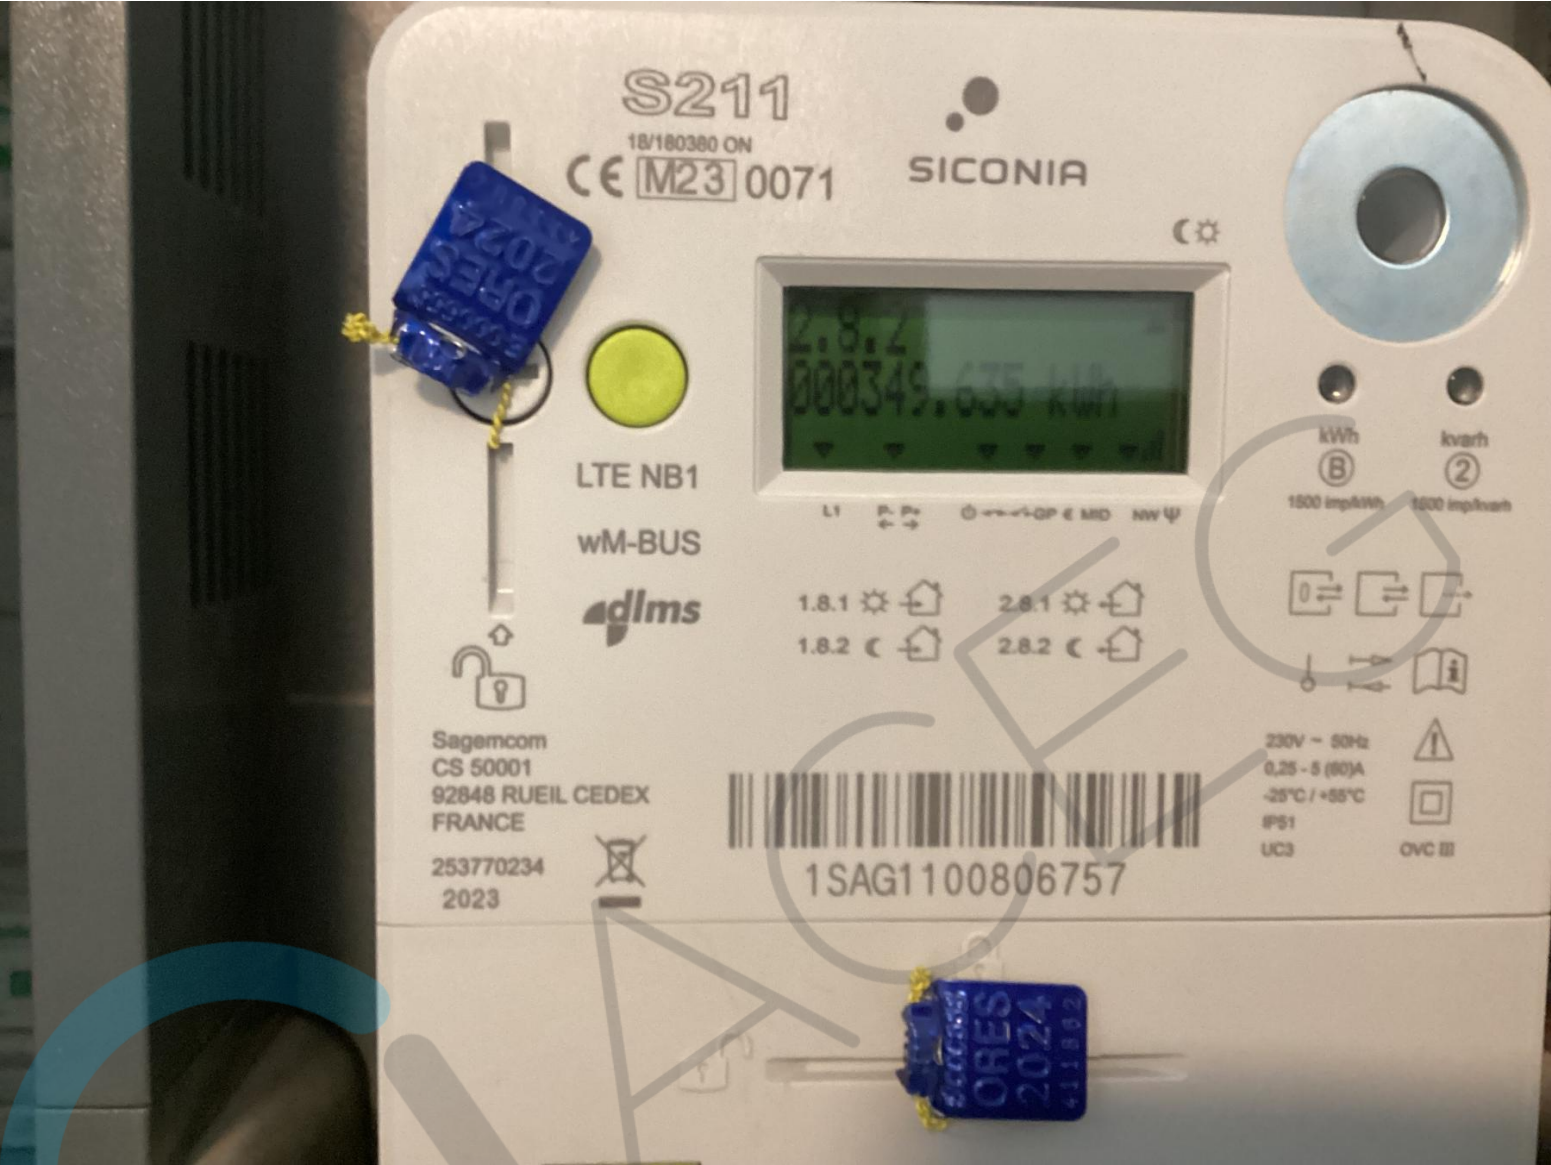



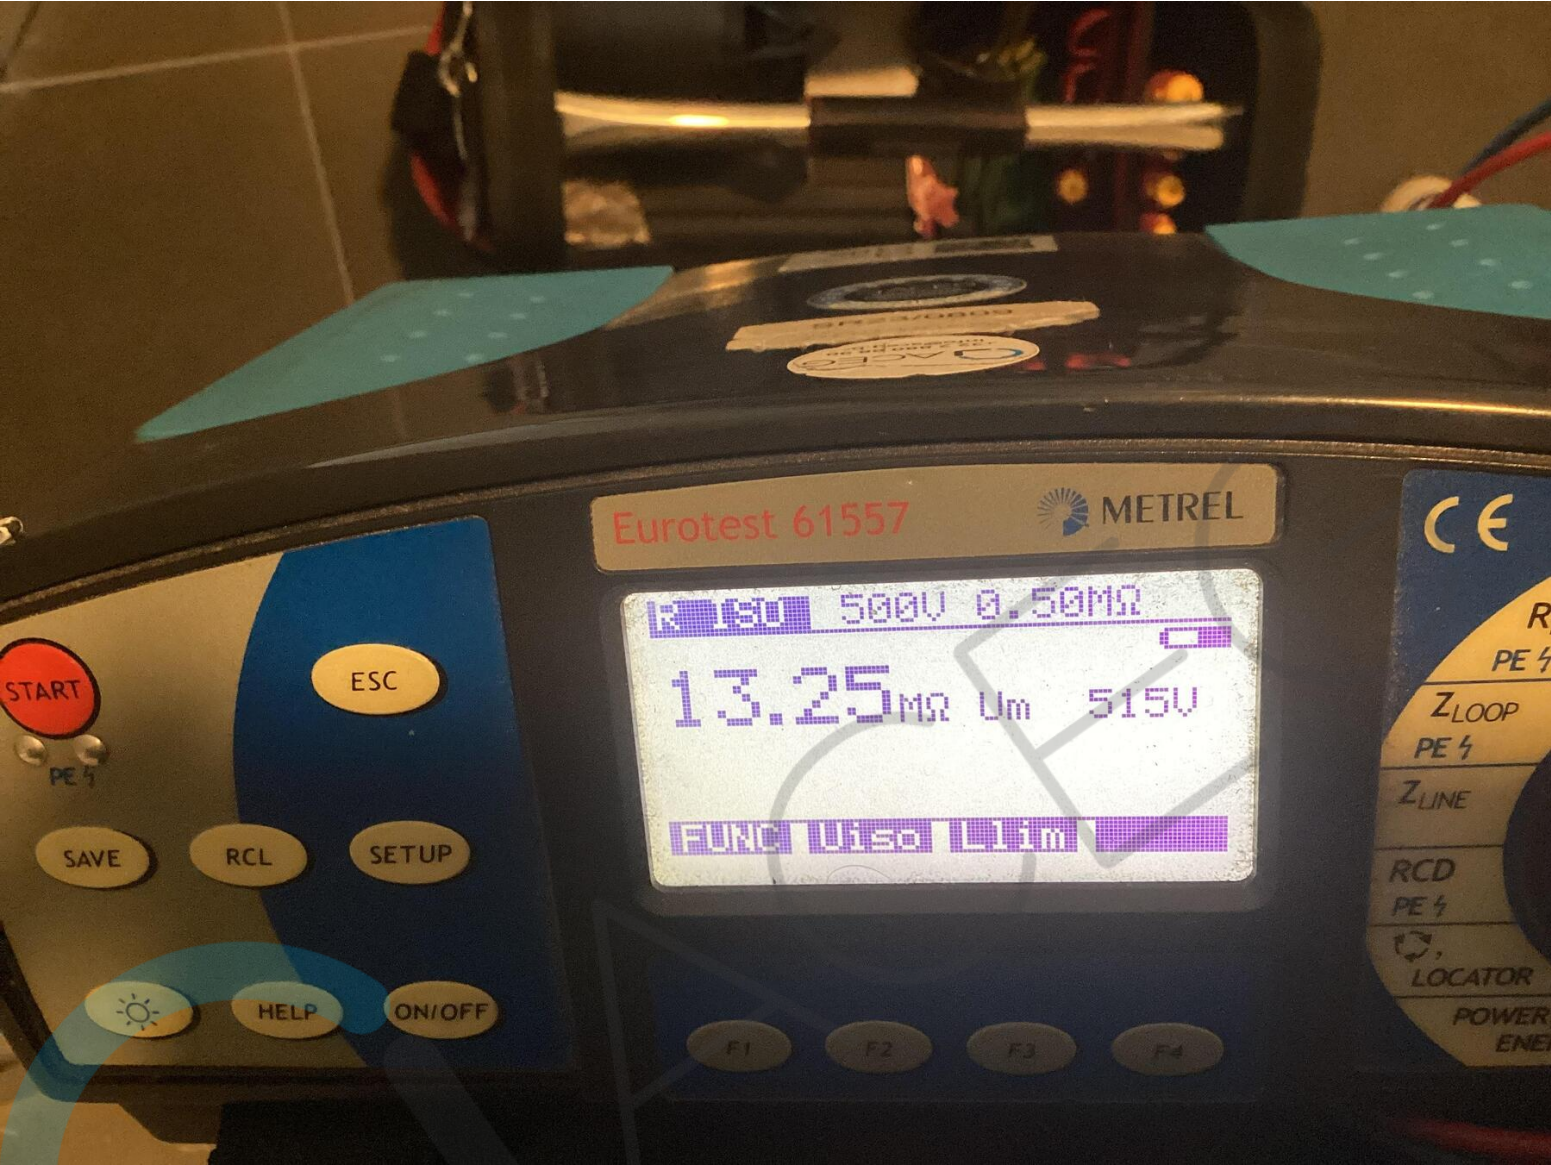

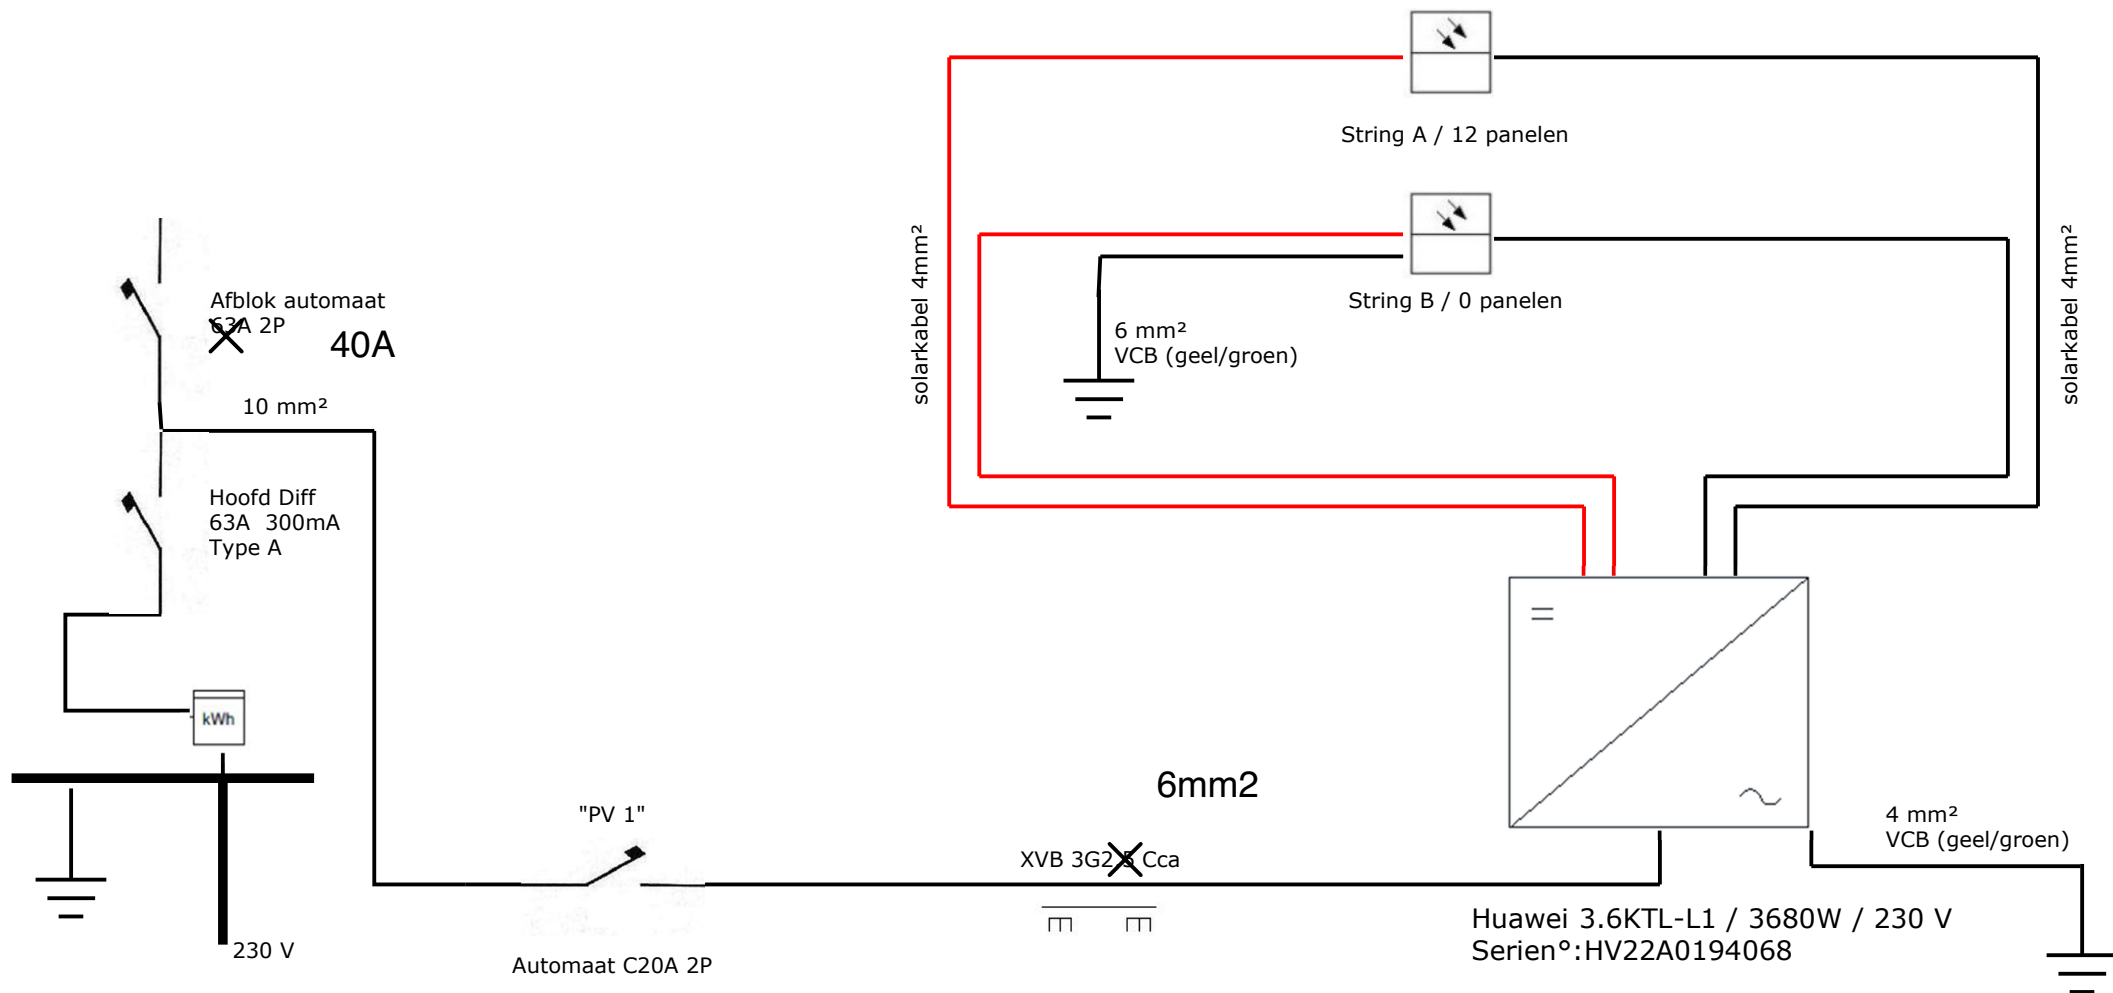

09/09/2024

Afgev. Erkend organisme  Wesley Tumelaire	Installatie adres: Rue de la Liberté 111B 7540 Rumillies	Verantw.uitvoering 	 Plum 7 8550 Zwevegem
	Klant: BVBA Deryco	Verantw. MR solar: 056 90 00 00  MR GROUP Plum 7 8550 Zwevegem info@mrgroup.be - 056/90 00 00 BE0842 496 864 SOLAR + HVAC	12 x 430WP Stern FB Huawei 3.6KTL-L1 / 3680W / 230 V EAN: Netsp.: 230 V
