

Nom du client : INYS SPRL  
Adresse : Rue del'No 7  
CP + Ville : 4671 BLÈGNY

## RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE À BASSE TENSION ET TRÈS BASSE TENSION

(Livre 1 - AR 08/09/2019) - DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ÉNERGIE

Résultat du contrôle :  Non-conforme      Risque de partialité :  oui  non

Demandeur : INYS SPRL - Rue del'No 7 - 4671 BLÈGNY

Propriétaire/exploitant ou gestionnaire :

Adresse de la visite : RUE DE L'AUNAIE 22 - 4040

HERSTAL

Responsable des travaux : /

Mission réalisée le : 05-08-25

N° Client Atlas :

N° d'affaire Atlas : /

Date du rapport : 07-08-25

N° ordre mission : 1505246

Ref. Socotec Avantage : /

### Important :

Sauf avis contraire du Chef d'établissement, dûment notifié à SOCOTEC BELGIUM qui a émis le présent rapport, dans un délai de deux mois maximum à compter de la date d'envoi indiquée en page de garde, le contenu du présent rapport est considéré comme définitivement validé.

### SOCOTEC BELGIUM ASBL

Chaussée de Tongres 257/12  
4000 ROCOURT

Tél. : +32 (0)4 234 17 00

E-mail : [inspection.belgium@socotec.com](mailto:inspection.belgium@socotec.com)

[www.socotec.be](http://www.socotec.be)

N° de TVA: 0406.671.312

Agent(s) visiteur(s) : WIDY D.

Agent(s) tutoré(s) :

Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL,

Le Directeur de l'organisme agréé



Ing. Ph. BARBARY



**Envie de donner votre avis sur nos services ?**

**Flasher le QR Code et compléter le questionnaire en ligne.**

**Votre avis nous intéresse fortement et conduira les changements à venir.**



SOCOTEC BELGIUM ASBL

N° affaire Atlas : / - Ordre mission : 1505246

Date du contrôle : 05-08-25

Agent(s) visiteur(s) : WIDY D.

Date d'émission du rapport : 07-08-25

Ce rapport annule et remplace le rapport n°:

émis le

Nb annexe(s)

1

**RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE À BASSE TENSION ET TRÈS BASSE TENSION (LIVRE 1 - AR 08/09/2019) - DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ÉNERGIE**

Demandeur : INYS SPRL

Adresse : Rue del'No 7 - 4671 BLÈGNY

N° TVA : be0675995374

TVA non assujetti

Propriétaire/exploitant ou gestionnaire :

Adresse : RUE DE L'AUNAIE 22 - 4040 HERSTAL

Responsable des travaux : /

Adresse : /

**1. Identification de l'installation :**

Adresse : RUE DE L'AUNAIE 22 - 4040 HERSTAL

Code EAN : 

5	4	1	4	5	6	7	0	0	0	0	0	8	9	3	5	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

N° compteur : 04641900

N° compteur (exclusif) nuit : /

Compteur non-placé

Cabine HT privée :  oui  non

Type d'installation :  unité d'habitation  local (locaux) non-technique(s) d'un ensemble résidentiel

production décentralisée  autres :

Installations spécifiques :  photovoltaïque ≤ 10 kVA (7.112)  borne de charge de véhicule(s) électrique(s) \*  piscine (7.2)

balnéothérapie(s)  sauna(s) (7.3)  fontaine(s) (7.100)  bassin(s) d'eau(x) (7.100)

**2. Données du contrôle (prescription(s) règlementaire(s)) :**

Type de contrôle :  Conformité avant mise en usage (6.4.)  modification - extension importante

Visite de contrôle (6.5.)  avant renforcement d'une ancienne installation (8.4.1.)

vente avec ancienne installation (8.4.2.)  libre ancienne installation (8.4.3.)

Date de réalisation :  avant le 01/10/1981  à partir du 01/10/1981 et avant le 01/06/2020  à partir du  01/06/2020  01/06/2023

\*  avant le 01/11/2022  après le 01/11/2022  application prescriptions chapitre 7.22

Dérogation(s) :  néant  anciennes installations (8.2.1.)  installations ancien RGIE (8.2.2.)

installation entamée avant le 01/06/2023 sur déclaration du demandeur (6.5.8.1)

**3. Données de l'installation :**

U<sub>N</sub> (AC) :  1N400V  2X230V  3X230V  3N400V  Autre:

Prise de terre  commune  boucle de terre  barre(s) de terre  piquets de terre  inconnue

conducteur(s) enfoui(s) horizontalement, verticalement ou en oblique  Autre:

Type de schéma de mise à la terre :  TT  TN-S  IT  non défini

Canalisation d'alimentation tableau principal : section 4 x 6 mm<sup>2</sup> - Type Vob

Protection de branchement : I<sub>N</sub> 20 A  selon devis GRD  I<sub>max</sub> autorisé pour la validité du présent rapport

Nombre de tableaux : 3 Nombre de circuits (réserves compris) : 9

Type de coupure générale :  int. différentiel  Autre :

Nombre	Différentiel(s)	I <sub>N</sub> (A)	I <sub>Δ</sub> (mA)	Type
1	IV	40	300	A
1	II	40	30	A

Nombre	Différentiel(s)	I <sub>N</sub> (A)	I <sub>Δ</sub> (mA)	Type

Annexe(s) descriptive(s) :  sans objet  installation visitée  installation(s) production décentralisée  photos installations  
 installation PV  autre(s) donnée(s):

Référence des schémas et plans annexés : Ref: v1/1505246/06-08-25

Référence du (des) plan(s) des installations de sécurité paraphé(s) pour réception :  sans objet

Référence du (des) plan(s) des installations critiques paraphé(s) pour réception :  sans objet

Référence de la liste des installations de sécurité - critique :  sans objet

Référence de la liste des voies d'évacuation :  sans objet

Autre(s) donnée(s) annexée(s) :

**4. Résultats du contrôle (mesures, essais, et visuel) :**

Prise de terre : / Ω	Isolement général : 7,46 MΩ	Continuité PE	NOK	Liaison equipo. :	sans objet
Contacts dir. : NOK	Contacts indir. : NOK	I <sub>N</sub> prot/Section conducteurs :	OK	Schémas :	NOK
Matériel mobile : OK	Diff.: bouton test : OK	Boucle de défaut :	OK	Matériel fixe :	NOK

**INFRACTIONS :**

Voir annexe "Résultats du contrôle"

**REMARQUES :**

Néant

**NOTES :**

Néant

**5. Conclusion :**

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. L'acheteur doit laisser réaliser une nouvelle visite de contrôle pour vérifier la remise en ordre de l'installation au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l'acte de vente. L'acheteur peut choisir librement l'organisme agréé pour cette nouvelle visite de contrôle.

Le Directeur de l'organisme agréé

Ing. Ph. BARBARY

**ANNEXE "Résultats du contrôle" - Point 4.**

**INFRACTIONS :**

- LV - R - 0003 (5.4.3.5.) Absence de sectionneur de terre permettant la mesure de la résistance de dispersion de la prise de terre.
- LV - R - 0301 (5.4.3.5.) La mise à la terre de la broche de terre du(des) socle(s) de prise de courant est absente ou défectueuse (sur les prises : sèche-linge, adoucisseur, porte de garage, cave arrière, cuisine, salon, salle de bain, chambre).
- LV - R - 0401 (3.1.2.1.) Absence de schéma unifilaire et/ou plan de position de l'installation électrique.
- LV - R - 0503 (4.2.2.1.) Absence de protection contre les contacts directs (pièces nues sous tension accessibles) (veuillez obturer les parties du dessus et du dessous du tableau, il est possible d'y glisser ses doigts et d'accéder à des bornes sous tension).
- LV - R - 0603 (3.1.3.3.) La mention de la tension de service n'apparaît pas de manière claire sur le(s) tableau(x) électrique(s) (le tableau général a été refait mais la tension n'apparaît pas dessus).
- LV - R - 1018 (5.2.9.5.) Les conducteurs uniquement pourvus d'une isolation principale (VOB) ne peuvent être posés à l'air libre et en montage apparent. (au-dessus du tableau se trouvent des VOB en pose apparente. Veuillez rectifier ceci en les plaçant soit dans une gaine, soit dans une goulotte).
- LV - R - 1103 (5.3.5.2.) Les contacts des socles de prise de courant ne sont pas complètement recouverts par un écran lorsque la fiche est enlevée (sécurité enfants) (toute la maison).
- LV - R - 1208 (5.2.6.1.) Les connexions électriques ne sont pas réalisées selon les règles de l'art (connection hors éclairage cave arrière).
- LV - R - 1216 (1.4.1.3.) Remplacer ou reconditionner le matériel électrique (la prise de la porte de garage n'est pas conforme).

**REMARQUES :**

néant

**NOTES :**

néant

## **Annexes à la conclusion du rapport :**

### **Rappels des prescriptions réglementaires :**

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu :

- a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien ;
- b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique soient en tout temps observés ;
- c) de conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire ;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant ;
- e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques ;
- f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique ;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

## **DEVOIRS DU VENDEUR/NOTAIRE ET DE L'ACHETEUR LORS DE LA VENTE D'UNE HABITATION EQUIPEE D'UNE ANCIENNE INSTALLATION ELECTRIQUE :**

### **1. Dès que le compromis est signé :**

#### **• Devoirs du vendeur/notaire :**

- Le vendeur doit remettre le PV de la visite de contrôle et ses annexes au notaire **afin** que celui-ci l'ajoute dans le dossier de la vente;
- Le notaire doit faire mentionner dans l'acte- de vente les points suivants :
  - la date du PV de la visite de contrôle
  - le fait de la remise du PV de la visite de contrôle à l'acheteur

#### **Si le PV de la visite de contrôle est négatif (l'installation non-conforme) :**

- L'obligation pour l'acheteur de communiquer son identité et la date de l'acte de vente à l'organisme de contrôle agréé qui a exécuté la visite de contrôle de l'installation électrique.

### **2. Dès que l'acte de vente est signé :**

#### **• Devoir de l'acheteur :**

- L'acheteur doit détenir le dossier de l'installation électrique (schémas, PV,...) en deux exemplaires ;

#### **Si le PV de la visite de contrôle est positif (installation conforme) :**

- L'acheteur doit laisser réaliser la prochaine visite de contrôle soit suivant le délai repris sur le PV de la visite de contrôle (maximum 25 ans après la date de la visite de contrôle) soit en cas de modification ou extension importante de l'installation électrique.

#### **Si le PV de la visite de contrôle est négatif (installation non-conforme) :**

- L'acheteur doit informer l'organisme de contrôle agréé qui a exécuté la visite de contrôle de son identité, de la date de l'acte de vente et du PV concerné ;
- Après la communication à l'organisme de contrôle, il reçoit automatiquement 18 mois à dater de l'acte de vente pour remettre en ordre l'installation électrique ;
- L'acheteur peut choisir un autre organisme de contrôle pour laisser réaliser le recontrôle dans le délai des 18 mois (vérification conformité de l'installation).

Pour de plus amples informations

#### **SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie**

Direction générale de l'Énergie – Haute surveillance des infrastructures et produits énergétiques

Adresse : Boulevard du Roi Albert II 16 1000 Bruxelles

Tél. 0800 120 33 / E-mail : [gas.elec@economie.fgov.be](mailto:gas.elec@economie.fgov.be)

<https://economie.fgov.be>

## **INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SOCOTEC BELGIUM :**

1. Référence procédure(s) interne(s) : CL-E-LV-R-01 ;
2. Les résultats s'appliquent uniquement aux travaux spécifiés dans la demande. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme agréé et du demandeur ;
3. Le contrôle porte sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation le jour du contrôle ;
4. SOCOTEC BELGIUM asbl possède, conformément aux critères de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 (en tant qu'organisme de type A), la compétence pour effectuer les contrôles décrits dans l'annexe au certificat d'accréditation n°200-INSP. Le respect des conditions d'accréditation fait l'objet de surveillances régulières ;
5. Toutes les informations obtenues lors de nos inspections sont confidentielles.


Ad: W1 105246 106-08-25

Rue de L'AUNAT 22.  
4040 Huelb.

DATE le 06/08/85


TyP de bobine d'antenne principale : VOB 6 m<sup>2</sup>  
TENSION : 3 N 400 V<sub>r</sub>  
Amplitude : 20 P

ANSA TETH 415 m dirigé par 4 m<sup>2</sup>  
2 x 168 m<sup>2</sup> 3 m dirigé par 4,5-8,5 m<sup>2</sup>  
4 x 168 m<sup>2</sup> 3 m dirigé par 9,5 m<sup>2</sup>  
4 x 168 m<sup>2</sup> 3 m dirigé par 4,5 m<sup>2</sup>

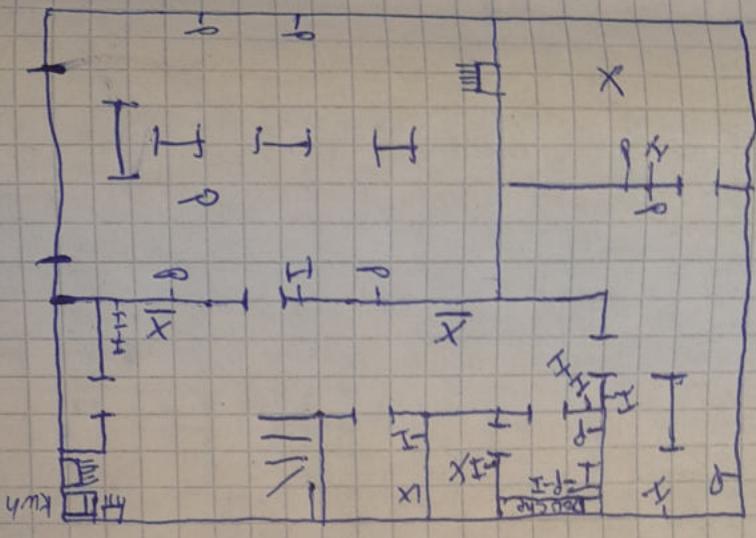

Signature E.A. A. 8

*[Handwritten signature]*

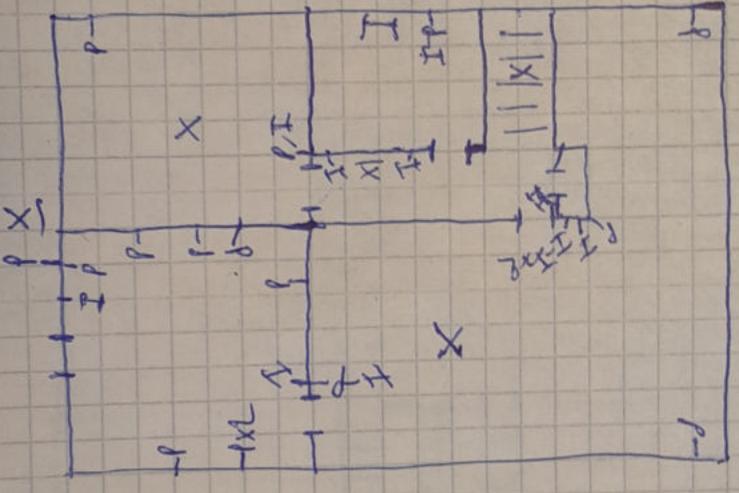

Signature clientel:

*[Handwritten signature]*

1 ère

Legende symboles:

- P = Prise
- I = intercom
- X = Applique
- X = point lumineux
- II = hablage électrique
- II Kuh = Cuisine
- K = table Norm.
