ACEG asbl
Organisme agrée

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. 02 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 29/09/2021
Étiquette d'identification: Appartement B1_43

Inspecteur: Vincent Dehaes

N° TVA:BE 0414 251 960

Marque et type d'appareil de mesure: Metrel Eurotest ET61557

N° série:: 18460193

Mentor:
Référence client:

Installateur: Alloson

Adresse de l'installation

Rue	Clos Amanda Stassart
Numéro	9
Boîte	9_18
Code postal	1200
Commune	Woluwe-Saint-Lambert
Pays	Belgique

Nom de contact	Alloson
Téléphone	ben
Numéro Gsm (SMS)	

Propriétaire

Nom	N.C.
Rue	Clos Amanda Stassart
Numéro	9
Boîte	9_18
Code postal	1200
Commune	Woluwe-Saint-Lambert
Pays	Belgique

Installateur

Nom	Alloson
N° TVA	BE 0414 251 960
Numéro de téléphone	027060090
E-mail	Vanessa.vranckx@alloson.net

Type : appartement

EAN : 540

N° compteur: : N.P.

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:

Type de contrôle:

Contrôle de conformité d'une nouvelle installation domestique selon (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.4. et 4.2.4.3.

Distributeur: SIBELGA
Tension: 1~230V
Liaison comp / tableau: 10 mm²
Protection Max: 40 A
Nombres tableaux: 1
Nombres circuits: 15
Ri général: 48 MΩ

OK



Prise de terre: Boucle

RE: 0,6 Ω OK

DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

IΔ(mA)	In (A)	In - autres (A)	I²t	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	15	NA	NA
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	NA	NA

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
2	C	10		2	1,5
1	C	32		2	6
12	C	16		2	2,5

Contrôle visuel (général)	OK	**Contact direct**	OK	**Contact indirect**	OK
Raccordement	OK	**schéma en annexe par Aceg asbl**	NA		
Liaisons équipotentielles	BON	**Section des conducteurs**	OK		
Continuité	OK	**Éclairage / machines**	NVT		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

O17 Les équipotentielles principales sont en attente de raccordement.
O2 Aucune infraction .
O22 Cuisine équipée et/ou appareils de cuisine non placés.
O27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.
O5 L'éclairage n'est pas définitivement installé.
O9 La salle de bain n'est pas complètement terminée . Baignoire et/ou douche doivent être placés .

O12: L'installation électrique n'est pas sous tention. Le bon fonctionnement des différentiels n'a pas pu être testé

CONCLUSION

☑ **L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1.** La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 29/9/2046

☑ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.

☑ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre annexe: 2

PUBLICATION DE LA VISITE TECHNIQUE

L'inspecteur Vincent Dehaes

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Feuille de route pour une installation qui est conforme:			
Etape 1	**Etape 2**	**Etape 3**	**Etape 4**

Feuille de route pour une installation qui est conforme:			
Etape 1	**Etape 2**	**Etape 3**	**Etape 4**
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 29/9/2046	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.

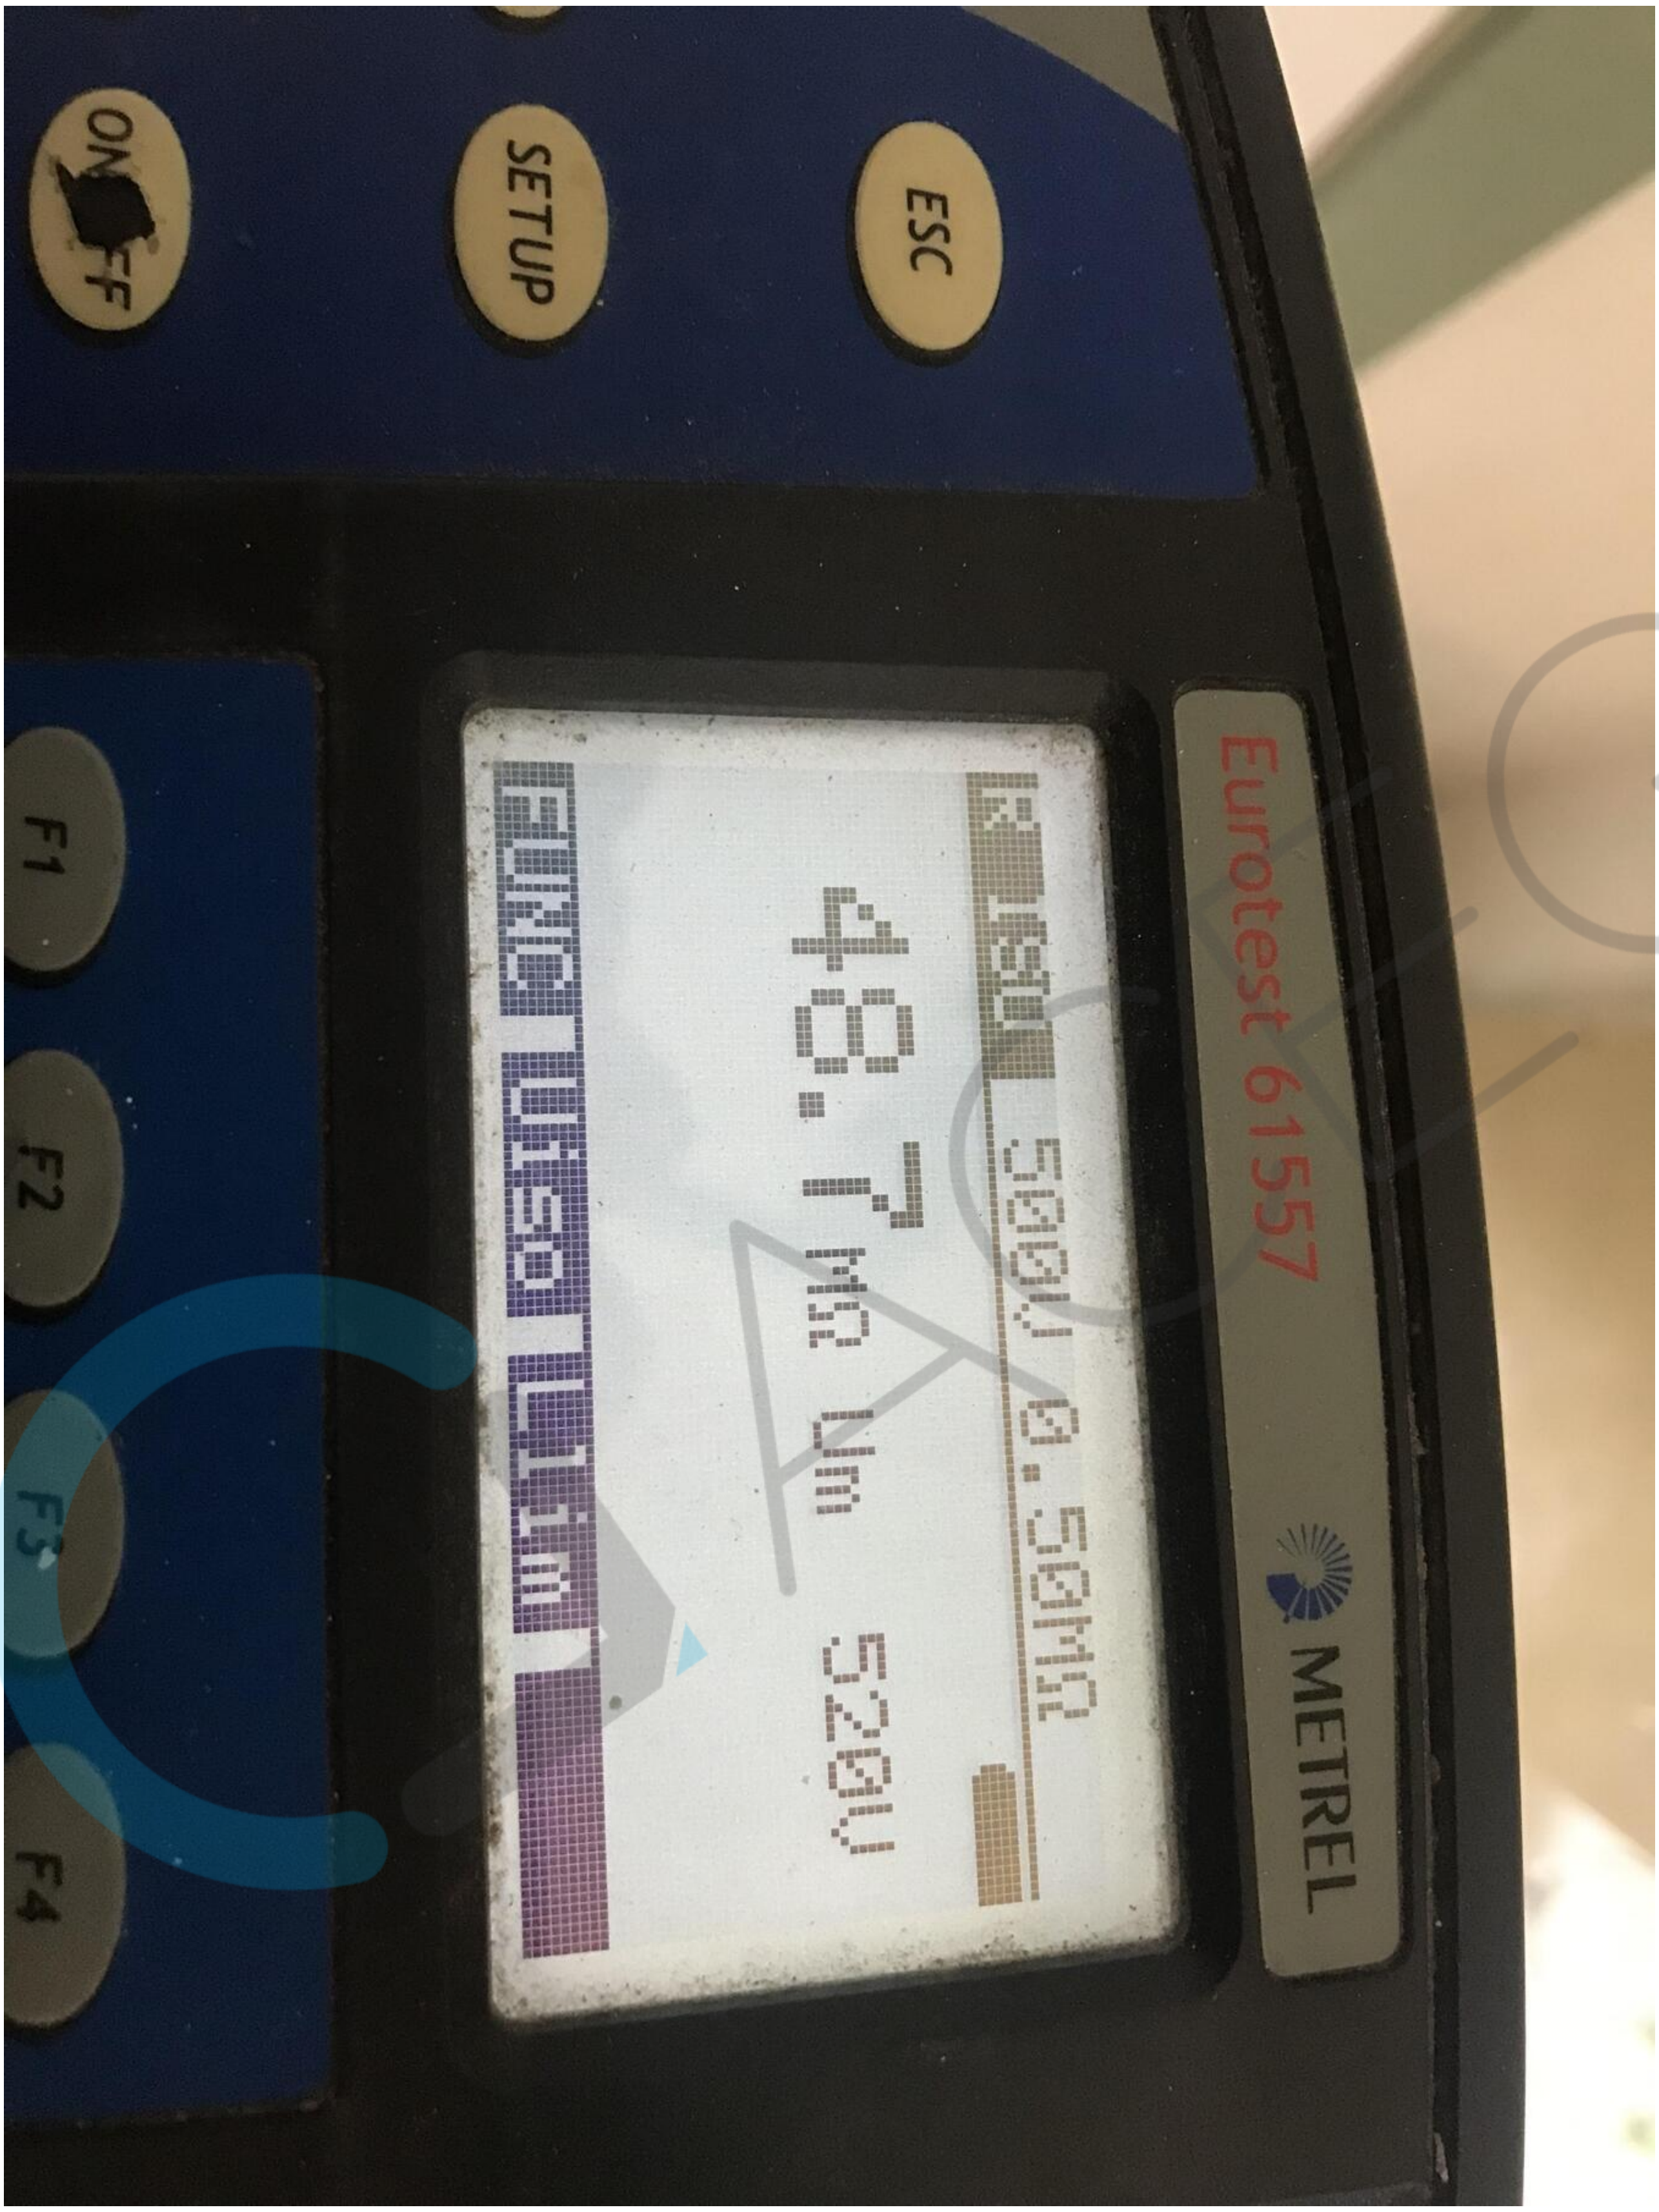
ESC
SETUP
F1
F2
F3
F4
Eurotest 61557
METREL
R ISO 500V 0.50MΩ
48.7 MΩ
Um 520V
FUNC Uiso Llim
